

รายงานการประชุมประจำเดือน
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายสุตชาย พรหมมลมาศ	ผศส.๑	ประธาน
๒. นายพิทยา อิ่มเอม	วศ.คส.๑	
๓. นายจุลทศศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ชป.๑	
๔. นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๒ ชป.๑	
๕. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ ชป.๑	
๖. นายอธยา อรรถนพเพ็ชร	กส.๔ ชป.๑	
๗. นายสามารถ อาซากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๘. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๙. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	เลขานุการ
๑๐.นางปราณี กองงาม	บง.คส.๑	
๑๑.นางสาวกัญชารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑	
๑๒.นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ชก.คส.๑	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓.นายชัยวัฒน์ จันทร์มงคล	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๔.นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	ลาพักผ่อน
---------------------------	------------------------	-----------

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสุตชาย พรหมมลมาศ ผศส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวข้อ
การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผศ.๑ ให้ผู้รับผิดชอบงาน บันทึกสรุปถ่ายที่เป็นปัจจุบัน ที่เกิดปัญหาและอุปสรรค เกิดความเสียหายกับงานก่อสร้าง เช่น ฝนตก น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ซึ่งถ้าเกิดปัญหาดังกล่าว ให้รายงานให้โครงการทราบโดยเร็ว และได้ติดตามงานดังนี้

๑. แผน MTEF ปี ๒๕๖๑
๒. ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง บริเวณป้อมยาม
๓. บันทึกการประชุมฝ่ายนาฬิกาบิน ที่ กส.๒ขป.๑ ได้เข้าไปประชุมกับชาวบ้าน
๔. อาคารดักตะกอน

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม


ขอแก้ไขคำผิดในรายงานการประชุมหน้าที่ ๔ ย่อหน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๓ ข้อความ ผวศ.ขป.๑ แจ้งว่าต้องออกแบบทำเป็นฝายยาง แก้ไขเป็น **ฝายหยัก**


ที่ประชุมรับทราบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

วศ.คส.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่รับผิดชอบ ดังนี้

เรื่องตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารดักตะกอน ได้ทำเรื่องถึงสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่ แล้ว พบว่าอาคารดักตะกอนทั้งหมด ๖ แห่ง มีเพียง ๑ แห่ง ที่ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยาน คือ อาคารดักตะกอนหยาบแห่งที่ ๒ ห้วยแม่ฮอน

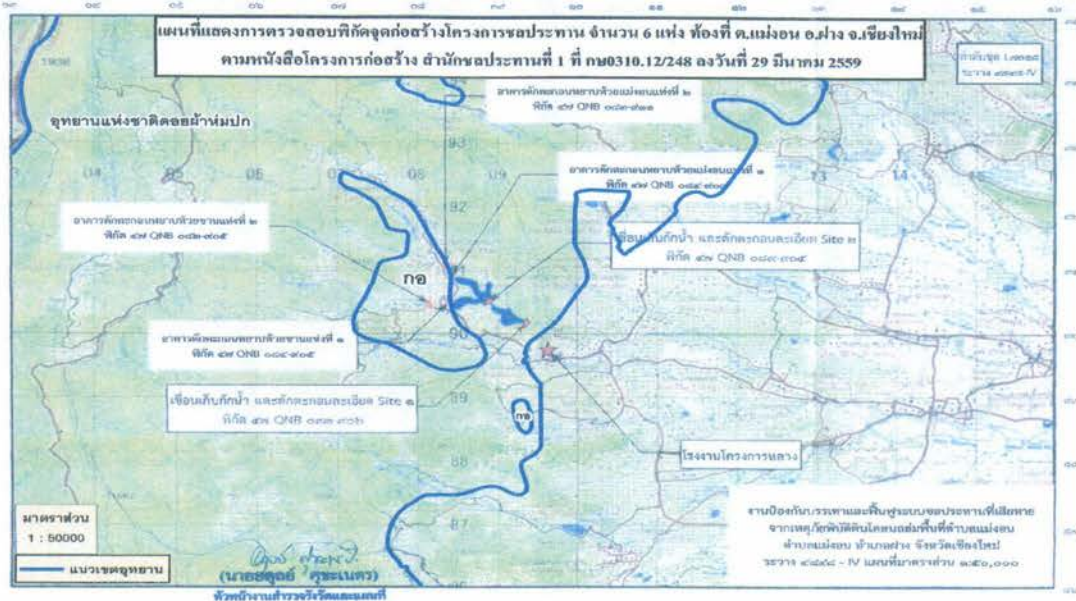

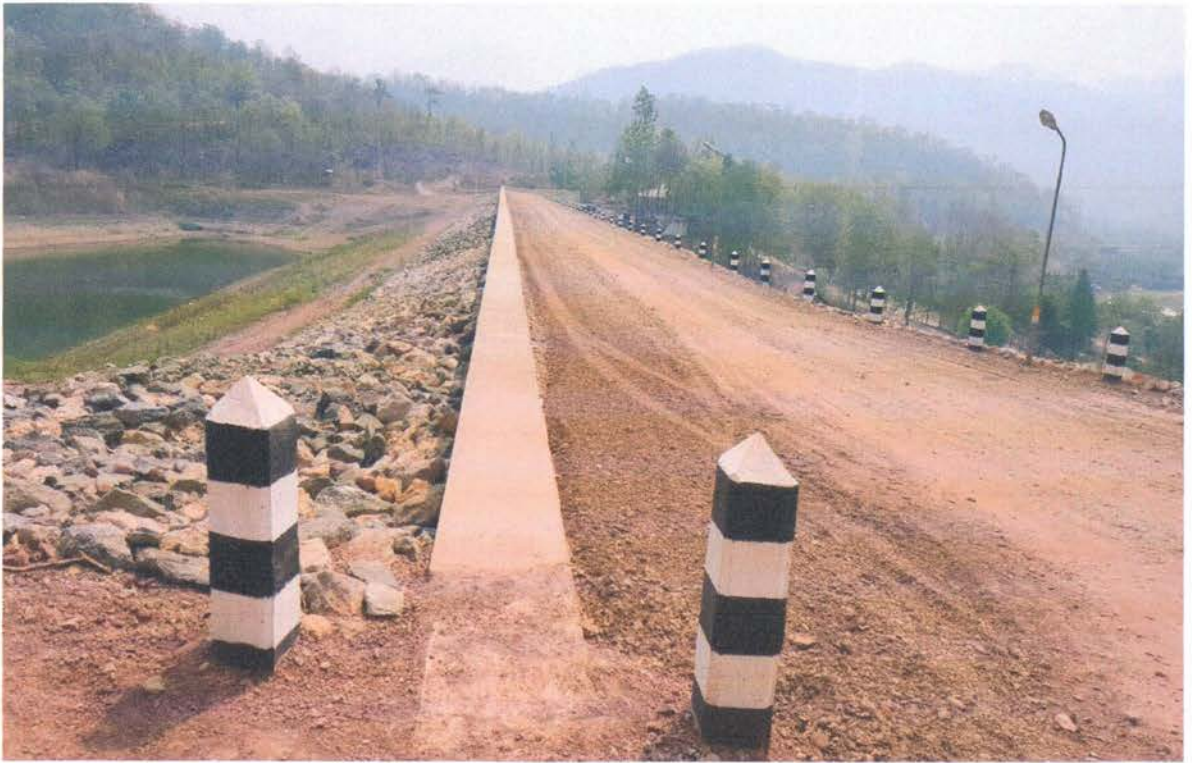

รูปถ่ายส่งมอบงานเสริมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เริ่ม



งานปี ๒๕๕๙

- งานซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปางคอง จ.แม่ฮ่องสอน ปัจจุบันขุดเปิดร่องแนวท่อเก่า และวางแนวท่อใหม่แล้ว และเตรียมงานผูกเหล็กสำหรับเทคอนกรีต คาดว่างานจะแล้วเสร็จเรียบร้อยประมาณเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปางคอง
ตำบลนา(ป้อม) อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

กิจกรรม	จำนวนเงิน	ปกติ %	ปกติค่าจ	พ.ศ.2559												
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	อ.ค.			
1.งานส่วนเงินยืม																
1.1 ศึกษารวมเบื้องต้น	73,545.00	100.00	0.25	10.00	25.00	25.00	25.00	10.00	5.00							
				15.00	25.00	23.00										
1.2 ศึกษารวมอาคารท่อส่งน้ำ	22,632,606.73	100.00	78.29	5.00	15.00	25.00	25.00	5.00	10.00	5.00						
				10.00	15.00	21.00										
1.3 ศึกษารวมงานขุดเปิดร่องระบาย	3,832,768.15	100.00	11.86	5.00	20.00	20.00	25.00	20.00	5.00	5.00						
				8.00	17.50	15.00										
1.4 ค่าบริหารงานและค่าควบคุมงาน	2,275,953.12	100.00	7.87	5.00	25.00	20.00	20.00	10.00	10.00	10.00						
				10.00	20.00	30.00										
2.งานเงินยืมรวม																
2.1 ศึกษารวมการก่อสร้างและติดตั้งพร้อมทดสอบระบบ	899,879.00	100.00	1.73						40.00	35.00	15.00	10.00				
รวมค่าก่อสร้าง	28,935,762.00	100.00	300.00													
แผนรวม / เดือน (%)				4.93	16.15	23.58	24.87	15.53	9.48	5.47						
ผลรวม / เดือน (%)				4.93	21.08	44.66	49.52	65.06	74.54	100.00						
ผลรวม / เดือน (%)				9.82	15.46	19.85										
ผลรวม / เดือน (%)				9.80	28.00	44.51										

กส.๑ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างาน ดังนี้

งานปี ๒๕๕๘

งานเสริมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หอพระ ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ตามรูปถ่ายด้านล่าง





รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. ฝ่ายช่างปวย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ งานคอนกรีตตัวฝาย และราวกันตกแล้วเสร็จ
 บ่อระบายตะกอนทรายยังไม่เสร็จ งานวางรินเทคอนกรีตได้ ๖๐ เมตร เรียงกล่อง Gabion หินใหญ่ได้บางส่วน
 ปัจจุบันผลงานได้ ๙๐ % คาดว่าเดือนพฤษภาคมจะแล้วเสร็จ ๑๐๐%

แนบ - มงกุฎิเงินก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
 โครงการฝ่ายช่างปวยพร้อมระบบส่งน้ำ
 บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ 2559

กิจกรรม	จำนวนเงิน	นำเงิน % ที่เบิกจ่ายไป	นำเงิน % ที่อนุมัติ	พ.ศ. 2556					พ.ศ. 2559					บันทึกผู้เบิก วันที่ 2558	
				ม.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
1.งานตัวฝายรวม															
1.1 ก่อสร้างเบื้องต้น	758,400.00	100.00	3.38									55.00	65.00		
1.2 ก่อสร้างตัวฝาย	15,949,700.00	100.00	71.12			19.00	10.00	20.00	30.00	30.00	20.00	40.00			
1.3 ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำฝาย	438,200.00	100.00	1.95			5.00	15.00	27.40	32.00	13.15					
1.4 ก่อสร้างราวกันตลิ่ง	998,100.00	100.00	4.45			10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	10.00				
1.5 ก่อสร้างอาคารประกอบ	535,600.00	100.00	2.39			5.00	25.00	25.00	24.50	5.00					
1.6 ค่าจ้างรถบรรทุกและรถขุดเจาะ	1,671,000.00	100.00	7.45			5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00			
2.งานจ้างเหมา															
2.1 จ้างเหมางานตัวฝาย ระยะที่ 1	683,000.00	100.00	3.05			100.00									
2.2 จ้างเหมางานตัวฝาย ระยะที่ 2	1,891,000.00	100.00	8.20							80.00	60.00				
รวมค่าก่อสร้าง	22,425,000.00	100.00	100.00									90.00	90.00		
งบผูกพัน เดิม (%)				0.37	12.16	10.36	19.96	27.94	18.96	10.26					
งบผูกพันเพิ่มเติม (%)				0.37	12.53	22.89	42.84	70.78	89.78	100.00					
งบผูกพัน เดิม (%)				0.37	0.16	24.43	23.18	29.34	14.51						
งบผูกพันเพิ่มเติม (%)				0.37	8.33	22.97	46.15	75.50	90.01						

๒. ฝ่ายแม่สี (สบห้วยอ้าย) อ.ลี้ จ.ลำพูน งานตัวฝาย กำแพงฝายแล้วเสร็จ และได้ติดตั้งราวกันตก และวางกล่อง Gabion ไปแล้วบางส่วน ดาดคลองได้ ๓๐๐ เมตร ปัจจุบันผลงานได้ ๘๙ % ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการฝายแม่สี (สบห้วยอ้าย) พร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ประจำเดือน เมษายน 2559

กิจกรรม	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % สิทธิเบ็ดเตล็ดกิจกรรม	น้ำหนัก % รวมของโครงการ	พ.ศ.2556					พ.ศ.2559					วันที่ปฏิบัติงาน ถึงวันที่ 2558	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
1.งานต้นน้ำบริเวณ															
1.1 กิจกรรมเนืองดิน	73,545.00	100.00	0.25									20.00	40.00	40.00	100.00
1.2 กิจกรรมตัวฝาย	22,652,606.73	100.00	78.29				10.00	10.00	20.00	30.00	20.00	5.00	5.00		100.00
1.3 กิจกรรมขุดลอกส่งน้ำ	5,432,768.15	100.00	11.86				5.00	13.00	25.00	30.00	16.25				100.00
1.4 ค่าจ้างบริหารและค่าควบคุมงาน	2,276,963.12	100.00	7.87				10.00	20.00	20.00	20.00	5.00	5.00			100.00
							8.30	15.00	17.75	2.50	17.00				100.00
							5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	5.00	5.00		100.00
							5.00	10.00	15.00	21.40	15.00	17.00			100.00
2.งานอัตราน้ำ															
2.1 จ้างขุดลอกดิน	499,879.00	100.00	1.73							40.00	60.00				100.00
										45.00	55.00				100.00
รวมราคาค่าก่อสร้าง	28,935,762.00	100.00	100.00												
แผนรวม/เดือน (%)				0.39	10.20	11.78	20.29	28.08	19.26	5.00	5.00				
แผนรวม/เดือน (%)				0.39	10.59	22.36	42.66	70.73	89.99	94.99	100.00				
ผลงาน/เดือน (%)				0.39	5.60	13.21	23.33	29.31	17.08						
ผลงาน/เดือน (%)				0.39	6.08	19.29	42.62	71.93	89.00						

สรุปผลการปฏิบัติงาน

กส.๒ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ ดังนี้

- ฝ่ายนาห้วยถ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน งานตัวฝาย เทคอนกรีตช่องระบาย
ทรายแล้วเสร็จ ๒ ช่อง ผลงานปัจจุบัน ๘๒ % คาดว่างานหลักๆ จะแล้วเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการฝ่ายนาห้วยถ้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านสบฮอย หมู่ที่ 7 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำเดือน เมษายน 2559

กิจกรรม	จำนวนเงิน	จ่ายได้ % เมื่อเริ่มปฏิบัติงาน	จ่ายได้จริง % งานของโครงการ	พ.ศ.2558					พ.ศ.2559						
				ค.ค.	พ.ค.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		
1.งานกับนิคมฯ															
1.1 กิจการเบื้องต้น	81,182.00	100.00	0.396								40.00	60.00			
1.2 กิจการตัวฝาย ขนาดสันเขื่อนสูง 3.50 ม. ยาว 57.00 ม.	15,636,065.00	100.00	76.367			10.00	10.00	20.00	25.00	20.00	15.00				
1.3 กิจการมทร.ปากคลองมีเขี้ยว ท่อ คว.ค.ค. 1.20 ม. จำนวน 43 ท่อน	375,650.00	100.00	1.855					30.00	30.00	40.00					
1.4 กิจการมทร.ปากคลองมีเขี้ยว ท่อซีเมนต์กึ่งหิน ท.ค. 0.60 ม. จำนวน 8 ท่อน	508,745.00	100.00	2.485			10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00				
1.5 กิจการอาคารประกอบ	856,058.00	100.00	4.181			10.00	10.00	10.00	5.00	25.00	15.00				
1.6 ค่าอำนาจการและค่าควบคุมงาน	1,418,409.00	100.00	6.928	3.00	7.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00				
2.งานจ้างเหมา															
2.1 จ้างแรงงานดินระยะที่ 1	1,151,000.00	100.00	5.621			100.00									
2.1 จ้างแรงงานดินระยะที่ 2	448,000.00	100.00	2.188			100.00			60.00	40.00					
รวมค่าก่อสร้าง	20,475,000.00	100.00	100.00						40.00	60.00					
แผนงาน / เดือน (%)				0.208	14.410	8.996	19.189	21.980	18.560	14.202					
แผนงานสะสม / เดือน (%)				0.208	14.617	23.613	42.802	64.782	83.142	100.000					
สถานะ / เดือน (%)				0.554	15.772	8.454	16.844	18.604	22.138						
สถานะสะสม / เดือน (%)				0.554	16.526	24.780	41.624	60.230	82.368						

สรุปโดยบุคลากร _____
แนวทาง/วิธีการแก้ไข _____

และตามที่ ผศส.๑ ให้ติดตามงานปี ๒๕๖๐ ฝ่ายนาหมากปิ่น ได้เข้าไปประชุมกับชาวบ้านเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ดิด้ปัญหาเรื่องที่ดินบริเวณที่จะก่อสร้าง ๑ ราย และเจ้าของที่ดินยังไม่มาไม่ครบ ซึ่งจะนัดเจ้าของที่ดินและที่ข้างเคียงมาประชุมอีกครั้ง ส่วนใหญ่ผู้ได้ประโยชน์ก็จะต้องการให้ก่อสร้าง

กส.๓ ขป.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ

- ระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำ (ระยะที่ ๒) ปัจจุบันผลงาน ๒๘ % งานระบบเทรางได้ ๓๐๐ เมตร ผลงานต่ำกว่าแผนเล็กน้อย และคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำ (ระยะที่ 2)
บ้านสบสาย หมู่ที่ 7 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำเดือน เมษายน 2559

กิจกรรม	จำนวนเงิน	จำนวน % เดือนส่งกิจกรรม	จำนวน % งานของโครงการ	พ.ศ.2559												
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.			
1.งานทั่วไปทางธรณี																
1.1 กิจกรรมระบบส่งน้ำฝาย	7,305,800.00	100.00	27.059			5.00	20.00	40.00	20.00	15.00						
1.2 กิจกรรมระบบส่งน้ำฝาย	17,431,200.00	100.00	64.560			10.00	30.00	40.00	20.00							
1.3 ค่าส่วนราชการและค่าควบคุมงาน	1,852,000.00	100.00	6.859			10.00	15.00	40.00	35.00							
2.งานเชิงเทคนิค																
2.1 งานเดินระยะที่ 1	411,000.00	100.00	1.522			60.00	40.00									
รวมราคาค่าก่อสร้าง	27,000,000.00	100.00	100.00			9.408	26.417	39.391	20.724	4.059						
แผนงาน / เดือน (%)						9.408	35.826	75.217	95.941	100.000						
ผลงาน / เดือน (%)						8.117	30.000									
ผลงานแผน / เดือน (%)						8.117	36.117									

สรุปปัญหาอุปสรรค
แนวทางการจัดการแก้ไข

กส.๔ ขบ.๑ รายงานความก้าวหน้างานปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑ โครงการ
ผลการดำเนินงานอ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำ เดือนเมษายน ได้ทำที่ปักคนงานแล้ว
ชุด Outlet บริเวณพื้นที่เป็นหินเยอะทำให้มีปัญหาในการก่อสร้าง ซึ่งสรุปปัญหาและอุปสรรคได้ดังนี้

๑. ด้านเครื่องจักรกลหนักชำรุด ทำให้งานบดอัดช้ากว่าแผน
๒. ด้านคนงาน ในช่วงเดือนเมษายน เทศกาลสงกรานต์ มีวันหยุดยาวหลายวัน คนงานลาหยุด
ส่งผลต่อแผนการปฏิบัติงาน

๓. ด้านสภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมิค่อนข้างร้อนจัด ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
สภาพภูมิประเทศ เป็นลักษณะดินตื้นเมื่อขุดเพื่อให้ได้ระดับ โดยเฉพาะร่องแกนจะพบลักษณะหินก้อนใหญ่ จะต้อง
สกัดทุบเพื่อให้ได้ระดับ ทำให้เกิดความล่าช้า

ผลงานตามแผน ๒๔.๖๓% ทำได้ ๒๓.๘๘ % ผลงานต่ำกว่าแผนเล็กน้อย คาดว่าเดือนพฤษภาคม
จะเร่งทำปริมาณงานได้ตามแผน

แผน - แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขลุ อำเภอบ้านไถ่ จังหวัดลำพูน
ประจำเดือน เมษายน 2559

กิจกรรม	จำนวนเงิน	จ่ายไป % สิทธิผลประโยชน์	จ่ายไป % รวมโครงการ	พ.ศ.2559												
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.			
1.รวมสิ่งก่อสร้าง																
1.1 ฝายรับน้ำ	4,812,021.00	100.00	3.65		5.00	15.00				35.00	25.00	10.00	10.00			
1.2 ฝายรวมน้ำ	23,214,391.00	100.00	26.31		10.00	15.00	10.00	20.00	25.00	10.00	5.00		5.00			
1.3 ฝายรวมน้ำส่งน้ำ	4,940,135.00	100.00	5.60		5.00	5.00	20.00	25.00	25.00	15.00	5.00					
1.4 ฝายรวมน้ำระบบน้ำ	8,556,129.00	100.00	9.70		6.00	5.00	20.00	25.00	5.00	10.00	9.00					
1.5 ฝายรวมน้ำประกอบ	3,103,090.00	100.00	3.52		5.00	5.00	20.00	30.00	25.00	10.00	5.00					
1.6 ฝายรวมน้ำประตูระบายน้ำ	18,941,234.00	100.00	21.47		10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	10.00	5.00					
1.7 ฝายรวมน้ำส่งน้ำ	16,998,200.00	100.00	19.27						40.00	30.00	20.00	10.00				
1.8 ฐานรากและเสาเข็ม	2,830,600.00	100.00	3.21		5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	10.00	5.00				
2.รวมจ่ายค่าวัสดุ					8.00	15.00	15.00									
2.1 จัดหาเงิน GCL รั้วลวดตี	4,220,000.00	100.00	4.78						40.00	30.00	15.00	10.00	5.00			
2.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ส่งน้ำ	613,000.00	100.00	0.69						40.00	30.00	15.00	10.00	5.00			
รวมค่าก่อสร้าง	88,228,800.00	100.00	100.00													
แผนงาน / เดือน (%)					3.06	8.43	6.20	15.08	28.72	20.99	10.89	6.62				
แผนงานสะสม / เดือน (%)					3.06	11.49	17.69	32.77	61.50	82.49	93.38	100.00				
ผลงาน / เดือน (%)					2.85	13.19	7.38									
ผลงานสะสม / เดือน (%)					2.85	16.08	23.66									

พด.คส.๑ รายงานความก้าวหน้าพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้

รายการ	วงเงิน	รับราคา	วันที่	ร.อ.	ประกาศร่าง	ประกาศจัดซื้อ	เสนอ	อนุมัติรับราคา	ใบสั่งซื้อ	ส่งของ	ครบถ้วน	PO	กำหนด	ครบ
						ราคาทาง	เปิดซอง	ประกาศผู้ชนะ					ตั้ง	สัญญา
1 บิดคัสต์ (ร.คส.๒)	499,726.00								8-เม.ย.-59	20-เม.ย.-59	22-เม.ย.-59	2-พ.ค.-59		
2 งานดินระยะ 1 (ร.คส.๒)	160,281.78								10-มี.ค.-59			รอกกรรมกร	10-เม.ย.-59	
3 งานดินระยะ 2 (สยค.)	439,339.00								15-มี.ค.-59			รถตักตบ	15-เม.ย.-59	
4 งานดินระยะ 2 (สยค.)	986,201.60											2-พ.ค.-59	ส่งมอบ 12-เม.ย.-59	
5 งานดินระยะ 2 (สยค.)	743,907.12											2-พ.ค.-59	รถตักตบชนิดอื่น	
6 งานจัดหาแผ่น GCL ยี่ห้อ	4,239,000.00					20-27-เม.ย.-59	4-พ.ค.-59	12-พ.ค.-59						
7 งานแบบจำลองอ่างเก็บน้ำ	100,000.00					21-เม.ย.-59							60 วัน	
8 งานจ้างม้วนท่อ	343,000.00			ไฮดรอลิก		21-เม.ย.-59							30 วัน	
9 งานจ้างเชื่อมท่อและทดสอบ	318,200.00			รถตักตบ										

- รายการที่ ๒ งานดินระยะ ๑ ระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำ ระยะที่ ๒ รอกกรรมกรเซ็น
- รายการที่ ๓ งานดินระยะ ๒ ฝายนาห้วยถ้ำ รถตักตบชนิดอัดแน่น
- รายการที่ ๔ และ ๕ งานดินระยะ ๒ ฝายช่องบ้วย และฝายแม่ลี่ จะไหลต PO วันนี้
- รายการที่ ๖ งานจัดหาแผ่น GCL อ่างเก็บน้ำห้วยโทก เสนอราคาวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จะอนุมัติรับราคาไม่เกินวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
- รายการที่ ๗ และ ๘ งานแบบจำลองอ่างเก็บน้ำห้วยโทก งานจ้างม้วนท่ออ่างปางคอง เสนอราคาแล้ว รอทำสัญญา
- รายการที่ ๙ งานจ้างเชื่อมต่อและทดสอบอ่างเก็บน้ำห้วยโทก รอแก้ไขราคากลาง

งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้

งานปีงบประมาณ ๒๕๕๙

- ฝายช่องบ้วย พร้อมระบบส่งน้ำ จ.เชียงใหม่ เบิกจ่าย ๙๐.๘๑% งานจ้าง ๓๗.๕๖%
- ฝายแม่ลี่ (สพห้วยอ้าย) พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำพูน เบิกจ่าย ๘๐.๔๓% งานจ้าง ๔๔.๒๗%
- ฝายนาห้วยถ้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ จ.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย ๙๖.๒๒% งานจ้าง ๗๑.๔๒%
- ระบบส่งน้ำฝายนาห้วยถ้ำระยะที่ ๒ จ.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย ๕๖.๑๓%
- ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำปางคอง จ.แม่ฮ่องสอน เบิกจ่าย ๗๘.๖๓%

เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๕๘

- อ่างเก็บน้ำห้วยโทก พร้อมระบบส่งน้ำ จ.ลำพูน เบิกจ่าย ๓๗.๒๙ %

ขก.คส.๑ รายงานตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบ น้ำมันและไฟฟ้า ระหว่างปี 2558 และ ปี 2559
การใช้น้ำมัน

เดือน	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	1,825	1,571	-	14%	-
กุมภาพันธ์	1,658	1,907	15%	-	-
มีนาคม	1,854	2,060	11%	-	-
เมษายน	1,965	1,404	-	29%	ลดลงจากเดือน มี.ค. 59 32%
พฤษภาคม	1,614	-	-	-	-
มิถุนายน	1,796	-	-	-	-
กรกฎาคม	1,509	-	-	-	-
สิงหาคม	1,489	-	-	-	-
กันยายน	1,981	-	-	-	-
ตุลาคม	1,809	-	-	-	-
พฤศจิกายน	1,499	-	-	-	-
ธันวาคม	2,613	-	-	-	-

การใช้ไฟฟ้า

เดือน	ปี 2558	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	3,027	5,759	90%	-	-
กุมภาพันธ์	3,291	4,255	29%	-	-
มีนาคม	5,489	7,358	34%	-	-
เมษายน	5,930	8,414	42%	-	เพิ่มขึ้นจากเดือน มี.ค. 59 14%
พฤษภาคม	6,720	-	-	-	-
มิถุนายน	7,145	-	-	-	-
กรกฎาคม	8,314	-	-	-	-
สิงหาคม	6,704	-	-	-	-
กันยายน	7,399	-	-	-	-
ตุลาคม	7,500	-	-	-	-
พฤศจิกายน	6,844	-	-	-	-
ธันวาคม	6,834	-	-	-	-

- รายงานน้ำมันเดือนเมษายน ๑,๔๐๔ ลิตร ลดลงจากเดือนมีนาคม ๓๒% เปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๘ ปริมาณการใช้ลดลง ๒๙%

- รายงานการใช้ไฟฟ้าเดือนเมษายน ๘,๔๑๔ หน่วย เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม ๑๔% และ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของปี ๒๕๕๙ เพิ่มขึ้นทุกเดือน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

1. ให้อธิการบดี ติดตามงานเรื่องร้องเรียนที่ยังค้างอยู่ พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุมทุกเดือน เสนอเป็นตารางตามที่ ผคส.๑ ให้จัดทำ แนวนวาระการประชุมและนำเสนอขึ้น Power Point ด้วย
2. แผน MTEF ให้อธิการบดี จัดทำเป็นตารางมอบหมายงาน เช่น มีงานอะไรบ้าง ใครเป็นผู้รับผิดชอบ มีผลสำรวจและแบบหรือยัง เป็นต้น โดยงานปี ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ งานปี ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙


/ระเบียบวาระที่ ๕...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- จัดหา Pointer สำหรับใช้ที่ห้องประชุม ๒ ตัว
- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๓.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น.



(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

