รายงานการประชุมประจำเดือน
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑.	นายสุดชาย พรหมมลมาศ	ผคส.๑	ประธาน
๒.	นายจุลทศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ชป.๑	
๓.	นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๒ ชป.๑	
๔.	นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ ชป.๑	
๕.	นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๔ ชป.๑	
๖.	นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๗.	นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	เลขานุการ
๘.	นางปราณี กองงาม	งบ.คส.๑	
๙.	นางสาวกัณฑารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑	
๑๐.	นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ธก.คส.๑	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑.	นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	
๑๒.	นายสามารถ อาษากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๓.	นางสาวชลมาศ ทองคำ	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายณัฐศักดิ์ เยสุวรรณ์	นายช่างชลประทาน
๒.	นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายพิทยา อิ่มเอม	วศ.คส.๑	ไปราชการกรมฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวข้อการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

➢ ท่าน อธช. โพสต์ผ่านไลน์ผู้บริหารกรมชลประทาน เวลา ๐๗.๒๘ น. วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กรมชลประทานมีภารกิจหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการ ทุกเรื่องส่วนใหญ่เร่งด่วน ต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชน เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานต้องปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม ซึ่งมีงบประมาณหลายหมื่นล้านบาท ทำให้หน่วยงานและบุคคลภายนอกคอยติดตามตรวจสอบ ดังนั้นการปฏิบัติงานต้องยึดถือระเบียบเป็นแนวทางเพื่อความถูกต้อง โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ท่าน อธช. ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กรมชลประทาน และขอขอบใจ ที่ผ่านมาทุกคนทำได้ดี ขอให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

➢ ผคส.๑ ให้เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบภาครัฐ ด้านงานพัสดุ ให้แจ้งกำหนดวันทำการเปิดซองเอกสารการยื่นสอบราคาและอื่น ๆ ให้กับผู้ที่เป็นประธานกรรมการ และกรรมการร่วมทราบ และให้มาพร้อมในการเปิดซองภายใน ๑ ชั่วโมง ณ ที่ทำการ หากมีผู้มาสังเกตการณ์ ให้สังเกตการณ์อยู่ด้านนอกและถ่ายรูปไว้ด้วย

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> **รับรองรายงานการประชุม**

กส.๓ ชป.๑ ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๑๐ บรรทัดที่ ๒ จากเดิม “ปัจจุบันทำสะพานน้ำจาก กม.๐ – กม.๘๐๐” เป็น “ปัจจุบันทำสะพานน้ำจาก กม.๐+๘๐๐ ถึง กม.๐+๙๐๐”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์ **รายงานการติดตามหนังสือร้องเรียน และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า** แทน วศ.คส.๑ ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ไม่มีเรื่องร้องเรียน และไม่มีการตอบเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทก ดังนี้

เนื่องจากภาคใต้เกิดอุทกภัย ทางสำนักงานชลประทานที่ ที่ ๑ ต้องส่งเครื่องจักรไปช่วยแก้ปัญหา ทำให้ขาดเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน ผลงานสะสมถึงเดือนมกราคม ๘๗.๒๕% ช้ากว่าแผน ๗ % และมีการปรับแผนงานก่อสร้างไปจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

/แผน-ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง...

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ

บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโส่ง จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน สุลาคม 2559

กิจกรรม	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งาน ของโครงการเฉลี่ยเท่ากับ 100%	พ.ศ.2559												พ.ศ.2560			หมายเหตุ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
1.งานดำเนินการรวม																		
1.1 กิจกรรมเบื้องต้น	4,812,021.00	5.62		5.00	15.00			35.00	25.00	10.00	10.00							
				5.00	15.00			10.00	30.00	20.00	10.00	10.00						
					60.00			10.00	5.00	5.00	5.00	5.000						
1.2 กิจกรรมทำนบดิน	23,214,391.00	27.09		10.00	15.00	10.00	20.00	25.00	10.00	5.00	5.00							
				10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00					
				10.00	25.00	15.00	5.00	15.00	2.00	5.00	10.00	5.000						
1.3 กิจกรรมอาคารท่อส่งน้ำ	3,432,300.00	4.01			5.00	5.00	20.00	25.00	25.00	15.00	5.00							
					5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	5.00	5.00			
					5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	15.000						
1.4 กิจกรรมอาคารระบายน้ำล้น	8,556,129.00	9.99			6.00	5.00	20.00	25.00	25.00	10.00	9.00							
					6.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	9.00	5.00			
1.5 กิจกรรมอาคารประกอบ	3,103,090.00	3.62			5.00	5.00	20.00	30.00	25.00	10.00	5.00							
					5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	15.00	15.00					
									5.00	5.00	10.00	10.000						
1.6 กิจกรรมปรับปรุงทางเข้าเรือน	18,941,234.00	22.11			10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	10.00	5.00							
					10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00						
					12.00	8.00	3.00	3.00	5.00	5.00	10.00	10.660						
1.7 กิจกรรมระบบส่งน้ำ	16,998,200.00	19.84						40.00	30.00	20.00	10.00							
									10.00	15.00	25.00	25.00	10.00	10.00	5.00			
											10.00	10.000						
1.8 ค่าอำนวยการและค่าควบคุมงาน	2,830,600.00	3.30		5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	10.00	5.00							
				5.00	15.00	15.00	20.00	10.00	15.00	5.00	5.00	5.00						
				8.00	15.00	10.00	8.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.000						
2.งานจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์																		
2.1 จัดหาแผ่น GCL พร้อมติดตั้ง	3,178,840.00	3.71					40.00	30.00	15.00	10.00	5.00							
								5.00	35.00	30.00	25.00	5.00						
									5.00	5.00	30.00	30.000						
2.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และพลอยท่อส่งน้ำ	613,000.00	0.72					40.00	30.00	15.00	10.00	5.00							
								5.00	30.00	25.00	20.00	10.00	10.00					
									5.00	5.00	10.00	10.000						
รวมราคาก่อสร้าง	85,679,805.00	100.00																
แผนงาน / เดือน (%)				3.06	8.43	6.20	15.08	28.72	20.99	10.89	6.62							
แผนงานสะสม / เดือน (%)				3.06	11.49	17.69	32.77	61.50	82.49	93.38	100.00							
ผลงาน / เดือน (%)				2.89	13.19	7.38	2.48	6.02	3.20	4.02	11.51	8.14	5.16	5.84	4.11			
ผลงานสะสม / เดือน (%)				2.89	16.08	23.46	25.94	31.96	35.16	39.18	50.69	72.14	77.30	83.14	87.25			
ปริมาณงาน / เดือน (%) เบี้ยจากการเบิกจ่าย				3.06	8.36	6.12	7.34	7.96	13.87	13.72	17.85	11.15	5.35	3.08	1.69			
แผนงานสะสม / เดือน (%)				3.06	11.42	17.54	24.88	32.84	46.72	60.43	78.29	89.44	94.79	97.87	100.00			
แผนการใช้จ่ายเงิน / เดือน (บาท)				2,621,802.03	7,162,831.70	5,243,604.07	6,290,434.40	6,820,098.50	11,887,282.40	11,753,825.53	15,299,098.78	9,549,763.92	4,472,165.55	329,927.30	113,980.80			
แผนการใช้จ่ายเงินสะสม / เดือน (บาท)				2,621,802.03	9,784,633.73	15,028,237.80	21,319,072.20	28,139,170.70	40,026,453.09	51,780,278.62	67,078,377.20	76,628,141.12	81,100,306.67	81,430,234.17	81,544,214.57			

100.00
* ปรับแผนครั้งที่ 1 รอผลการเบิกจ่าย
* ปรับแผนครั้งที่ 2
- เงินท่อพีวีซี ลต 1,505,300.01 บาท
จากราคากลาง 4,937,600 บาท
เหลือ 3,432,299.99 บาท คืนเงินกลับ
- เงิน แผ่น GCL ลต 1,041,158.40 บาท
จากราคากลาง 4,220,000 บาท
เหลือ 3,178,841.60 บาท คืนเงินกลับ
* ระหว่างรับที่ 1 ม.ย. 2559-17 มิ.ย.2559 ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
* โครงการก่อสร้าง สชป.1 จะขอดูทรณีขยายระยะเวลาเบิกจ่ายครั้งที่ 2
* ขยายเวลาเบิกจ่ายได้เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2559

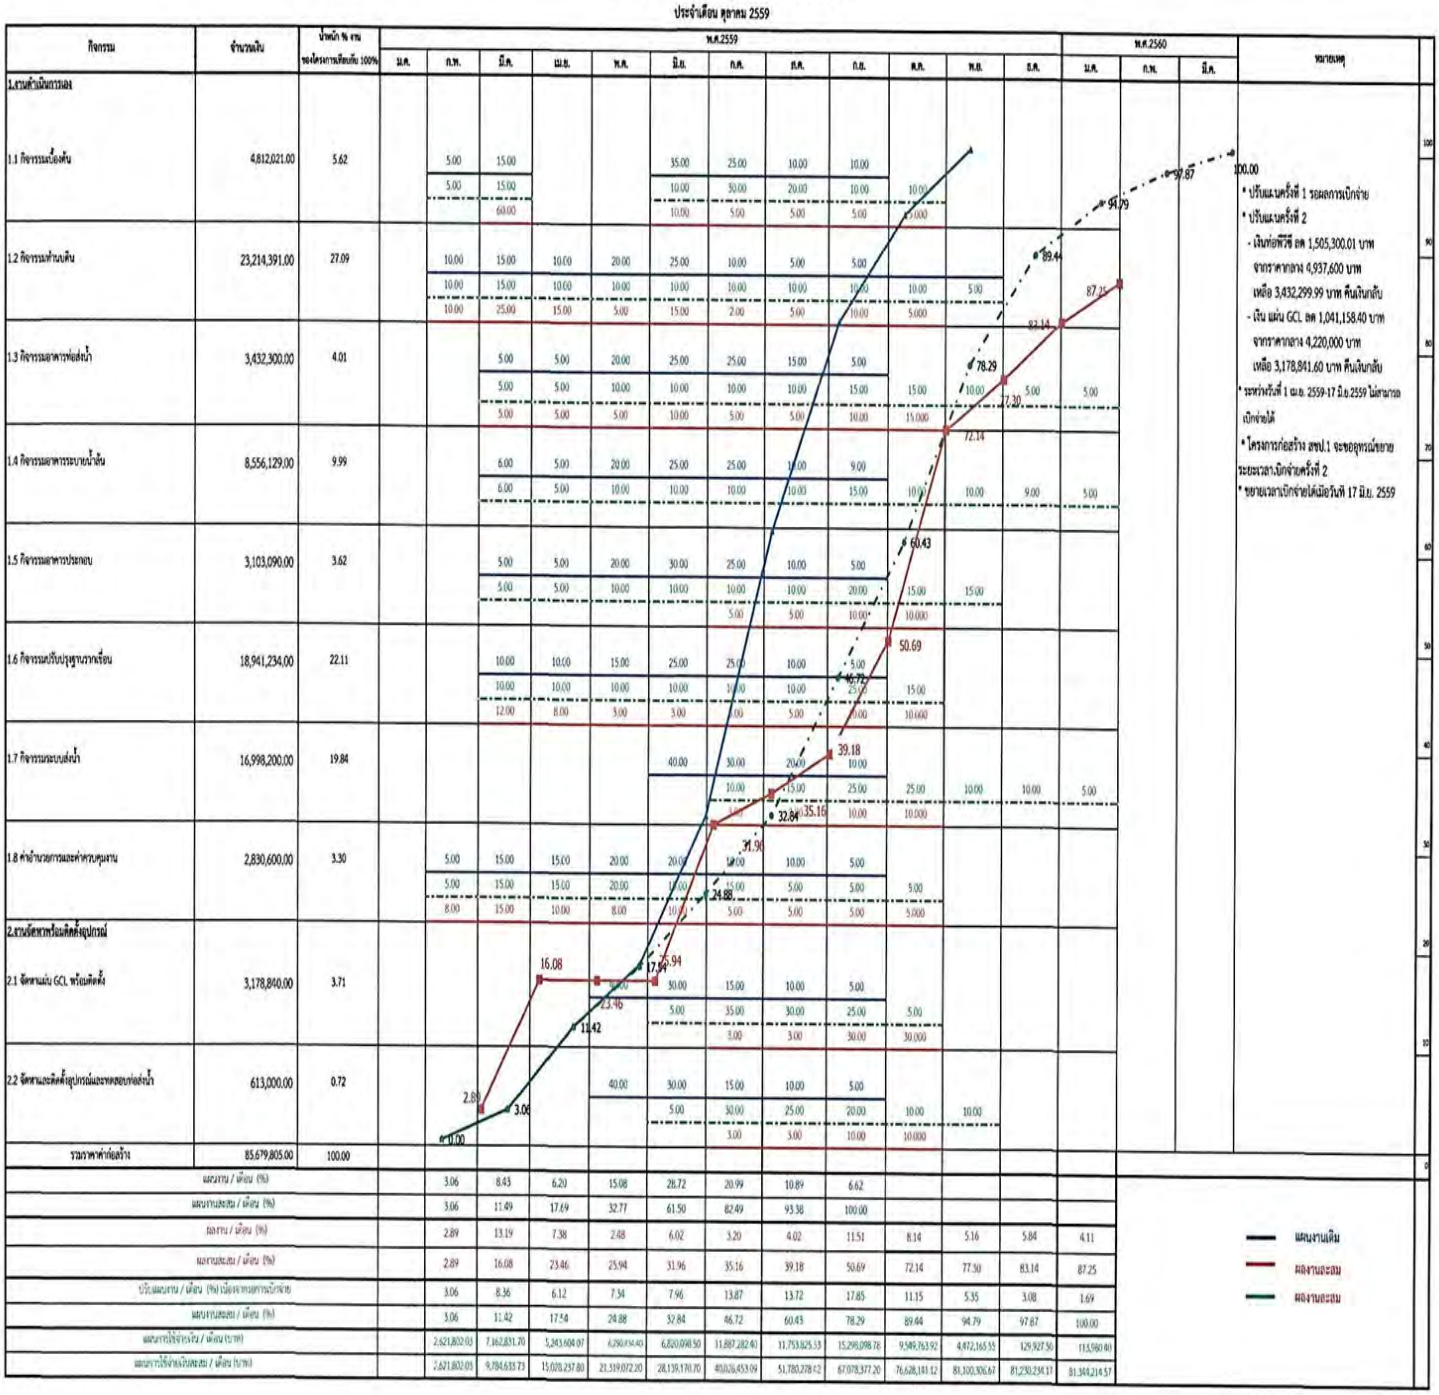

งานดินถมบดอัดแน่นด้านหน้าเขื่อน



ทดสอบระบบและบ่อเก็บน้ำ



งานเรียงหินบริเวณท่อระบายน้ำล้นบ่อเก็บน้ำ



งานระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่ ๒) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ปัจจุบันงานระบบฝั่งซ้ายได้ขุดดิน เทพื้น เทกำแพงแล้ว ผลงานสะสม ๒๕% ผลงานเร็วกว่าแผน

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่2)
ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำเดือน มกราคม 2560

กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งาน ของโครงการเทียบกับ 100%	พ.ศ.2559	พ.ศ.2560						
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1.งานดำเนินการเอง	24,730,000.00	91.59	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
			5.000	15.00						
2.ค่าอำนวยการและดำเนินงาน	2,270,000.00	8.41	5.000	10.00	15.00	10.00	20.00	15.00	15.00	10.00
			5.000	10.00						
รวมราคาค่าก่อสร้าง	27,000,000.00	100.00								
แผนงาน / เดือน (%)			5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
แผนงานสะสม / เดือน (%)			5.00	20.00	40.00	60.00	75.00	85.00	95.00	100.00
ผลงาน / เดือน (%)			15.00	10.00						
ผลงานสะสม / เดือน (%)			15.00	25.00						



งานดินขุด



เทพื้นฝั่งซ้าย




เทกำแพงฝั่งซ้าย



วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ พร้อมด้วย นายพิทยา อิ่มเอม วศ.คส.๑ และนายปารเมศ การุณนราพร กส.๔ ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา(ระยะที่๒) บ้านประตูเมือง ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กส.๑ ชป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- ฝายทาชมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน ผลงานก่อสร้าง ๓๕ %

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการฝายทาชมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซาย
บ.ทาชมพู ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ประจำเดือน พ.ย.59 - มิ.ย.60

กิจกรรม	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % เทียบแต่ละกิจกรรม	น้ำหนัก % งานของโครงการ	พ.ศ.2559 ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	พ.ศ.2560 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1.งานดำเนินการเอง													
1.1 กิจกรรมเบื้องต้น	69,507.00	100	0.15								50	50	
1.2 กิจกรรมตัวฝายและส่วนประกอบ	32,620,866.00	100	72.49			10	15	20	20	20	10	5	
1.3 ค่าอำนวยการและค่าควบคุมงาน	2,452,627.00	100	5.45		5	10	20	20	15	15	10	5	
2.งานจ้างเหมา													
2.1 จ้างเหมางานดิน	2,960,000.00	100	6.58			10	20	20	20	15	10	5	
2.2 งานจ้างตอกเข็มพืดเหล็กพร้อมจัดหา	3,135,000.00	100	6.96			50	50						
2.3 งานจ้างทำบานระบายพร้อมเครื่องยกและติดตั้ง	1,298,000.00	100	2.88								50	50	
2.4 งานจ้างทำสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้ง	2,464,000.00	100	5.47							50	50		
รวมราคาค่าก่อสร้าง	45,000,000.00	100	100										
ผลงาน / เดือน (%)					0.27	11.93	16.75	16.89	16.62	19.03	12.70	5.74	
แผนงานสะสม / เดือน (%)					0.27	12.2	28.95	45.84	62.64	81.49	94.19	100	
ผลงาน / เดือน (%)					2	13	20	-	-	-	-	-	
แผนงานสะสม / เดือน (%)					2	15	35	-	-	-	-	-	

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 1 พ.ย.59

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

(นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล)
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
ทราบ
เรียน วศ.คส.1
เพื่อโปรดทราบ

(นายจุลหศักดิ์ จิตเจริญ)
กส.1 ชป.1
ทราบ

(นายพิทยา อิ่มเอม)
วศ.คส.1

แผนงาน
ผลงาน

รถปัญหาอุปสรรค.....



ผคส.๑ ดูงานฝายทาชมพูพร้อมระบบส่งน้ำ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐




คีย์หน้าสันฝาย
แนวตอกเข็มพืดเหล็ก









กส.๒ ชป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เริ่มทำการเปิดหน้าดินด้านท้ายเขื่อนแล้ว ผลงานตามแผน ๓๐ % ผลงานสะสมปัจจุบัน ๒๓ % ช้ากว่าแผน เนื่องจากปัญหาเรื่องเครื่องจักรเครื่องมือ เดือนหน้าจะเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเขียนตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งานของโครงการ	พ.ศ.2559 พ.ย.	พ.ศ.2559 ธ.ค.	พ.ศ. 2560 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1.งานดำเนินการเอง													
1.1 กิจกรรมเบื้องต้นและส่วนประกอบทั่วไป	1.00	งาน	18,273,771.71	37.01	10.00 5.00	15.00 10.00	15.00 10.00	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00	
1.2 กิจกรรมดินขุดด้วยเครื่องจักร	58,000.00	ลบ.ม.	1,517,280.00	3.07		20.00 20.00	20.00 20.00	20.00	20.00	20.00			
1.3 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% SPCT	75,310.00	ลบ.ม.	3,901,058.00	7.90			5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	
1.4 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% SPCT	5,040.00	ลบ.ม.	250,236.00	0.51				20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
1.5 กิจกรรมปูนขาว Cao65% บรรจุถุงละ 25 กก. (3% Hydrate Lime)	63,924.00	ถุง	16,620,240.00	33.66			30.00 30.00	40.00	30.00				
1.6 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98% SPCT (Stabilizing zone)	3,050.00	ลบ.ม.	174,460.00	0.35				20.00	30.00	30.00	20.00		
1.7 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นดิน Lime Treament ด้วยเครื่องจักร 95%SPCT	35,000.00	ลบ.ม.	1,813,000.00	3.67			10.00	30.00	30.00	30.00			
1.8 กิจกรรมงานหินทิ้ง RockFillToe	1,240.00	ลบ.ม.	691,920.00	1.40								50.00	50.00
1.9 กิจกรรมงานคอนกรีตดาด GUTTER DRAIN	237.00	ลบ.ม.	934,017.00	1.89								50.00	50.00
1.10 กิจกรรมป้องกันการกัดเซาะ	1.00	งาน	2,054,281.00	4.16								50.00	50.00
1.11 ค่าอำนวยการ	1.00	งาน	3,149,736.29	6.38	15.00 15.00	20.00 20.00	15.00 15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00
รวมราคาค่าก่อสร้าง			49,380,000.00	100.00									
แผนงาน / เดือน (%)					4.66	7.44	17.98	23.12	19.79	9.69	6.09	7.18	4.05
แผนงานสะสม / เดือน (%)					4.66	12.10	30.08	53.20	72.99	82.68	88.77	95.95	100.00
ผลงาน / เดือน (%)					2.81	5.59	15.37						
ผลงานสะสม / เดือน (%)					2.81	8.40	23.77						



วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ม.ค.๒๕๖๐ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ ติดตามตรวจงานโครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมี นายสุภรวัฒน์ สุรการ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่๒ เป็นผู้ควบคุมงาน









/ฝายห้วยไคร้...


- ฝายห้วยไคร้ (ลูกที่ ๒) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันเทคีย์เสร็จแล้ว ๓ ตัว จากทั้งหมด ๔ ตัว เตรียมตั้งแบบเทกำแพง สูง ๔.๕๐ เมตร งานระบบเริ่มดำเนินงานแล้ว ประมาณ ๒๐๐ เมตร ต่อจากแนวฝายเดิม ผลงานก่อสร้าง ๑๖ % เป็นไปตามแผน

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการฝายห้วยไคร้(ลูกที่2) พร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งานของโครงการ		พ.ศ.2559	พ.ศ. 2560							
						ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1.งานดำเนินการเอง														
1.1 กิจกรรมเบื้องต้นและส่วนประกอบทั่วไป	1.00	งาน	1,408,912.27	3.81		5.00 3.00	10.00 10.00	20.00	20.00	15.00	15.00	10.00	5.00	
1.2 กิจกรรมฝายคอนกรีต	1.00	แห่ง	12,049,941.46	32.57		5.00 5.00	10.00 10.00	25.00	25.00	20.00	15.00			
1.3 กิจกรรม ทรบ.ปากคลอง	1.00	แห่ง	313,967.55	0.85					100.00					
1.4 กิจกรรมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ	2,131.00	เมตร	20,459,480.75	55.30		5.00 5.00	10.00 10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00
1.5 ค่าอำนวยการ	1.00	งาน	2,768,898.61	7.48		15.00 15.00	20.00 20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00
รวมราคาค่าก่อสร้าง			37,000,000.00	100.00										
แผนงาน / เดือน (%)						5.71	10.66	18.32	18.79	16.13	14.50	6.66	6.09	3.14
แผนงานสะสม / เดือน (%)						5.71	16.37	34.69	53.48	69.61	84.11	90.77	96.86	100.00
ผลงาน / เดือน (%)						5.63	10.66							
ผลงานสะสม / เดือน (%)						5.63	16.29							



อาคารที่ทำการชั่วคราว

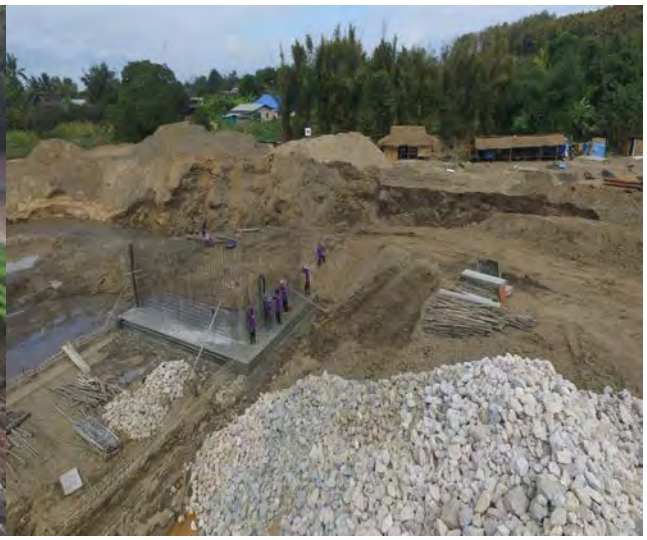







/โครงการพัฒนา...

โครงการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อใช้แก้ปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่า เป็นงานที่ ผส.ชป.๑ มอบให้ กส.๒ ชป.๑ ดำเนินการ งบประมาณ ๔๓ ล้านบาท ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้ว เบื้องต้นพบปัญหาด้านสิ่งกีดขวางทางน้ำ

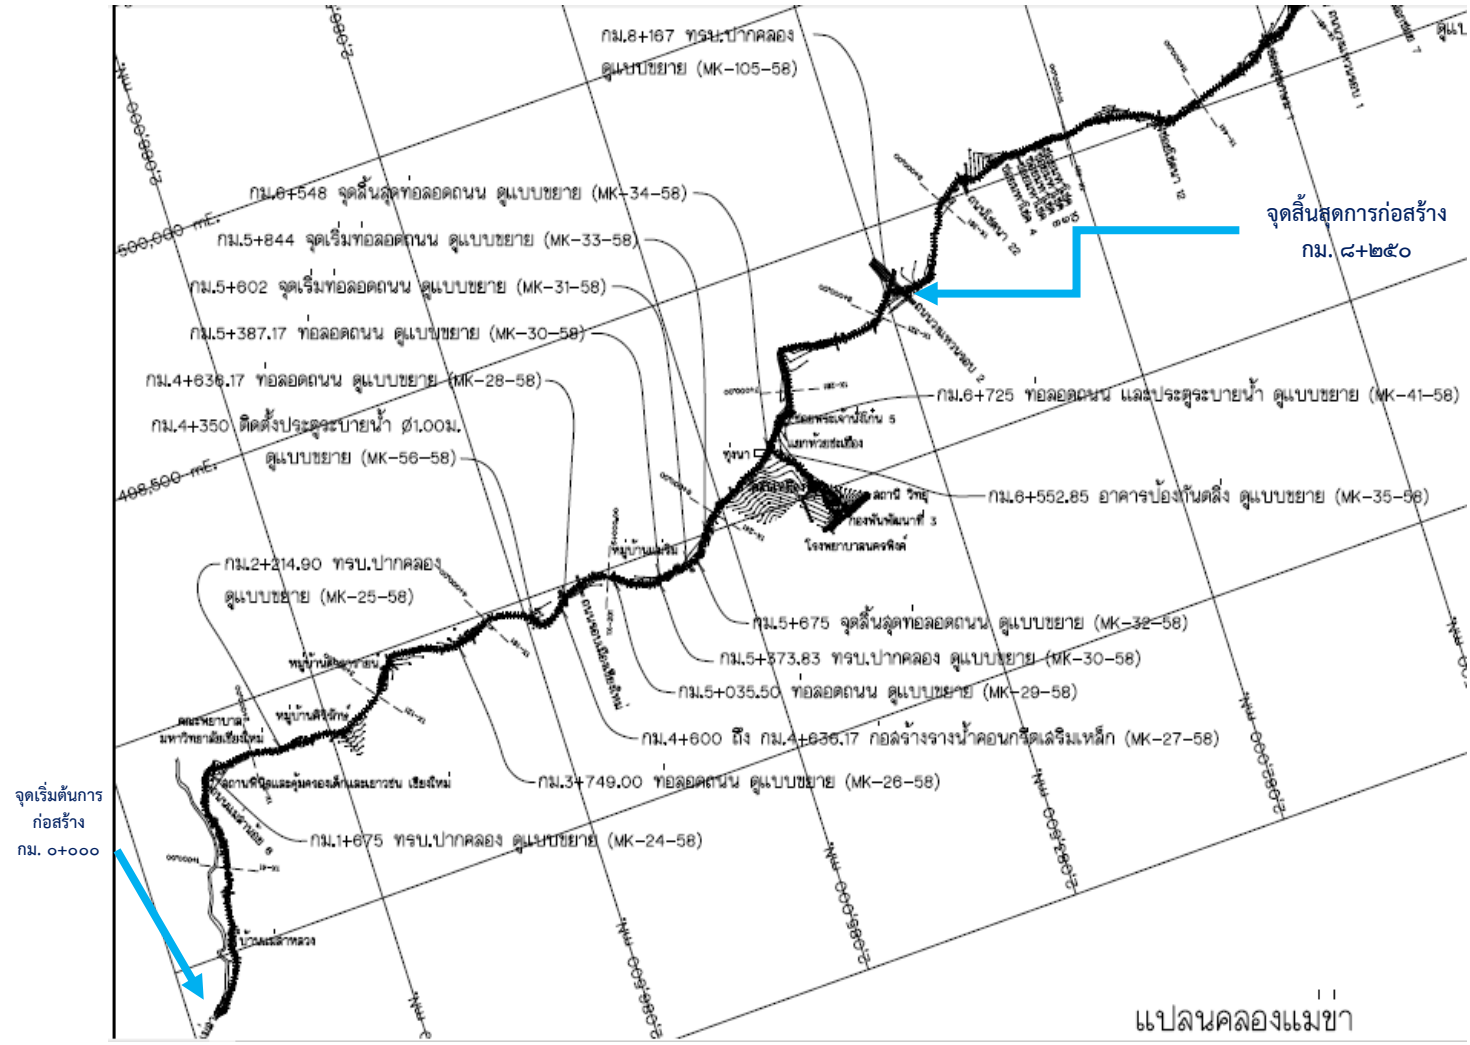

/กส.๓ ชป.๑ รายงาน...

กส.๓ ชป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ระบบรางคอนกรีต ๘๐๐ เมตร สะพานน้ำ ๑๕๐ เมตร งานคอนกรีตเสร็จแล้ว ๘๐ เมตร และทำสะพานข้ามน้ำแม่แตงเสร็จแล้ว ผลงานสะสม ๒๐% เป็นไปตามแผน

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ
ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำเดือน มกราคม 2560

กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งาน ของโครงการเทียบกับ 100%	พ.ศ.2559	พ.ศ.2560						
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1.งานจ้างเหมา	5,027,000.00	14.20	15.000	20.00			40.00	25.00		
			30.000	15.00						
2.งานดำเนินการเอง	28,293,000.00	79.90	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
			5.000	15.00						
3.ค่าอำนวยการและดำเนินงาน	2,091,000.00	5.90	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
			5.000	15.00						
รวมราคาค่าก่อสร้าง	35,411,000.00	100.00								
แผนงาน / เดือน (%)			6.00	16.00	17.00	17.00	18.00	12.00	9.00	4.00
แผนงานสะสม / เดือน (%)			6.00	22.00	39.00	56.00	74.00	86.00	95.00	99.00
ผลงาน / เดือน (%)			10.00	10.00						
ผลงานสะสม / เดือน (%)			10.00	20.00						



วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ ลงพื้นที่ดูงานระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจะเด็ด สุวรรณธรรมมา กส.๓ ชป.๑ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน













กส.๔ ชป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่รับมอบหมาย ดังนี้

- ฝายนาหมากปินพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแบบเทคีย์แล้ว โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง ช่วงแรกจะเท ๓๐ เมตร ช่วงหลังฝั่งขวาเทอีก ๑๐ เมตร ผลงานก่อสร้าง ๑๖% ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย เนื่องจากปัญหาเรื่องน้ำ ต้องใช้เครื่องสูบน้ำผันน้ำออก จึงสามารถทำงานได้ และยังทำงานระบบควบคู่ไปด้วย ในเดือนนี้จะเร่งให้ทันตามแผน และคาดว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะทำได้เกินกว่าแผน





แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
งานก่อสร้างฝายนาหมากปืนพร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลป่างหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำเดือน มกราคม 2560

กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งาน ของโครงการเทียบกับ 100%	พ.ศ.2559	พ.ศ.2560						
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1.งานจ้างเหมา	2,030,000.00	4.72	15.000	20.00			40.00	25.00		
			5.000	15.00						
2.งานดำเนินการเอง	778,146.40	1.81								
2.1 กิจกรรมฝายคอนกรีต	12,442,208.05	28.94	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
			5.000	10.00						
2.2 กิจกรรมระบบส่งน้ำสาย RMC	10,450,537.17	24.30	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
			5.000	10.00						
2.3 กิจกรรมระบบส่งน้ำสาย 1R-RMC	14,747,108.38	34.30	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
			5.000	10.00						
3.ค่าอำนวยการและดำเนินงาน	2,552,000.00	5.93	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
			5.000	10.00						
รวมราคาค่าก่อสร้าง	43,000,000.00	100.00								
แผนงาน / เดือน (%)			5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
แผนงานสะสม / เดือน (%)			5.00	20.00	40.00	60.00	75.00	85.00	95.00	100.00
ผลงาน / เดือน (%)			3.00	10.00						
ผลงานสะสม / เดือน (%)			3.00	16.00						







วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๔ นายปารเมศ การุณนราพร ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการฝายนาหมากปินพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน



➢ รายงานความก้าวหน้างานที่เตรียมความพร้อม ดังนี้

- ฝายห้วยฟานพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้ว มีแบบเรียบร้อยแล้ว จัดทำประมาณการและเตรียมความพร้อมส่งแล้ว



- ฝายบ้านนาจลองพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน มีรายงานการศึกษา สำรวจออกแบบแล้ว จากการเข้าพื้นที่ ตัวฝายเดิมได้รับความเสียหาย ต้องเลื่อนจุดดำเนินการลงไปประมาณ ๘๐๐ เมตร

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝายนาจลองพร้อมระบบส่งน้ำ

โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบเพิ่มเติม ปี 60







- ระบบส่งน้ำฝายแม่จอน(ระยะที่๒) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีความพร้อมทุกอย่างแล้ว

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบส่งน้ำฝายแม่จอน (ระยะที่ 2)

โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบเพิ่มเติม ปี 60






/ฝายหาดห้วยตะลาน...

- ฝายหาดห้วยตะลาน พร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เดิมมีการสำรวจแล้ว แต่ยังไม่มีการพิจารณาโครงการ และเมื่อได้เข้าไปพิจารณาโครงการ จะต้องเลื่อนจุดก่อสร้างลงมา ๑ กม. ผลสำรวจเดิมใช้ไม่ได้ ต้องสำรวจใหม่ ปัญหาก็คือการพิจารณาโครงการใช้ Agri-map และตรงพื้นที่สีเหลืองเหมาะกับการปลูกยางพารา จึงจะออกแบบโดยใช้เป็นท่อส่งน้ำ แต่กลุ่มผู้ใช้น้ำเดิมทำนา



/ระบบส่งน้ำบ้านประตูเมือง...


- ระบบส่งน้ำบ้านประตูเมือง อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้เข้าสำรวจและส่งผลสำรวจให้ออกแบบแล้ว จากการสำรวจลำเหมือง พบปัญหาช่วงด้านท้ายระดับจะเหินขึ้น

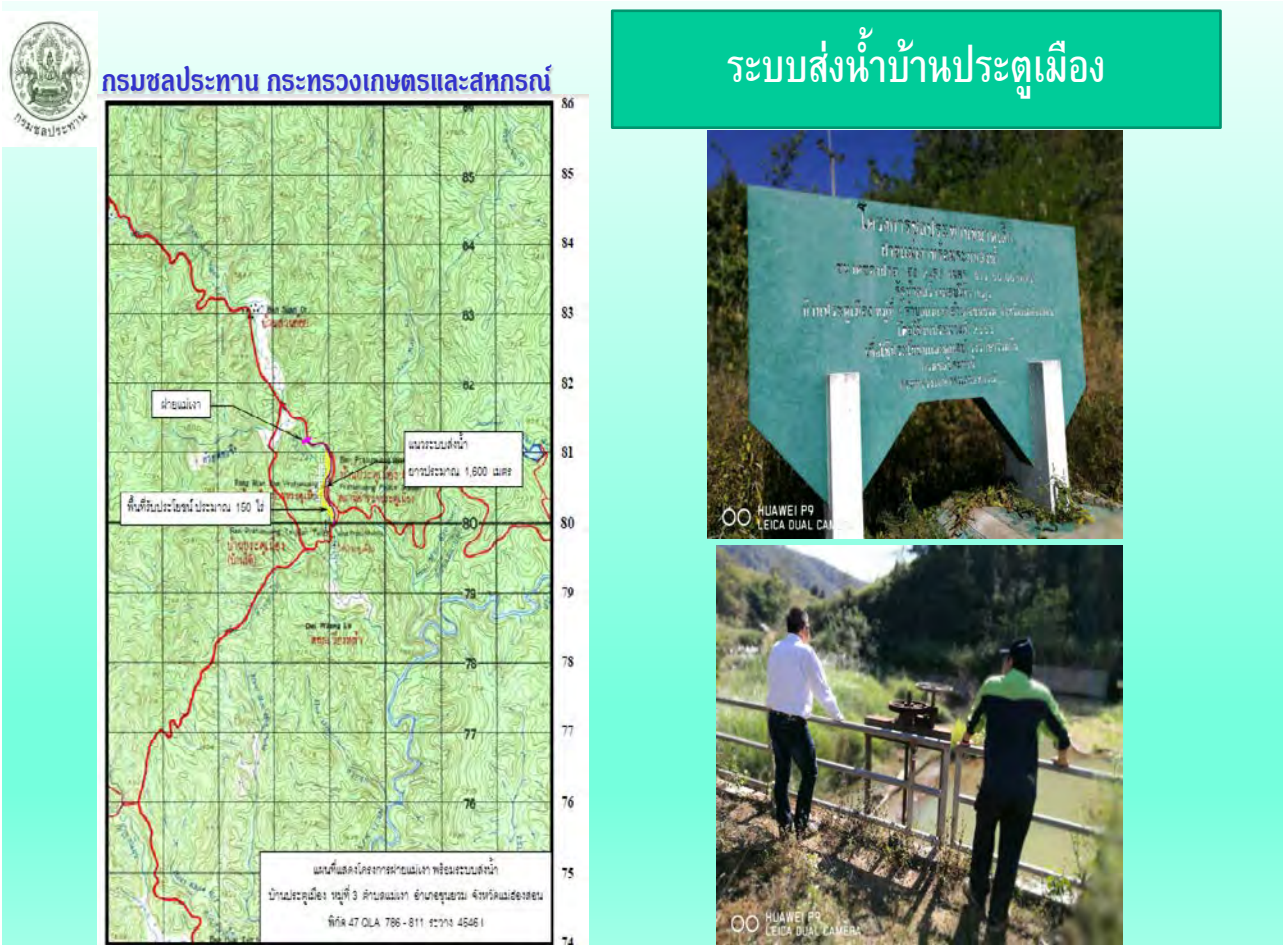

/ฝายทรายมูลพร้อมระบบส่งน้ำ...

- ฝายทรายมูลพร้อมระบบส่งน้ำ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ออกแบบแล้ว รอ ผส.ชป.๑ อนุมัติ

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

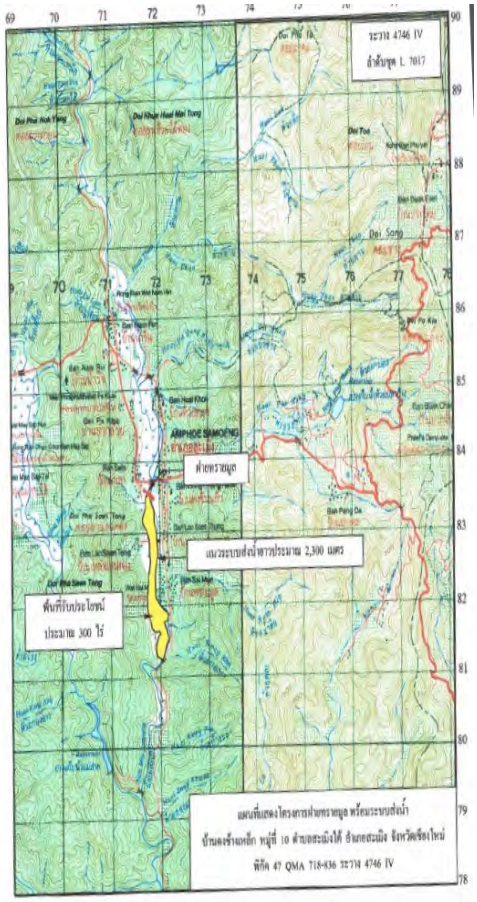





พด.คส.๑ รายงานความก้าวหน้างานพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้

งานซื้อยังคงค้างส่งของ งานห้วยไคร้ ๕ รายการ หินใหญ่ ทราย ปูน เหล็ก หินย่อย จะส่งของได้ทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ และผลทดสอบมาหมดแล้ว ผลทดสอบแผ่นดินเหนียวออกแล้ว ส่วนปูนขาว ทำหนังสือแจ้งเตือน แจ้งปรับ แจ้งสงวนสิทธิ์ แจ้งค่าปรับแล้ว

	รายการ		ร้านที่ให้	วงเงิน	ราคา	จำนวน	เบิกจ่าย	ใบสั่งสัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา		
1	หินใหญ่ ฝหค	ส.08	บีพี	1,352,700.00	1,350,535.00	1051 ลบม	681,050.00	13 ธค.59	15ธค 59	16ธค 59	16ธค 59	60 วัน 2 ง.	ง.1 12 มค 60	รายการ 1-5 ผลเทสมาแล้ว	
													ง.2 11 กพ 60		
2	ทราย ฝหค	ส.22	บีพี	1,643,000.00	1,240,200.00	2,120.00	585,000.00	9 ธค.59	14 ธค.59	15 ธค.59	15 ธค.59	80 วัน 3 ง	ง.1 8 มค 60		
													ง.2 7 กพ 60		
													ง.3 27 กพ 60		
3	ปูน ฝหค	eb 06	สยามซีวิล	3,164,000.00	2,237,930.00	15,434.00	1,160,000.00	14 ธค 59	19 ธค 59	20 ธค 59	20 ธค 59	60 วัน	ง.1 13 มค 60		
												* 30	ง.2 12 กพ 60		
4	เหล็ก ฝหค	eb 09	อนุพงษ์	3,133,400.00	2,480,972.07	131,152.10	1,315,838.79	14 ธค 59	19 ธค 59	20 ธค 59	20 ธค 59	60 วัน	ง.1 13 มค 60		
												* 30	ง.2 12 กพ 60		
5	หินย่อย ฝหค	eb 10	บีพี	2,529,700.00	2,451,250.00	1,961.00	1,250,000.00	14 ธค 59	19 ธค 59	20 ธค 59	20 ธค 59	60 วัน	ง.1 13 มค 60		
												* 30	ง.2 12 กพ 60		
6	คอนกรีตผสมเสร็จ ฝมป	ส.16	cps	1,633,400.00	933,530.00	559 ลบม		14 ธค.59	19 ธค.59	20 ธค.59	20 ธค.59	20 วัน 2	ง.1 24 ธค 59	แจ้งหยุดส่งของ 22 ธค 59 -แจ้งให้ส่งมอบ 31 มค 60	
													ง.2 3 มค 60	ส่งบิล 6 กพ, 16 กพ ทำของคลดค่าปรับวันที่ 17 กพ ครั้งเดียว และรอผลเทส	
7	คอนกรีตผสมเสร็จ ฝคธ	ส.20	ชไนทัย	1,612,000.00	1,484,900.00	620.00		14 ธค.59	19 ธค.59	20 ธค.59	20 ธค.59	30วัน	ง.1 29 ธค 59	แจ้งหยุดส่งของ 27 ธค 59 -แจ้งให้ส่งมอบ 25 มค 60	
													ง.2 13 มค 60	ส่งบิล 6 กพ, 16 กพ ทำของคลดค่าปรับวันที่ 17 กพ ครั้งเดียว และรอผลเทส	
8	แผ่นดินเหนียว GCL อหช		KKL	7,075,000.00	5,783,671.00		5,783,671.00					30 วัน	ง.2 28 ธค 59	รอผลเทส วิทยุมาสำนักแล้ว	
9	ปูนขาว Cao อหช		ชไนทัย	16,620,300.00	8,289,664.32							90 วัน	ง 2 28 มค 60	แจ้งเตือน 30 มค 60 แจ้งปรับ 3 กพ 60 แจ้งสงวนสิทธิการปรับ	
													ง 3 27 กพ 60	และแจ้งค่าปรับต่อไป	
10	เหล็กข้ออ้อย ฝหค	eb13	อนุพงษ์	428,400.00	338,891.28			7 กพ.60				5 วันทำการ			
									เริ่มสัญญา	ครบสัญญา					
10	จ้างงานดิน ฝมป	สจ.01	sps	1,985,600.00	1,471,500.00			12 มค 60	17 มค 60	16 พค 60		120 วัน			
11	จ้างงานดิน ฝหช	จ.01	ศรีชาติ	2,960,000.00	1,459,797.36			12 มค 60	17 มค 60	15 กค 60		180 วัน			
12	จ้างงานดิน ฝคธ	จ.02	ศรีชาติ	4,504,200.00	2,394,558.60			12 มค 60	17 มค 60	15 กค 60		180 วัน			
13	จ้างตอกเข็มพืด ฝหช	จ.03	ธนา	3,135,000.00	1,897,610.00			25 มค 60	27 มค 60	27 มีค 60		60 วัน			
14	จ้างทำสะพาน ฝหช	จ.04	วรรณภูมิ	2,464,000.00	2,448,000.00			กลาง กพ				150 วัน			
15	จ้างทำบานระบาย ฝหช	ส 30	ปิยะกิจ	1,298,000.00	1,275,000.00			มีค				120 วัน			

/งบ.คส.๑ รายงาน...

งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เบิกจ่ายได้ ๔๔%

- ฝายห้วยไคร้(ลูกที่ ๒) พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๔๗.๗๗%
- ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ เบิกจ่ายได้ ๗๐.๑๙%
- ฝายนาหมากปิน พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๕๒.๕๙%
- ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา เบิกจ่ายได้ ๗๔.๓๒%
- ฝายทาชมพู พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๖๗.๔๒%
- อ่างเก็บน้ำห้วยเขียว เบิกจ่ายได้ ๒๘.๕๑%

<u>เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๘</u>

- อ่างเก็บน้ำห้วยโทก เบิกจ่ายได้ ๙๒.๕๒%

- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี ๒๕๕๙ ออกแล้ว สามารถเข้าระบบ RID-FAD slip และพิมพ์ออกมาได้
- กรณีการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมที่มีระยะยาวและต่อเนื่อง เดิมสามารถเดินทางไปกลับในช่วงวันที่ไม่มีการอบรมและเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ แต่จากนี้ไปไม่สามารถเบิกได้

ธก.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหาร ดังนี้

การลาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการได้ดำเนินการแล้ว แต่จะพิมพ์ใบลาออกมาให้ ผคส.๑ เซ็นเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ด้านงานประกันสังคม ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี จะสามารถแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ และหากมีลูกจ้างต้องการเปลี่ยนก็สามารถดำเนินการได้ในช่วงนี้

สำหรับข้าราชการประเภททั่วไปของโครงการก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะระดับชำนาญงาน หากเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือเต็มขั้นแล้ว จะสามารถเลื่อนเงินเดือนไปได้อีกในระดับถัดไป แต่จะใช้ฐานเงินเดือนเดิมคำนวณ

ชก.คส.๑ รายงานตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ดังนี้

- รายงานการใช้น้ำมันเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒,๐๑๓ ลิตร ลดลงจากเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๙ ๒๘%
- รายงานการใช้ไฟฟ้าเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔,๘๙๙ หน่วย ลดลงจากเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๙ ๑๕%

ตารางเปรียบเทียบ น้ำมันและไฟฟ้า ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560

การใช้น้ำมัน

เดือน	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	1,571	2013	28%	-	-
กุมภาพันธ์	1,907	-	-	-	-
มีนาคม	2,060	-	-	-	-
เมษายน	1,404	-	-	-	-
พฤษภาคม	1,918	-	-	-	-
มิถุนายน	1,546	-	-	-	-
กรกฎาคม	1,561	-	-	-	-
สิงหาคม	1,349	-	-	-	-
กันยายน	1,107	-	-	-	-
ตุลาคม	868	-	-	-	-
พฤศจิกายน	3,412	-	-	-	-
ธันวาคม	1,618	-	-	-	-

การใช้ไฟฟ้า

เดือน	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	5759	4899	-	15%	-
กุมภาพันธ์	4255	-	-	-	-
มีนาคม	7358	-	-	-	-
เมษายน	8414	-	-	-	-
พฤษภาคม	9878	-	-	-	-
มิถุนายน	9201	-	-	-	-
กรกฎาคม	7883	-	-	-	-
สิงหาคม	8210	-	-	-	-
กันยายน	8580	-	-	-	-
ตุลาคม	7443	-	-	-	-
พฤศจิกายน	7874	-	-	-	-
ธันวาคม	6588	-	-	-	-

/ระเบียบวาระที่ ๔...

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

- ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา

<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u> **เรื่องอื่น ๆ**

- กำหนดวันไปตรวจงานของ ผคส.๑
  - วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ระบบฝายน้ำแม่เงา ฝายนาหมากปิน
  - วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อ่างฯ ห้วยเขียว อ่างฯ ห้วยโทก ฝายทาชมพู
  - วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ฝายตีนธาตุ ฝายห้วยไคร้
- กำหนดวันประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

<u>เลิกประชุมเวลา</u> ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายชื่อผู้มาประชุมประจำเดือนโครงการ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นายสุดชาย พรหมมลมาศ	ผคส.๑		ประธาน
๒	นายพิทยา อิ่มเอม	วศ.คส.๑		ไปราชการ
๓	นายจุลทศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ชป.๑		
๔	นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๒ชป.๑		
๕	นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ชป.๑		
๖	นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๔ชป.๑		
๗	นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ		
๘	นายสามารถ อาษากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน		
๙	นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑		
๑๐	นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑		เลขานุการ
๑๑	นางปราณี กองงาม	งบ.คส.๑		
๑๒	นางสาวกัณฑารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑		
๑๓	นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ธก.คส.๑		ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔	นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	โยธิน สุธรรม	
๑๕	น.ส.ชลมาศ ทาอ่า	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน		
๑๖	นาย ณัฐสักสี เยสุวรรณ	นายช่างชลประทาน		
