รายงานการประชุมประจำเดือน
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑.	นายสุดชาย พรหมมลมาศ	ผคส.๑	ประธาน
๒.	นายพิทยา อิ่มเอม	วศ.คส.๑	
๓.	นายจุลทศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ชป.๑	
๔.	นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๒ ชป.๑	
๕.	นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ ชป.๑	
๖.	นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๔ ชป.๑	
๗.	นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑	
๘.	นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑	เลขานุการ
๙.	นางปราณี กองงาม	งบ.คส.๑	
๑๐.	นางสาวกัณฑารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑	
๑๑.	นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ธก.คส.๑	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒.	นายสามารถ อาษากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน	
๑๓.	นางสาวชลมาศ ทองคำ	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายณัฐศักดิ์ เยสุวรรณ์	นายช่างชลประทาน
๒.	นายเดชา จรรยพัฒน์	นายช่างชลประทาน
๓.	นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ	ดูงานอ่างห้วยเขียว

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และเลขานุการรายงานหัวข้อการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

➢ แนวทางการสรุปสาระสำคัญการตอบประเด็นข่าวสำคัญ จะต้องครอบคลุมสาระสำคัญในประเด็นดังต่อไปนี้

๑. สรุปสาระสำคัญเหตุการณ์/ข้อเท็จจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร

๒. ได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่ ดำเนินการเรื่องใดไปแล้ว และดำเนินการอย่างไร

๓. หากยังไม่เคยดำเนินการตามข้อ ๒ จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นใดบ้าง และจะดำเนินการอย่างไร

๔. แนวทางการแก้ไขปัญหา/เรื่องที่เกิดขึ้นตามประเด็นข่าว หากได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว คาดว่าจะทำให้เหตุการณ์/สถานการณ์นั้น คลี่คลาย/ลดลง/หมดไป ได้แค่ไหนเพียงใด

๕. ช่องทางการเผยแพร่ ท้ายรายงานประเด็นข่าว ขอให้หน่วยงานระบุชื่อของสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ให้ชัดเจน เช่น หนังสือพิมพ์อะไร ทีวีช่องไหน สถานีวิทยุใด สื่อสังคมออนไลน์สื่อใด ฯลฯ

หากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการมีประเด็นข่าว ก็ต้องตอบสาระสำคัญให้ครอบคลุมทั้ง ๕ ข้อ

➢ กรมชลประทานเปิดรับสมัคร**เกษตรกรที่ไม่เพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง** ให้มาซ่อมแซม ขุดลอกคลองส่งน้ำ หรือทำงานก่อสร้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้

หากงานก่อสร้างยังมีอัตราจ้างเหลือ ขอให้พิจารณาการจ้างเกษตรกรในพื้นที่นั้นทำงานด้วย

➢ ตามคำสั่งกรมฯ ที่ ๓๕/๒๕๖๐ เรื่องการแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ ซึ่งเกี่ยวข้องและมีสาระสำคัญมาก คือเรื่องของหนังสืออุทิศที่ดิน ขอกำชับในการปฏิบัติงานก่อสร้าง หากไม่ใช่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ จะต้องให้เจ้าของที่ดิน ทำหนังสืออุทิศที่ดินตามแบบฟอร์มของโครงการไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง

และเรื่องการถ่ายโอนภารกิจหรือส่งมอบงานก่อสร้างให้สำนักงานชลประทาน/องค์กรปกครองท้องถิ่น ขอให้ดำเนินการตามหลักการและขอบเขตการถ่ายโอน ตามหนังสือของ สบอ.๓๘๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่องการถ่ายโอนภารกิจโครงการชลประทานขนาดเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> **รับรองรายงานการประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

/<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u>...

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

วศ.คส.๑ **รายงานการติดตามหนังสือร้องเรียน และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า**

- ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไม่มีเรื่องร้องเรียน และไม่มีการตอบเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า

รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม จำนวน ๒ โครงการ ตามแผนงาน : การพัฒนาระบบกระจายน้ำ ที่ผ่านการพิจารณาของกลุ่มจังหวัด ได้แก่

๑. โครงการเสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ปอน ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

๒. โครงการเสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่นาป๊าก ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ วศ.คส.๑ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงเพื่อการมีส่วนร่วมของราษฎร





รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทก ดังนี้

เตรียมตั้งแบบ Spill way และงานท้าย Spill way ตั้งแบบจะเทคอนกรีตวันนี้ อาคาร Control House จะเป็นแบบใหม่ หลังคาจะเป็นกระเบื้องว่าว

ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้งานนี้ล่าช้า เนื่องจากสภาพฐานรากของตัวเขื่อนจะมีลักษณะเป็นหินโพรง และปัญหาเครื่องจักรเครื่องมือของงานแทรกเตอร์เสียบ่อย ใช้งานไม่ได้ ทำให้งานดินถมบดอัดแน่นล่าช้า

ผลงานสะสม ๘๙.๔๕%

ตั้งแบบ Spill way



อาคาร Control House



งานดินถมบดอัด



รถเสียรอการซ่อม



วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่๑ ติดตามตรวจงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านห้วยโทก ต.ป่าพูล อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ
บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11 ตำบลป่าพูล อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรม	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งาน ของโครงการทั้งสิ้นกับ 10099	พ.ศ.2559 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	พ.ศ.2560 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	หมายเหตุ
1.งานดินงานทาง																		
1.1 กิจกรรมเบื้องต้น	4,812,021.00	5.62		5.00	15.00			35.00	25.00	10.00	10.00							
				5.00	15.00			10.00	20.00	20.00	10.00	10.00						
					60.00			10.00	5.00	5.00	5.00	5.000						
1.2 กิจกรรมถ่านดิน	23,214,391.00	27.09		10.00	15.00	10.00	20.00	25.00	10.00	5.00	5.00							
				10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00					
				10.00	25.00	15.00	5.00	15.00	2.00	5.00	10.00	5.000						
1.3 กิจกรรมอาคารท่อส่งน้ำ	3,432,300.00	4.01			5.00	5.00	20.00	25.00	25.00	15.00	5.00							
					5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	5.00	5.00			
					5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	15.000						
1.4 กิจกรรมอาคารระบายน้ำล้น	8,556,129.00	9.99			6.00	5.00	20.00	25.00	25.00	10.00	9.00							
					6.00	5.00	10.00	10.00	10.00	5.00	15.00	10.00	10.00	5.00				
1.5 กิจกรรมอาคารประกอบ	3,103,090.00	3.62			5.00	5.00	20.00	30.00	25.00	10.00	5.00							
					5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	15.00	15.00					
									5.00	5.00	10.00	10.000						
1.6 กิจกรรมปรับปรุงฐานรากเขื่อน	18,941,234.00	22.11			10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	10.00	5.00							
					10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00						
					12.00	8.00	3.00	3.00	5.00	5.00	20.00	10.000						
1.7 กิจกรรมระบบส่งน้ำ	16,998,200.00	19.84						40.00	20.00	10.00	10.00							
								10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	10.00	10.00	5.00			
								31.96	5.00	5.00	10.00	10.000						
1.8 ค่าอำนวยการและค่าควบคุมงาน	2,830,600.00	3.30		5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	10.00	10.00	5.00							
				5.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00						
				6.00	15.00	10.00	6.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.000						
2.งบบริหารโครงสิ้นสุดงานก่อสร้าง																		
2.1 จัดหาแผ่น GCL พร้อมติดตั้ง	3,178,840.00	3.71					40.00	30.00	15.00	10.00	5.00							
								5.00	35.00	30.00	25.00	5.00						
									5.00	5.00	30.00	30.000						
2.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบท่อส่งน้ำ	613,000.00	0.72					40.00	30.00	15.00	10.00	5.00							
								5.00	30.00	25.00	20.00	10.00	10.00					
									5.00	5.00	10.00	10.000						
รวมราคาก่อสร้าง	85,679,805.00	100.00																
แผนงาน / เดือน (%)				3.06	8.43	6.20	15.08	28.72	20.99	10.89	6.62							
แผนงานสะสม / เดือน (%)				3.06	11.49	17.69	32.77	61.50	82.49	93.38	100.00							
ผลงาน / เดือน (%)				2.89	13.19	7.34	2.48	6.65	3.20	4.05	11.51	8.14	5.10	5.84	4.11	2.20		
ผลงานสะสม / เดือน (%)				2.89	16.08	23.44	25.94	31.96	35.16	39.18	50.69	72.14	77.30	83.14	87.25	89.45		
ปรับแผนงาน / เดือน (%) เนื่องจากการเบิกจ่าย				3.06	8.56	6.32	7.54	7.96	13.67	13.72	17.85	11.15	5.35	5.06	1.69			
แผนงานสะสม / เดือน (%)				3.06	11.62	17.94	24.88	32.84	46.72	60.43	78.29	89.44	94.79	99.85	100.00			
แผนการใช้จ่ายเงิน / เดือน (บาท)				2,621,602.03	7,160,631.79	5,249,606.07	6,296,834.40	6,820,059.80	11,887,282.40	15,759,608.83	15,298,096.76	9,569,763.92	4,672,165.55	129,927.50	115,980.60			
แผนการใช้จ่ายเงินสะสม / เดือน (บาท)				2,621,602.03	9,782,233.75	15,028,237.80	21,324,072.20	28,139,170.70	40,026,453.09	55,786,061.92	71,084,158.68	80,653,922.60	85,326,088.15	85,456,015.65	85,572,096.25			

งานระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่ ๒) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

เป็นงานทำรางริน แบ่งเป็นคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวา งานระบบฝั่งซ้ายได้ขุดดิน เทพื้น เทกำแพง ความหนาพื้น ๒๐ ซม. วางท่อลอดถนนให้เชื่อมต่อกับฝั่งขวา ผลงานสะสม ๓๐% ต่ำกว่าแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม




/วันพฤหัสบดี...

วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา(ระยะที่๒) บ้านประตูเมือง ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่2)
ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำเดือน มกราคม 2560

กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งาน ของโครงการเทียบกับ 100%	พ.ศ.2559	พ.ศ.2560						หมายเหตุ
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
1.งานดำเนินการเอง	24,730,000.00	91.59	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
			5.000	15.00	20.00						
2.ค่าอำนวยการและดำเนินงาน	2,270,000.00	8.41	5.000	10.00	15.00	10.00	20.00	15.00	15.00	10.00	
			5.000	10.00	10.00						
รวมราคาค่าก่อสร้าง	27,000,000.00	100.00									
แผนงาน / เดือน (%)			5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
แผนงานสะสม / เดือน (%)			5.00	20.00	40.00	60.00	75.00	85.00	95.00	100.00	
ผลงาน / เดือน (%)			15.00	10.00	5.00						
ผลงานสะสม / เดือน (%)			15.00	25.00	30.00						

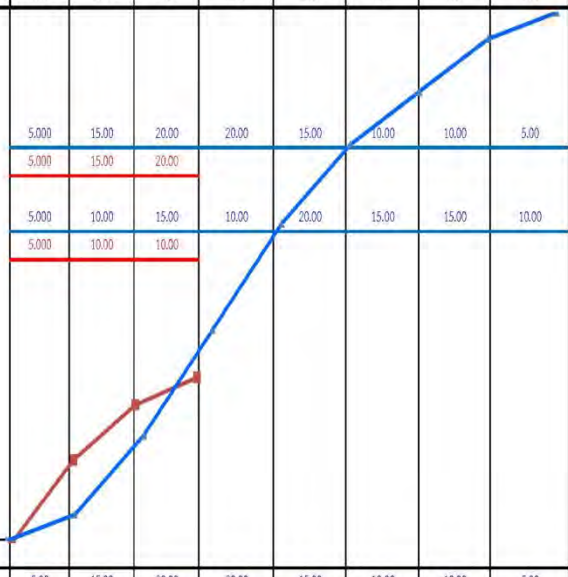

/กส.๑ ชป.๑ รายงาน...

กส.๑ ชป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- ฝายทาชมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผคส.๑ เข้าไปตรวจเยี่ยมดูงาน ซึ่งภาพรวมได้เทคีย์หน้า พื้นหน้า พื้นท้าย กำแพงฝั่งขวา ตอม่อกลาง ๒ ตัว (ความสูงตอม่อ ๘.๗๕ เมตร กว้าง ๖ เมตร หนา ๑ เมตร) กำลังทำกำแพงปีกฝั่งซ้าย และจะเริ่มตัวสันฝาย ซึ่งเป็นกำแพงยาว ๒๐๐ เมตร (กำแพงสูง ๖.๗๕ เมตร ความหนากำแพงฝาย ๕๕ เซนติเมตร สูง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ทั้งหมด ๑๐ ช่อง) ผลงานก่อสร้าง ๕๒ % เร็วกว่าแผน












แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1

โครงการฝายทาขมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซาย

บ.ทาขมพู ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ประจำเดือน พ.ย.59 - มิ.ย.60

กิจกรรม	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % เทียบแต่ละกิจกรรม	น้ำหนัก % งานของโครงการ	พ.ศ.2559 ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	พ.ศ.2560 ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1.งานดำเนินการเอง													
1.1 กิจกรรมเบื้องต้น	69,507.00	100	0.15								50	50	
1.2 กิจกรรมตัวฝายและส่วนประกอบ	32,620,866.00	100	72.49			10	15	20	20	20	10	5	
1.3 ค่าอำนวยการและค่าควบคุมงาน	2,452,627.00	100	5.45		5	10	20	20	15	15	10	5	
2.งานจ้างเหมา													
2.1 จ้างเหมางานดิน	2,960,000.00	100	6.58			10	20	20	20	15	10	5	
2.2 งานจ้างตอกเข็มพืดเหล็กพร้อมจัดหา	3,135,000.00	100	6.96			50	50						
2.3 งานจ้างทำบานระบายพร้อมเครื่องยกและติดตั้ง	1,298,000.00	100	2.88								50	50	
2.4 งานจ้างทำสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้ง	2,464,000.00	100	5.47							50	50		
รวมราคาค่าก่อสร้าง	45,000,000.00	100	100										
ผลงาน / เดือน (%)					0.27	11.93	16.75	16.89	16.62	19.03	12.70	5.74	
แผนงานสะสม / เดือน (%)					0.27	12.2	28.95	45.84	62.64	81.49	94.19	100	
ผลงาน / เดือน (%)					2	13	20	17	-	-	-	-	
แผนงานสะสม / เดือน (%)					2	15	35	52	-	-	-	-	

วันที่เริ่มปฏิบัติงาน 1 พ.ย.59

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ทราบ

(นายชัยวัฒน์ จันทะมงคล)
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

เรียน วศ.คส.1
เพื่อโปรดทราบ

(นายจุลทศักดิ์ จิตเจริญ)
กส.1 ชป.1

ทราบ

(นายพิทยา อิ่มเอม)
วศ.คส.1

แผนงาน
ผลงาน

รถปัญหาอุปสรรค.....

กส.๒ ชป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

➢ งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ผลงานตามแผน ๕๐% ผลงานสะสมปัจจุบัน ๔๐% ช้ากว่าแผน เนื่องจากปัญหาเรื่องรถบดอัด เพราะรถบดอัดน้ำหนักน้อย ตามแผนที่ตั้งจะต้องบดอัดดินได้วันละ ๑,๐๐๐ ลบ.ม./วัน แต่สามารถบดอัดได้จริงเพียงวันละ ๒๗๐ ลบ.ม./วัน

เจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนา ได้เข้ามาตรวจสอบงานในพื้นที่ และเก็บตัวอย่างไปทดสอบ ซึ่งผลทดสอบก็ผ่านแล้ว




วันอังคารที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๐ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจโครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน โดยมีนายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่๒ เป็นผู้ควบคุมงาน



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเขียนตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดลำพูน

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งานของโครงการ	พ.ศ.2559 พ.ย.	พ.ศ.2559 ธ.ค.	พ.ศ. 2560 ม.ค.	พ.ศ. 2560 ก.พ.	พ.ศ. 2560 มี.ค.	พ.ศ. 2560 เม.ย.	พ.ศ. 2560 พ.ค.	พ.ศ. 2560 มิ.ย.	พ.ศ. 2560 ก.ค.
1.งานดำเนินการเอง													
1.1 กิจกรรมเบื้องต้นและส่วนประกอบทั่วไป	1.00	งาน	18,273,771.71	37.01	10.00 5.00	15.00 10.00	15.00 10.00	15.00 15.00	15.00	15.00	10.00	5.00	
1.2 กิจกรรมดินขุดด้วยเครื่องจักร	58,000.00	ลบ.ม.	1,517,280.00	3.07		20.00 20.00	20.00 20.00	20.00 2.00	20.00	20.00			
1.3 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% SPCT	75,310.00	ลบ.ม.	3,901,058.00	7.90			5.00	20.00 1.00	20.00	20.00	20.00	15.00	
1.4 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% SPCT	5,040.00	ลบ.ม.	250,236.00	0.51				20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
1.5 กิจกรรมปูนขาว Cao65% บรรจุถุงละ 25 กก. (3% Hydrate Lime)	63,924.00	ถุง	16,620,240.00	33.66			30.00 30.00	40.00 40.00	30.00				
1.6 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98% SPCT (Stabilizing zone)	3,050.00	ลบ.ม.	174,460.00	0.35				20.00	30.00	30.00	20.00		
1.7 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นดิน Lime Treament ด้วยเครื่องจักร 95%SPCT	35,000.00	ลบ.ม.	1,813,000.00	3.67			10.00	30.00 2.00	30.00	30.00			
1.8 กิจกรรมงานหินทิ้ง RockFillToe	1,240.00	ลบ.ม.	691,920.00	1.40								50.00	50.00
1.9 กิจกรรมงานคอนกรีตตาด GUTTER DRAIN	237.00	ลบ.ม.	934,017.00	1.89								50.00	50.00
1.10 กิจกรรมป้องกันการกัดเซาะ	1.00	งาน	2,054,281.00	4.16				10.00				50.00	50.00
1.11 ค่าอำนวยการ	1.00	งาน	3,149,736.29	6.38	15.00 15.00	20.00 20.00	15.00 15.00	10.00 10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00
รวมราคาค่าก่อสร้าง			49,380,000.00	100.00									
แผนงาน / เดือน (%)					4.66	7.44	17.98	23.12	19.79	9.69	6.09	7.18	4.05
แผนงานสะสม / เดือน (%)					4.66	12.10	30.08	53.20	72.99	82.68	88.77	95.95	100.00
ผลงาน / เดือน (%)					2.81	5.59	15.37	20.28					
ผลงานสะสม / เดือน (%)					2.81	8.40	23.77	44.05					



/ฝ่ายห้วยไคร้...

➢ ฝายห้วยไคร้ (ลูกที่ ๒) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เทกำแพงฝั่งซ้ายแล้ว ปัจจุบันกำลังทำฝั่งขวา ได้กำแพงตัวฝาย พื้นหน้าฝาย เทคีย์เสร็จแล้ว ๔ ตัว งานระบบส่งน้ำดำเนินงานเสร็จแล้วประมาณ ๖๐๐ เมตร ผลงานก่อสร้าง ๓๖ % สูงกว่าแผน ๒%



/วันพฤหัสบดี...


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง ได้ติดตามตรวจสอบพื้นที่งานก่อสร้างโครงการฝายห้วยไคร้ (ลูกที่ ๒)พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๒ เป็นผู้ควบคุมงาน





แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการฝายห้วยไคร้(ลูกที่2) พร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งานของโครงการ		พ.ศ.2559	พ.ศ. 2560							
						ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1.งานดำเนินการเอง														
1.1 กิจกรรมเบื้องต้นและส่วนประกอบทั่วไป	1.00	งาน	1,408,912.27	3.81		5.00 3.00	10.00 10.00	20.00 25.00	20.00	15.00	15.00	10.00	5.00	
1.2 กิจกรรมฝายคอนกรีต	1.00	แห่ง	12,049,941.46	32.57		5.00 5.00	10.00 10.00	25.00 30.00	25.00	20.00	15.00			
1.3 กิจกรรม พรบ.ปากคลอง	1.00	แห่ง	313,967.55	0.85					100.00					
1.4 กิจกรรมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ	2,131.00	เมตร	20,459,480.75	55.30		5.00 5.00	10.00 10.00	15.00 15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	10.00	5.00
1.5 ค่าอำนวยการ	1.00	งาน	2,768,898.61	7.48		15.00 15.00	20.00 20.00	15.00 15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	5.00
รวมราคาค่าก่อสร้าง			37,000,000.00	100.00										
แผนงาน / เดือน (%)						5.71	10.66	18.32	18.79	16.13	14.50	6.66	6.09	3.14
แผนงานสะสม / เดือน (%)						5.71	16.37	34.69	53.48	69.61	84.11	90.77	96.86	100.00
ผลงาน / เดือน (%)						5.63	10.66	20.14						
ผลงานสะสม / เดือน (%)						5.63	16.29	36.43						

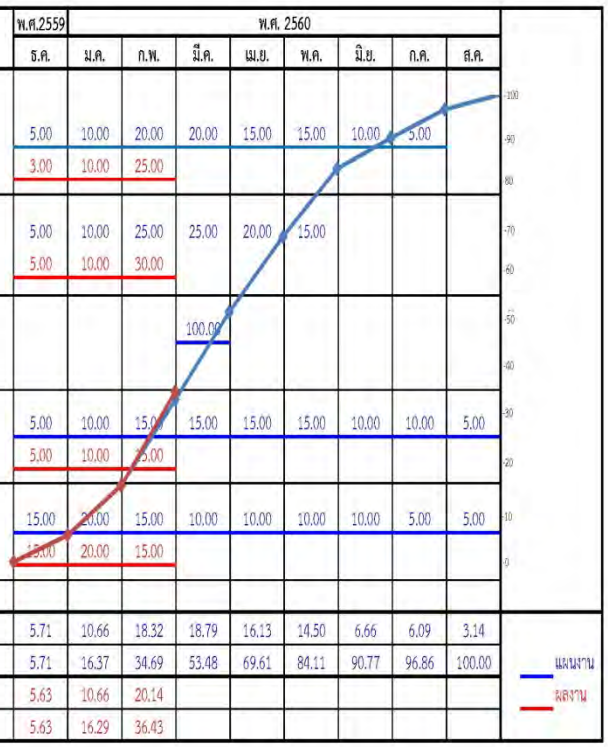

/โครงการพัฒนา...

➢ โครงการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อใช้แก้ปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่า ทำหนังสือแจ้งเข้าพื้นที่แล้ว และได้ร่วมประชุมโครงการผันน้ำจากลำน้ำแม่สาผ่านลำเหมืองสาเข้าสู่คลองแม่ข่าเพื่อเป็นน้ำต้นทุนแก้ไขปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่า โดยมีนายก อบต.ดอนแก้ว หัวหน้าช่าง และอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมประชุมด้วย ซึ่งในพื้นที่ได้มีการทำประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการนี้แล้ว





กส.๓ ชป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

➢ ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ งานสะพานข้ามลำน้ำแม่แตงแล้วเสร็จ ระบบรางคอนกรีต ๘๐๐ เมตร สะพานน้ำ ๑๕๐ เมตร เริ่มดาดคลอง งานดาดคลองเหลืออีกประมาณ ๑ กม. ผลงานสะสม ๔๕% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผคส.๑ ลงพื้นที่ดูงานระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายจะเด็ด สุวรรณธรรมมา กส.๓ ชป.๑ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายดินธาตุ

ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งาน ของโครงการเทียบกับ 100%	พ.ศ.2559	พ.ศ.2560						
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1.งานอำนวยการ	4,504,200.00	15.01	15.000	20.00			40.00	25.00		
			10.000	15.00						
2.งานดำเนินการเอง	25,360,792.00	84.54	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
			5.000	15.00	20.00					
3.ค่าอำนวยการและดำเนินงาน	135,100.00	0.45	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
			5.000	15.00	20.00					
รวมราคาก่อสร้าง	30,000,000.00	100.00								
แผนงาน / เดือน (%)			6.00	16.00	17.00	17.00	18.00	12.00	9.00	4.00
แผนงานสะสม / เดือน (%)			6.00	22.00	39.00	56.00	74.00	86.00	95.00	99.00
ผลงาน / เดือน (%)			10.00	10.00	25.00					
ผลงานสะสม / เดือน (%)			10.00	20.00	45.00					

กส.๔ ชป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่รับมอบหมาย ดังนี้

➢ ฝายนาหมากปินพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะแบ่งทำทีละครึ่ง ตอนนี้เริ่มงานฝั่งซ้ายก่อน สันฝายยาว ๔๐ เมตร ช่วงแรกทำ ๒๕ เมตร ทำกำแพงฝั่งซ้าย สันฝายเทได้ ๒๕ เมตร ช่องระบายทราย ๓ ช่อง กำลังเทคีย์ท้าย ระบบส่งน้ำกำลังทำงานอยู่ที่ กม.๘๐๐ ผลงานก่อสร้าง ๓๘% ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย ๒%











วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
นายสุดชาย พรหมมลมาศ
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง
ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจงาน
โครงการฝายนาหมากปิน
พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ปางหมู อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน
โดยมีนายปารเมศ การุณนราพร
นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๔
เป็นผู้ควบคุมงาน

แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
งานก่อสร้างฝายนาหมากปินพร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งาน ของโครงการเทียบกับ 100%	พ.ศ.2559	พ.ศ.2560						
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1.งานจ้างเหมา	2,030,000.00	4.72	15.000	20.00			40.00	25.00		
			5.000	15.00						
2.งานดำเนินการเอง	778,146.40	1.81								
2.1 กิจกรรมฝายคอนกรีต	12,442,208.05	28.94	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
			5.000	10.00	20.00					
2.2 กิจกรรมระบบส่งน้ำสาย RMC	10,450,537.17	24.30	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
			5.000	10.00	30.00					
2.3 กิจกรรมระบบส่งน้ำสาย 1R-RMC	14,747,108.38	34.30	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
			5.000	10.00	15.00					
3.ค่าอำนวยการและดำเนินงาน	2,552,000.00	5.93	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
			5.000	10.00	15.00					
รวมราคาก่อสร้าง	43,000,000.00	100.00								
แผนงาน / เดือน (%)			5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00
แผนงานสะสม / เดือน (%)			5.00	20.00	40.00	60.00	75.00	85.00	95.00	100.00
ผลงาน / เดือน (%)			3.00	10.00	22.00					
ผลงานสะสม / เดือน (%)			3.00	13.00	38.00					

➢ รายงานความก้าวหน้างานที่เตรียมความพร้อม ดังนี้

- ฝายหาดห้วยตะลาน พร้อมระบบส่งน้ำ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ได้เข้าไปสำรวจใหม่แล้ว และ นายก อบต. ได้ทำหนังสือแจ้งว่าอยากจะให้สร้างตรงจุดที่ใกล้เคียงฝายเดิมมากที่สุด ซึ่งทางออกแบบให้ขยับจากแนวฝายเดิมได้ประมาณ ๘๐ เมตร และสามารถก่อสร้างเชื่อมกับระบบส่งน้ำเดิมได้เลย ตอนนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ



รูปแสดง การพิจารณากำหนดลักษณะโครงการจาก Agri-Map


/ฝายต้นนุ่น...

- ฝายต้นนุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้ว อยู่ระหว่างการเขียนเล่มรายงาน

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝายต้นนุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม (ปชด.)



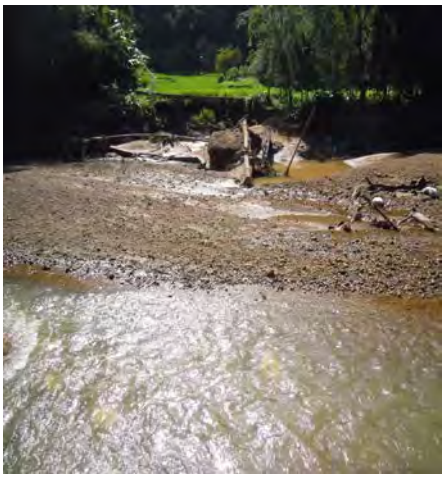

- ฝายสอตือพร้อมระบบส่งน้ำ อยู่ในแผนงานปี ๒๕๖๒

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฝายสอตือพร้อมระบบส่งน้ำ ม.1 บ้านหลวง ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม





- ฝายแม่หารพร้อมระบบส่งน้ำ เข้าไปพิจารณาโครงการแล้ว

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์


ฝายแม่หารพร้อมระบบส่งน้ำ ม.1 บ้านหลวง ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม






- ฝายนาตกปาย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับหนังสือขอก่อสร้างฝาย ฝายนี้มีเป็นลำน้ำเดียวกับฝายนาหมากปิน มีพื้นที่แปลงใหญ่ด้านท้าย ซึ่งได้ประสานกับ วศ.โครงการแม่ฮ่องสอน จะนำเรื่องนี้หารือกับ SC และขอให้โครงการเตรียมความพร้อมด้านสำรวจออกแบบต่อไป

ฝายนาตกปาย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

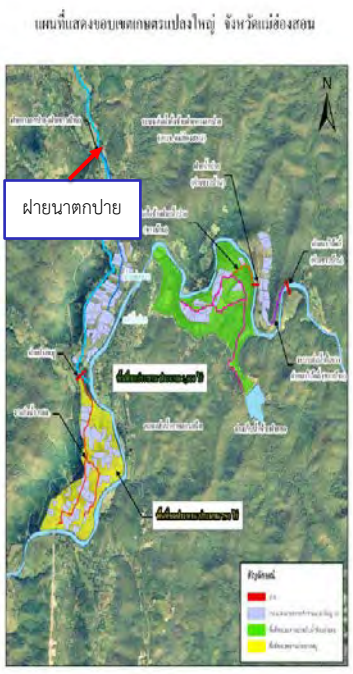



พด.คส.๑ รายงานความก้าวหน้างานพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้

- งานคอนกรีตผสมเสร็จฝายนาหมากปินและฝายตีนธาตุ ได้ทำเรื่องขออนุมัติงดลดค่าปรับไปที่สำนักงานชลประทานที่ ๑ แล้ว

- รอผลทดสอบปูนขาว ของอ่างห้วยเขียว

- เหล็กข้ออ้อย ผลทดสอบมาแล้ว จะโหลด PO วันนี้

- จ้างงานดิน รายละเอียดเป็นไปตามสัญญา

- จ้างตอกเข็มพืด รอผลทดสอบ

- งานประกวดราคาแม่นาป๊ากและแม่ปอน ตามแผนถ้าอาทิตย์หน้าได้ราคากลาง จะประกาศชุดแรก วันที่ ๑๐ มีนาคม และจะเสร็จสิ้นประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน สอบราคาทั้ง ๓ ชุด ก็เช่นเดียวกัน

	รายการ		ร้านที่ได้	วงเงิน	รับราคา	จำนวน	เบิกจ่าย	ใบสั่ง/สัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา	
6	คอนกรีตผสมเสร็จ ฝมป	ส.16	cps	1,633,400.00	933,530.00	559 ลบม		14 ธค.59	19 ธค.59	20 ธค.59	20 ธค.59	20 วัน 2	จ.1 24 ธค.59	ทำเรื่องขออนุมัติ งดลดค่าปรับ วันที่ 17 กพ 60 ส่ง สชป.1
													จ.2 3 มค 60	21 กพ.60
7	คอนกรีตผสมเสร็จ ฝตธ	ส.20	ชโนทัย	1,612,000.00	1,484,900.00	620.00		14 ธค.59	19 ธค.59	20 ธค.59	20 ธค.59	30วัน	จ.1 29 ธค.59	ทำเรื่องขออนุมัติ งดลดค่าปรับ วันที่ 17 กพ 60 ส่ง สชป.1
													จ.2 13 มค 60	21 กพ.60
9	ปูนขาว Cao อหข		ชโนทัย	16,620,300.00	8,289,664.32							90 วัน	จ 2 28 มค 60	รอผลเทส
													จ 3 27 กพ 60	
10	เหล็กข้ออ้อย ฝหค	eb13	อนุพงษ์	428,400.00	338,891.28			7 กพ.60			3 มีค 60	5 วันทำการ		
									เริ่มสัญญา	ครบสัญญา				
10	จ้างงานดิน ฝมป	สจ.01	sps	1,985,600.00	1,471,500.00			12 มค 60	17 มค 60	16 พค 60		120 วัน		
11	จ้างงานดิน ฝทช	จ.01	ศรีชาติ	2,960,000.00	1,459,797.36			12 มค 60	17 มค 60	15 กค 60		180 วัน		
12	จ้างงานดิน ฝตธ	จ.02	ชโนทัย	4,504,200.00	2,394,558.60			12 มค 60	17 มค 60	15 กค 60		180 วัน		
13	จ้างตอกเข็มพืด ฝทช	จ.03	ธนา	3,135,000.00	1,897,610.00			25 มค 60	27 มค 60	27 มีค 60		60 วัน		
14	จ้างทำสะพาน ฝทช	จ.04	วรรณภูมิ	2,464,000.00	2,448,000.00			20 กพ 60	22 กพ 60	21 กค 60		150 วัน		
15	จ้างทำบาน ฝทช							มีค						

	รายการ	วงเงิน	รับราคา	อนุมัติแผน	อนุมัติราคากลาง	ร่างเอกสาร	ประกาศ-ยื่น	คำนวณ	เสนอ/เปิดซอง	อนุมัติรับราคา ประกาศผู้ชนะ	ใบสั่ง/สัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา
	EB ชุด 1															
	หินย่อย อมป	3,379,200.00		21 กพ.60	8 มีค 60		10-17 มีค.60	20-22 มีค.60	23 มีค.60	28 มีค.60					30 วัน	ง.1
																ง.2
	เหล็ก อนป	4,577,900.00					"	"	"	"						
	EB ชุด 2															
	ทราย อมป	2,425,900.00					14-21 มีค.60	22-27 มีค.60	28 มีค.60	31 มีค.60					30 วัน 3 ง.	ง.1
																ง.2
	เหล็ก อมป	5,575,200.00				14-17 มีค.60	20-27 มีค.60	28-31 มีค.60	3 เมย.60	3 เมย.60					30 วัน 3 ง.	ง.1
																ง.2
	EB ชุด 3															
	ปูน อมป	2,188,000.00					16-23 มีค.60	24-29 มีค.60	30 มีค.60	3 เมย.60					30 วัน	ง.1
																ง.2
	สารประกอบโซเดียม	2,610,600.00					"	"	"	"					30 วัน	ง.1
	ซิลิเกต อมป															ง.2

	รายการ	วงเงิน	จำนวน	เบิกจ่าย	ประกาศ-ยื่น	เสนอ/เปิดซอง	อนุมัติรับราคา /ประกาศผู้ชนะ	ใบสั่ง/สัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา
	สอบชุด 1												
1	หินใหญ่ อนป.	550,800.00			13-24 มี.ค 60	28 มี.ค 60							
2	ปูน อนป.	992,400.00			"	"							
3	แผ่นไม้อัด อมป.	922,700.00			"	"							
4	ดินลูกรัง อมป.	1,742,600.00			"	"							
5	แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ อนป.	1,278,800.00			"	"							
	สอบชุด 2												
1	แผ่นใยสังเคราะห์ อมป.	640,700.00			15-27 มี.ค 60	29 มี.ค 60							
2	ดินลูกรัง อนป.	863,800.00			"	"							
3	หินย่อย อนป.	837,300.00			"	"							
4	แผ่นไม้อัด อนป.	1,229,700.00			"	"							
	สอบชุด 3												
1	ทรายหยาบ อนป.	837,300.00			17-28 มี.ค 60	30 มี.ค 60							
2	แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ อมป.	1,641,300.00			"	"							
3	คอนกรีตผสมเสร็จ อนป.	1,434,400.00			"	"							
4	หินใหญ่ อมป.	1,811,200.00			"	"							
	ตกลง/กรณีพิเศษ												
1	ไม้แปรรูป อมป.	1,824,400.00			13 มี.ค 60								
2	ไม้แปรรูป อนป.	2,451,000.00			15 มี.ค 60								
3	เสาไม้ยูคา อนป.	199,300.00			10 มี.ค 60								
4	Rubber อมป.				13 มี.ค 60								
5	เสาไม้ยูคา อมป.												

งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

- ฝายห้วยไคร้(ลูกที่ ๒) พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๗๐.๔๐%
- ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ เบิกจ่ายได้ ๗๕.๖๘%
- ฝายนาหมากปิน พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๕๘.๗๖%
- ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา เบิกจ่ายได้ ๘๐.๙๙%
- ฝายทาชมพู พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๗๓.๔๔%
- อ่างเก็บน้ำห้วยเขียว เบิกจ่ายได้ ๔๔.๗๐%

<u>เงินกันเหลื่อมปี ๒๕๕๘</u>

- อ่างเก็บน้ำห้วยโทก เบิกจ่ายได้ ๙๕.๘๒%

เหลือเบิกเดือนมีนาคมเดือนสุดท้าย อีกประมาณ ๗๘,๐๐๐.- บาท

ธก.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหาร ดังนี้

ดำเนินการทำเรื่องแต่งตั้ง กส.๒ ชป.๑ เป็นผู้ควบคุมงานปรับปรุงส่งน้ำฝายรูบ้วน ส่งให้สำนักงานชลประทานที่ ๑ แล้ว และจะติดตามคำสั่งให้ต่อไป

งานเสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่นาป๊าก และ อ่างเก็บน้ำแม่ปอน ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งเตรียมเสนอ ผคส.ลงนาม

ชก.คส.๑ รายงานตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ดังนี้

- รายงานการใช้น้ำมันเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๘๗๓ ลิตร ลดลงจากเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๐ ๗ %
- รายงานการใช้ไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔,๗๒๑ หน่วย ลดลงจากเดือนมกราคม ปี ๒๕๖๐ ๔%

ตารางเปรียบเทียบ น้ำมันและไฟฟ้า ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560

การใช้น้ำมัน

เดือน	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	1,571	2013	28%	-	-
กุมภาพันธ์	1,907	1873	-	2%	ลดลงจากเดือน ม.ค. 60 ประมาณ 7%
มีนาคม	2,060	-	-	-	-
เมษายน	1,404	-	-	-	-
พฤษภาคม	1,918	-	-	-	-
มิถุนายน	1,546	-	-	-	-
กรกฎาคม	1,561	-	-	-	-
สิงหาคม	1,349	-	-	-	-
กันยายน	1,107	-	-	-	-
ตุลาคม	868	-	-	-	-
พฤศจิกายน	3,412	-	-	-	-
ธันวาคม	1,618	-	-	-	-

การใช้ไฟฟ้า

เดือน	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	5759	4899	-	15%	-
กุมภาพันธ์	4255	4721	11%	-	ลดลงจากเดือน ม.ค. 60 ประมาณ 4%
มีนาคม	7358	-	-	-	-
เมษายน	8414	-	-	-	-
พฤษภาคม	9878	-	-	-	-
มิถุนายน	9201	-	-	-	-
กรกฎาคม	7883	-	-	-	-
สิงหาคม	8210	-	-	-	-
กันยายน	8580	-	-	-	-
ตุลาคม	7443	-	-	-	-
พฤศจิกายน	7874	-	-	-	-
ธันวาคม	6588	-	-	-	-

/ระเบียบวาระที่ ๔...

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

- ไม่มีเรื่องเพื่อพิจรณา

<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u> **เรื่องอื่น ๆ**

- ขอให้ลูกจ้างชั่วคราวที่นั่งทำงานอยู่ในสำนักงานโครงการก่อสร้าง เขียนหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติ รวบรวมส่งให้ ผคส.๑ ต้นเดือนพฤษภาคม
- กำหนดวันไปตรวจงานของ ผคส.๑
  - วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ฝายตีนธาตุ ฝายห้วยไคร้
  - วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ อ่างฯ ห้วยเขียว อ่างฯ ห้วยโทก ฝายทาชมพู
- กำหนดวันประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

<u>เลิกประชุมเวลา</u> ๑๕.๐๐ น.

(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายชื่อผู้มาประชุมประจำเดือนโครงการ

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นายสุดชาย พรหมมสมาศ	ผคส.๑		ประธาน
๒	นายพิทยา อิ่มเอม	วศ.คส.๑		
๓	นายจุลทศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ชป.๑		
๔	นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๒ชป.๑		
๕	นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ชป.๑		
๖	นายปารเมศ การุณราพร	กส.๔ชป.๑		
๗	นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ		ไปดูงานต่างจังหวัด
๘	นายสามารถ อาษากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน		
๙	นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑		
๑๐	นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑		เลขานุการ
๑๑	นางปราณี กองงาม	งบ.คส.๑		
๑๒	นางสาวกัณฑารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑		
๑๓	นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ธก.คส.๑		ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔	นางสาวชลมาศ ทองคำ	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน		
๑๕	นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	โยธิน สุธรรม	
๑๖	นายเฉลา ศรีรัยพัฒน์	นายช่างชลประทาน		
๑๗	นาย ณัฐศักดิ์ เยสุวะรัตน์	นายช่างชลประทาน		
