รายงานการประชุมประจำเดือน
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นายพิทยา อิ่มเอม	วศ.คส.๑	ประธาน	
๒. นายจุลทศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ ชป.๑		
๓. นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ ชป.๑		
๔. นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๔ ชป.๑		
๕. นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑		
๖. นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑		
๗. นางปราณี กองงาม	งบ.คส.๑		
๘. นางสาวกัณฑารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑		
๙. นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ธก.คส.๑	ผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๐.นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ		
๑๑.นายสามารถ อาษากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน		

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจินตนา ชูดวง	พนักงานพิมพ์ ส ๒
๒. นายเดชา จรรยพัฒน์	นายช่างชลประทาน
๓. นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
๔. นายอานันท์ นิลสนธิ	พนักงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสุดชาย พรหมมลมาศ	ผคส.๑	อบรมนักปกครองระดับสูง
๒. นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๒ ชป.๑	อบรมนักบริหารระดับกลาง
๓. นางสาวชลมาศ ทองคำ	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	ดูงานแม่ปอน


เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายพิทยา อิ่มเอม วศ.คส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน ผคส.๑ และเลขานุการรายงานหัวข้อการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

/ระเบียบวาระที่ ๑...

<u>ระเบียบวาระที่ ๑</u> **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

วศ.คส.๑ แจ้งที่ประชุมว่า ผคส.๑ เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานก่อสร้าง ต้องเป็นไปตามมาตรการควบคุมภายใน ตามคำสั่งโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทาน ที่ ๑๕/๒๕๕๘ และ วศ.คส.๑ ได้กำชับในเรื่องของคุณภาพงานก่อสร้าง ขอให้ผู้ที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานต้องเข้าไปตรวจสอบคุณภาพงานด้วย

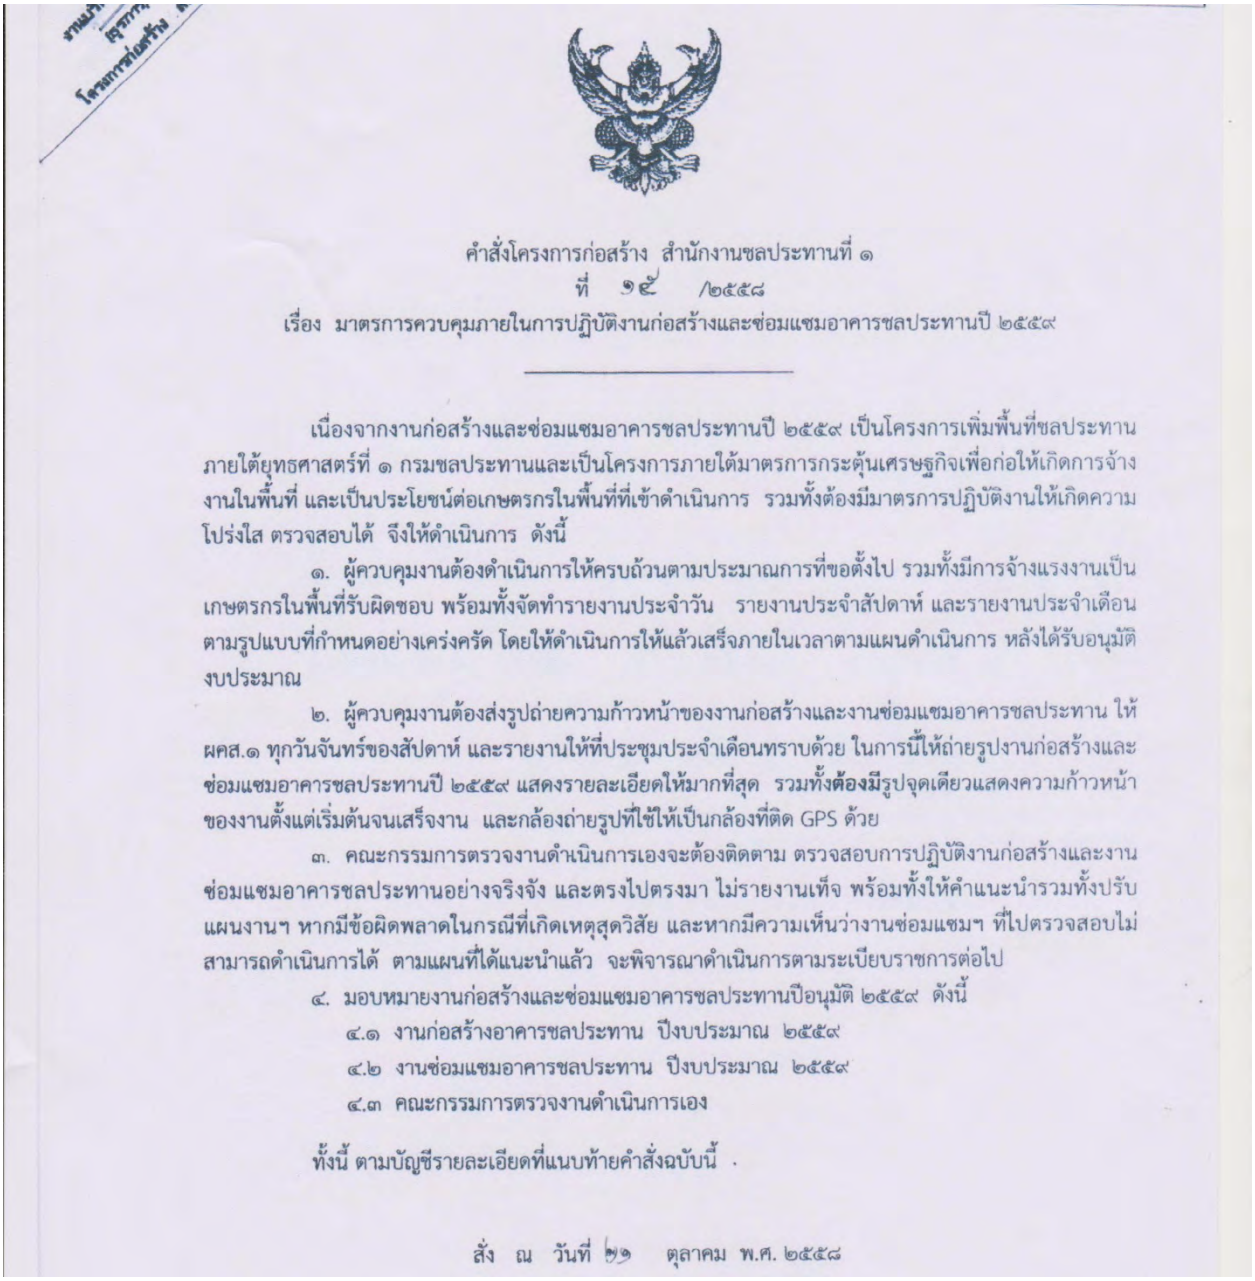

คำสั่งโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
ที่ ๑๕ /๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการควบคุมภายในการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารชลประทานปี ๒๕๕๙

เนื่องจากงานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารชลประทานปี ๒๕๕๙ เป็นโครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กรมชลประทานและเป็นโครงการภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าดำเนินการ รวมทั้งต้องมีมาตรการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ผู้ควบคุมงานต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามประมาณการที่ขอตั้งไป รวมทั้งมีการจ้างแรงงานเป็นเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ และรายงานประจำเดือนตามรูปแบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาตามแผนดำเนินการ หลังได้รับอนุมัติงบประมาณ

๒. ผู้ควบคุมงานต้องส่งรูปถ่ายความก้าวหน้าของงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมอาคารชลประทาน ให้ ผคส.๑ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ และรายงานให้ที่ประชุมประจำเดือนทราบด้วย ในการนี้ให้ถ่ายรูปงานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารชลประทานปี ๒๕๕๙ แสดงรายละเอียดให้มากที่สุด รวมทั้ง**ต้องมี**รูปจุดเดียวแสดงความก้าวหน้าของงานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จงาน และกล้องถ่ายรูปที่ใช้ให้เป็นกล้องที่ติด GPS ด้วย

๓. คณะกรรมการตรวจงานดำเนินการเองจะต้องติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานก่อสร้างและงานซ่อมแซมอาคารชลประทานอย่างจริงจัง และตรงไปตรงมา ไม่รายงานเท็จ พร้อมทั้งให้คำแนะนำรวมทั้งปรับแผนงานฯ หากมีข้อผิดพลาดในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย และหากมีความเห็นว่างานซ่อมแซมฯ ที่ไปตรวจสอบไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่ได้แนะนำแล้ว จะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบราชการต่อไป

๔. มอบหมายงานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารชลประทานปีอนุมัติ ๒๕๕๙ ดังนี้

๔.๑ งานก่อสร้างอาคารชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๔.๒ งานซ่อมแซมอาคารชลประทาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๔.๓ คณะกรรมการตรวจงานดำเนินการเอง

ทั้งนี้ ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้ายคำสั่งฉบับนี้ .

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> **รับรองรายงานการประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

<u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

คุณสิทธิโชค พิรุณรัตน์ รายงานการติดตามหนังสือร้องเรียน และการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ได้ตอบเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ไปทั้งหมดแล้ว และในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ไม่มีเรื่องร้องเรียน

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโทก ดังนี้

ปัญหาของงานห้วยโทก ก็ยังเป็นเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือ ทำให้งานดินยังคงล่าช้า ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ยังมียอดดินถมค้างอยู่ประมาณ ๑๙,๖๑๓.๒ ลบ.ม. ด้านท้าย ดินถมเหลืออีก ๑.๕๐ เมตร จะถึงระดับเก็บกัก



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโทกพร้อมระบบส่งน้ำ

บ้านห้วยโทก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพลู อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดลำพูน

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

กิจกรรม	จำนวนเงิน	น้ำหนัก ณ งาน ของโครงการเทียบกับ 100%	พ.ศ.2559												พ.ศ.2560					หมายเหตุ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	
1.งานดำเนินการแล้ว																				
1.1 กิจกรรมเบื้องต้น	4,812,021.00	5.62		5.00	15.00			35.00	25.00	10.00	10.00									
				5.00	15.00			10.00	30.00	20.00	10.00	10.00								
					60.00			10.00	5.00	5.00	5.00	5.000								
1.2 กิจกรรมหัวงานดิน	23,214,391.00	27.09		10.00	15.00	10.00	20.00	25.00	10.00	5.00	5.00									
				10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00							
				10.00	25.00	15.00	5.00	15.00	2.00	5.00	10.00	10.000								
1.3 กิจกรรมอาคารท่อส่งน้ำ	3,432,300.00	4.01			5.00	5.00	20.00	25.00	25.00	15.00	5.00									
					5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	10.00	5.00	5.00					
					5.00	5.00	5.00	10.00	5.00	5.00	10.00	15.000								
1.4 กิจกรรมอาคารระบายน้ำล้น	8,556,129.00	9.99			6.00	5.00	20.00	25.00	25.00	10.00	5.00									
					6.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	10.00	10.00	9.00	5.00					
1.5 กิจกรรมอาคารประกอบ	3,103,090.00	3.62			5.00	5.00	20.00	30.00	25.00	10.00	5.00									
					5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	15.00	15.00							
									5.00	5.00	10.00	10.000								
1.6 กิจกรรมปรับปรุงฐานรากเขื่อน	18,941,234.00	22.11			10.00	10.00	15.00	25.00	25.00	10.00	5.00									
					10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	15.00								
					12.00	8.00	3.00	5.00	5.00	5.00	20.00	10.000								
1.7 กิจกรรมอาคารส่งน้ำ	16,998,200.00	19.84						40.00	30.00	15.00	10.00									
									10.00	15.00	25.00	25.00	10.00	10.00	5.00					
									5.00	3.00	20.00	10.000								
1.8 ทำงานอุทกรและค่าควบคุมงาน	2,830,600.00	3.30		5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	10.00	5.00									
				5.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00								
				8.00	15.00	10.00	8.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.000								
2.งานจัดหาเครื่องจักรกลหลักครั้งที่1																				
2.1 จัดหาแผ่น GCL พร้อมติดตั้ง	3,178,840.00	3.71					40.00	30.00	15.00	10.00	5.00									
								5.00	35.00	30.00	25.00	5.00								
									5.00	3.00	30.00	30.000								
2.2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบท่อส่งน้ำ	613,000.00	0.72					40.00	30.00	15.00	10.00	5.00									
								5.00	30.00	25.00	20.00	10.00	10.00							
									3.00	3.00	10.00	10.000								
รวมราคาก่อสร้าง	85,679,805.00	100.00																		
แผนงาน / เดือน (%)				3.06	8.43	6.20	15.08	28.72	20.99	10.89	6.62									
แผนงานสะสม / เดือน (%)				3.06	11.49	17.69	32.77	61.50	82.49	93.38	100.00									
ผลงาน / เดือน (%)				2.89	13.19	7.38	2.48	6.02	3.20	4.02	11.51	8.14	5.16	5.84	4.11	2.20	1.75	1.8	1	
ผลงานสะสม / เดือน (%)				2.89	16.08	23.46	25.94	31.96	35.16	39.18	50.69	72.14	77.30	83.14	87.25	89.45	91.20	93.00	94.00	
ปริมาณงาน / เดือน (%) เบี้ยจากรถการเบิกจ่าย				3.06	8.38	6.12	7.34	7.96	13.87	13.72	17.85	11.15	5.35	3.08	1.69					
แผนงานสะสม / เดือน (%)				3.06	11.41	17.54	24.88	32.84	46.72	60.43	78.29	89.44	94.79	97.87	100.00					
ผลการใช้จ่ายเงิน / เดือน (บาท)				2,621,802.03	7,162,831.70	5,243,604.07	6,290,634.40	6,820,098.50	11,887,282.40	11,753,825.35	15,298,098.78	9,549,763.92	4,472,165.55	129,927.50	115,960.40					
ผลการใช้จ่ายเงินสะสม / เดือน (บาท)				2,621,802.03	9,784,633.73	15,028,237.80	21,319,072.20	28,139,170.70	40,026,453.09	51,780,278.42	67,078,377.20	76,628,141.12	81,100,306.67	81,230,234.17	81,346,214.57					

งานระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่ ๒) ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

งานระบบส่งน้ำยังไม่ได้เทพื้นอีก ๑๐๐ เมตร เทพื้นไปแล้วแต่ขาดกำแพงอีก ๓๖๐ เมตร สะพานน้ำอีก ๑๒๐ เมตร เทตอม่อพร้อมตั้งเสาไปแล้ว ๔ เสา ผลงานสะสม ๗๘% คาดว่าแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม






แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา (ระยะที่2)
ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งาน ของโครงการเทียบกับ 1.00%	พ.ศ.2559	พ.ศ.2560						หมายเหตุ
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
1.งานดำเนินการเอง	24,730,000.00	91.59	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
			5.000	15.00	20.00	17.00					
2.ค่าอำนวยการและดำเนินงาน	2,270,000.00	8.41	5.000	10.00	15.00	10.00	25.00	15.00	15.00	10.00	
			5.000	10.00	10.00	30.00					
รวมราคาค่าก่อสร้าง	27,000,000.00	100.00									
แผนงาน / เดือน (%)			5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
แผนงานสะสม / เดือน (%)			5.00	20.00	40.00	60.00	75.00	85.00	95.00	100.00	
ผลงาน / เดือน (%)			15.00	10.00	5.00	27.00	8.00	3.00			แผนงานสะสม
ผลงานสะสม / เดือน (%)			15.00	25.00	30.00	67.00	75.00	78.00			ผลงานสะสม

➢ งานเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- โครงการเสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขุดเปิดทำนบดินด้านท้าย ขุดเปิดภูเขา ผลงานก้าวหน้า ๑๕%








แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
งานเสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งาน ของโครงการเทียบกับ 100%	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
1.งานอ้างเหมา	1,710,000.00	3.29	15.000	20.00	25.00 5.00	20.00	20.00				*งบประมาณเพิ่งมาเดือน เมษายน
2.งานดำเนินการเอง	47,180,000.00	90.73	5.000	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	
3.ค่าอำนวยการและดำเนินงาน	3,110,000.00	5.98	5.000	10.00	15.00 15.00 15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	
รวมราคาค่าก่อสร้าง	52,000,000.00	100.00									
แผนงาน / เดือน (%)			5.33	10.33	15.33	15.16	15.16	14.50	14.50	9.79	
แผนงานสะสม / เดือน (%)			5.33	15.66	30.99	46.15	61.21	75.71	90.21	100.00	
ผลงาน / เดือน (%)			0.00	0.00	5.00	5.00					แผนงานสะสม
ผลงานสะสม / เดือน (%)			0.00	0.00	5.00	15.00					ผลงานสะสม

- โครงการเสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่นาป๊ากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานทำ Parapet Wall ฐานเทได้ ๒๒๐ เมตร กำแพงเทได้ ๑๒๐ เมตร รายงานผลงานก้าวหน้า ๒๕ %









แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
งานเสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่นาป๊าก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แดง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % ตามของโครงการเทียบกับ 100%	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
1.งานจ้างเหมา	1,580,000.00	6.32	15.000	20.00	25.00	20.00	20.00				*งบประมาณเพิ่มมาเดือน เมษายน
					5.00						
2.งานดำเนินการเอง	21,420,000.00	85.68	15.000	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
					5.00						
3.ค่าอำนวยการและดำเนินงาน	2,000,000.00	8.00	15.000	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
					5.00						
รวมราคาค่าก่อสร้าง	25,000,000.00	100.00									
			15.00	20.00	15.83	10.83	10.83	9.37	9.37	9.37	
แผนงานสะสม / เดือน (%)			15.00	35.00	50.83	61.26	71.89	81.26	90.63	100.00	
ผลงาน / เดือน (%)			0.00	0.00	5.00	20.00					
ผลงานสะสม / เดือน (%)			0.00	0.00	5.00	25.00					

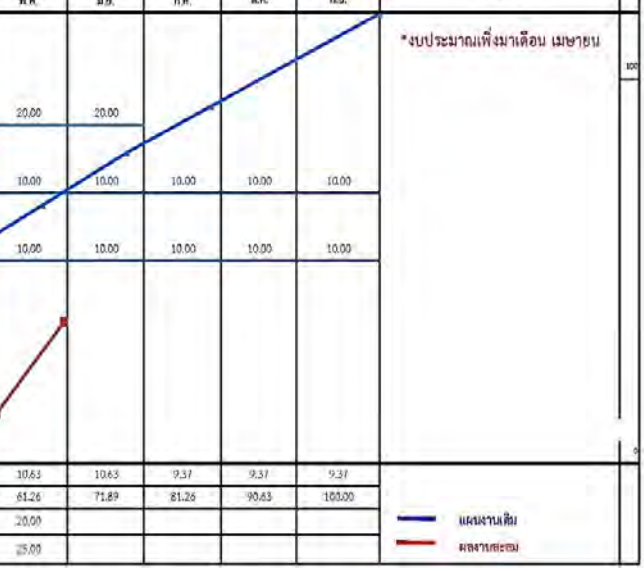

กส.๑ ชป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- ฝายทาชมพูพร้อมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน ตัวฝายแล้วเสร็จ ตอนนี้เริ่มทำราวกันตก และรอคานทยอยมาส่ง เนื่องจากคานยาวมากถึง ๒๓ เมตร ขนย้ายยากลำบาก ทำให้งานล่าช้ากว่าแผน ผลงานสะสม ๘๗ % คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม






กส.๒ ชป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองปลาสวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ปัญหาอุปสรรคช่วงนี้คือฝนตกไม่สามารถทำงานได้ ผลงานสะสม ๖๙.๙๔%








แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยเชียนดอนอ่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลหนองปลาสวาย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดลำพูน

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งานของโครงการ	พ.ศ.2559		พ.ศ. 2560					
					พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
1.งานดำเนินการเอง												
1.1 กิจกรรมเบื้องต้นและส่วนประกอบทั่วไป	1.00	งาน	18,273,771.71	37.01	10.00 5.00	15.00 15.00	15.00 15.00	15.00 15.00	10.00 10.00	10.00 10.00	5.00 5.00	5.00
1.2 กิจกรรมดินขุดด้วยเครื่องจักร	58,000.00	ลบ.ม.	1,517,280.00	3.07		20.00 20.00	20.00 20.00	20.00 10.00	20.00 10.00	20.00 40.00		
1.3 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95% SPCT	75,310.00	ลบ.ม.	3,901,058.00	7.90					10.00 10.00	10.00 10.00	20.00 20.00	20.00
1.4 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% SPCT	5,040.00	ลบ.ม.	250,236.00	0.51								20.00
1.5 กิจกรรมปูนขาว Cao65% บรรจุถุงละ 25 กก. (3% Hydrate Lime)	63,924.00	ถุง	16,620,240.00	33.66			30.00 30.00	40.00 40.00	30.00 10.00			
1.6 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98% SPCT (Stabilizing zone)	3,050.00	ลบ.ม.	174,460.00	0.35							40.00 40.00	30.00
1.7 กิจกรรมดินถมบดอัดแน่นดิน Lime Treament ด้วยเครื่องจักร 95%SPCT	35,000.00	ลบ.ม.	1,813,000.00	3.67				10.00 10.00	10.00 10.00	10.00 10.00	20.00 20.00	15.00
1.8 กิจกรรมงานหินทิ้ง RockFillToe	1,240.00	ลบ.ม.	691,920.00	1.40							20.00 20.00	20.00
1.9 กิจกรรมงานคอนกรีตตาด GUTTER DRAIN	237.00	ลบ.ม.	934,017.00	1.89								25.00
1.10 กิจกรรมป้องกันการกัดเซาะ	1.00	งาน	2,054,281.00	4.16				10.00	10.00		20.00 20.00	20.00
1.11 ค่าอำนวยการ	1.00	งาน	3,149,736.29	6.38	15.00 15.00	20.00 20.00	15.00 15.00	10.00 10.00	10.00 10.00	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00
รวมราคาค่าก่อสร้าง			49,380,000.00	100.00								
แผนงาน / เดือน (%)					4.66	7.44	17.22	20.63	16.21	5.79	5.74	6.09
แผนงานสะสม / เดือน (%)					4.66	12.10	29.32	49.95	66.16	71.95	77.69	83.78
ผลงาน / เดือน (%)					2.81	7.44	17.22	20.74	9.58	6.41	5.74	
ผลงานสะสม / เดือน (%)					2.81	10.25	27.47	48.21	57.80	64.20	69.94	

- ฝายห้วยไคร้ (ลูกที่ ๒) พร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ตัวฝายเสร็จแล้ว เหลืองานท่อส่งน้ำเข้านา งานป้ายเหลือติดตัวหนังสือ ผลงานสะสม ๘๔.๔๒ %



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการฝายหัวยไคร้(ลูกที่2) พร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำหนัก %		พ.ศ.2559	พ.ศ. 2560					
						ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.
1.งานดำเนินการเอง												
1.1 กิจกรรมเบื้องต้นและส่วนประกอบทั่วไป	1.00	งาน	1,408,912.27	3.81		5.00	10.00	20.00	20.00	15.00	15.00	10.
						3.00	10.00	25.00	20.00	20.00	15.00	
1.2 กิจกรรมฝายคอนกรีต	1.00	แห่ง	12,049,941.46	32.57		5.00	10.00	25.00	25.00	20.00	5.00	
						5.00	10.00	30.00	25.00	20.00	10.00	100
1.3 กิจกรรม ทรบ.ปากคลอง	1.00	แห่ง	313,967.55	0.85					100.00			
									70.00	25.00	5.00	
1.4 กิจกรรมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ	2,131.00	เมตร	20,459,480.75	55.30		5.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.
						5.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
1.5 ค่าอำนวยการ	1.00	งาน	2,768,898.61	7.48		15.00	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	10.
						15.00	20.00	15.00	10.00	10.00	10.00	
รวมราคาค่าก่อสร้าง			37,000,000.00	100.00								
แผนงาน / เดือน (%)						5.71	10.66	18.32	18.79	16.13	14.50	6.
แผนงานสะสม / เดือน (%)						5.71	16.37	34.69	53.48	69.61	84.11	90.
ผลงาน / เดือน (%)						5.63	10.66	20.14	18.54	16.53	12.91	
ผลงานสะสม / เดือน (%)						5.63	16.29	36.43	54.97	71.50	84.42	

➢ รายงานความก้าวหน้างานเตรียมความพร้อม งานเพิ่มเติมปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- โครงการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อใช้แก้ปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่า ตอนนี้ขุดเป็นช่วง ๆ ได้ ๔ กม. ผลงานสะสม ๗.๐๑%













แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
โครงการผันน้ำจากลำน้ำแม่สาผ่านลำเหมืองสาเข้าสู่คลองแม่ข่าเพื่อเป็นน้ำต้นทุนแก้ไขปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่า
ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % ของงานโครงการ	พ.ศ.2560					
					เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
1.งานดำเนินการเอง										
1.1 กิจกรรมอาคารประกอบระบบส่งน้ำ	17.00	แห่ง	38,528,428.00	89.50		10.00 5.00	20.00	25.00	25.00	
2.งานจ้างเหมา										
2.1 งานขุดด้วยเครื่องจักร	35,010	ลบ.ม.	1,115,418.60	2.59		15.00 30.00	25.00	25.00	25.00	
2.2 งานขุดถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	4,442	ลบ.ม.	378,147.46	0.88		25.00	30.00	25.00	10.00	
3. ค่าอำนวยการ	1.00	งาน	3,027,598.17	7.03	5.00 5.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
รวมราคาค่าก่อสร้าง			43,049,000.00	100.00						
แผนงาน / เดือน (%)					0.35	10.96	20.22	24.65	24.52	
แผนงานสะสม / เดือน (%)					0.35	11.32	31.53	56.18	80.70	
ผลงาน / เดือน (%)					0.35	6.66				
ผลงานสะสม / เดือน (%)					0.35	7.01				

- โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายรูบ้วน สนับสนุนพื้นที่ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เทคอนกรีตพื้นได้ ๑๖๐ เมตร กำแพงได้ ๑๐๐ เมตร ผลงาน ๑๔.๐๙%






แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายรูบ้วน สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม	จำนวน	หน่วย	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งานของโครงการ	พ.ศ.2560				
					เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1.งานตัวเป็นการเอง									
1.1 งานคอนกรีตคาส	2,174.00	ลบ.ม.	9,811,911.86	49.06	5.00	15.00	20.00	20.00	20.00
					5.00	15.00			
1.2 งานอาคารประกอบระบบส่งน้ำ	6,250.00	แห่ง	6,340,868.10	31.70			20.00	30.00	30.00
2. งานจ้างเหมา									
2.1 งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	12,250.00	ลบ.ม.	1,065,995.00	5.33		20.00	40.00	40.00	
2.2 งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	17,220.00	ลบ.ม.	406,906.70	2.03	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00
					5.00	30.00			
3. ค่าอำนวยการ	1.00	งาน	2,375,070.62	11.88	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00
					3.84	20.00			
รวมราคาค่าก่อสร้าง			20,000,000.00	100.00					
แผนงาน / เดือน (%)					3.84	11.21	21.07	24.24	22.11
แผนงานสะสม / เดือน (%)					3.84	15.05	36.12	60.35	82.46
ผลงาน / เดือน (%)					3.74	10.34			
ผลงานสะสม / เดือน (%)					3.74	14.09			

กส.๓ ชป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

- ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ งานแล้วเสร็จ ผลงานสะสม ๑๐๐% เร็วกว่าแผน






แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ
ตำบลแหน่ไพ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % งาน ของโครงการเทียบกับ 100%	พ.ศ.2559	พ.ศ.2560						หมายเหตุ
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
1.งานข้างเหมา	4,504,700.00	15.01	15.000 10.000	20.00 15.00			40.00	25.00			
2.งานดำเนินการเอง	25,360,700.00	84.54	5.000 5.000	15.00 15.00	20.00 20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
3.ค่าอำนวยการและดำเนินงาน	135,100.00	0.45	5.000 5.000	15.00 15.00	20.00 20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
รวมราคาค่าก่อสร้าง	30,000,000.00	100.00									
แผนงาน / เดือน (%)			6.00	16.00	17.00	17.00	18.00	12.00	9.00	4.00	
แผนงานสะสม / เดือน (%)			6.00	22.00	39.00	56.00	74.00	86.00	95.00	99.00	
ผลงาน / เดือน (%)			10.00	10.00	25.00	15.00	25.00	15.00			แผนงานสะสม
ผลงานสะสม / เดือน (%)			10.00	20.00	45.00	60.00	85.00	100.00			ผลงานสะสม


กส.๔ ชป.๑ รายงานความก้าวหน้างานที่รับมอบหมาย ดังนี้

- ฝายนาหมากปินพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน งานคอนกรีตตัวฝายแล้วเสร็จ กำลังงานเรียงหินด้านหน้าและด้านท้าย เคลียร์ดินในลำน้ำบริเวณหน้าฝาย ระบบส่งน้ำสายซอยแล็วเสร็จ เหลืองานสายหลัก ผลงานสะสม ๘๒% มีการปรับแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน



แผน - ผลปฏิบัติงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
งานก่อสร้างฝายบาหมากปิดพร้อมระบบส่งน้ำ
ตำบลป่างหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

กิจกรรม/รายการ	จำนวนเงิน	น้ำหนัก % ตามของโครงการเมื่อเทียบกับ 100%	พ.ศ.2559	พ.ศ.2560							หมายเหตุ
			ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
1.งานจ้างเหมา	2,010,000.00	4.72	15.000	20.00			40.00	25.00			
			5.000	15.00							
2.งานดำเนินการเอง	778,146.40	1.81									
2.1 กิจกรรมฝายคอนกรีต	12,842,208.09	28.94	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
			5.000	10.00	20.00						
2.2 กิจกรรมระบบส่งน้ำสาย RMC	10,458,537.17	24.10	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
			5.000	10.00	20.00						
2.3 กิจกรรมระบบส่งน้ำสาย LR-RMC	14,747,108.56	34.30	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
			5.000	10.00	15.00						
3.ค่าอำนวยการและดำเนินงาน	2,652,000.00	5.93	5.000	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
			5.000	10.00	15.00						
รวมราคาค่าก่อสร้าง	43,000,000.00	100.00									
แผนงาน / เดือน (%)			5.00	15.00	20.00	20.00	15.00	10.00	10.00	5.00	
แผนงานสะสม / เดือน (%)			5.00	20.00	40.00	60.00	75.00	85.00	95.00	100.00	
ผลงาน / เดือน (%)			3.00	10.00	22.00	24.00	10.00	9.00			แผนงานเดิม
ผลงานสะสม / เดือน (%)			3.00	16.00	38.00	62.00	73.00	82.00			ผลงานสะสม

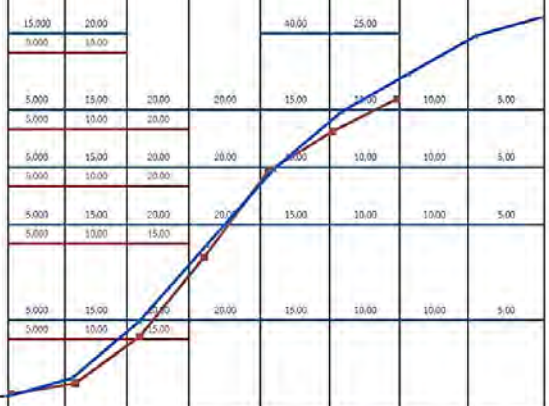

พด.คส.๑ รายงานความก้าวหน้างานพัสดุ ตามรูปตารางดังนี้

	รายการ	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	อนุมัติแผน	รับ RQ	ร่างเอกสาร	ประกาศขาย เอกสาร	คำนวณ/ เปิดซอง	เสนอ/ ประกาศผู้ชนะ	อนุมัติรับราคา	ใบสั่ง/สัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา
	EB ชุด 1																
1	ทราย อมป.	บีที	2,908,300.00	1,733,400.00	15 มี.ค 60	27 มี.ค 60		5-18 เม.ย 60	19-24 เม.ย 60	25 เม.ย 60	28 เม.ย 60	18 พค 60				30 วัน	
	eb๑14							สอบถามภายใน 12 เม.ย ชี้แจง 20 เม.ย									
2	เหล็ก อมป.	ตั้ง	5,150,500.00	3,792,108.61		แก้ราคากลาง	26-1 พค 60	2-9 พค 60	11-19 พค 60	22 พค 60	25 พค 60	29 พค 60				40 วัน	ง.1
	eb๑15ใหม่ eb18																
	eb20																
								สอบถามภายใน 15 พค ชี้แจง 17 พค									ง.2
	EB ชุด 2																
1	ปูน อมป.	cps	2,511,600.00	1,451,572.50				10-20 เม.ย 60	21-25 เม.ย 60	26 เม.ย 60	2 พ.ค 60	18 พค 60				40 วัน 3 ง.	ง.1
	eb๑16							สอบถามภายใน 19 เม.ย ชี้แจง 21 เม.ย									ง.2
2	เหล็ก อมนป.	สมัยขา	4,142,900.00	3,149,744.01				26-3 พค 60	4-9 พค 60	11 พค 60	17 พ.ค 60	26 พค 60				40 วัน 3 ง.	ง.1
	eb๑17/eb19																
								สอบถามภายใน 2 พค ชี้แจง 5 พค									ง.2
3	เหล็ก คมข eb21	ตั้ง	6,434,100.00				22-25 พค 60	26-2 มิย 60	5-12 มิย 60	13 มิย 60	16 มิย 60						
	eb23																
								สอบถามภายใน 5 มิย ชี้แจง 8 มิย									
4	สารประกอบโซเดียมซิลิ	ควงพิเทค	2,741,200.00	2,672,430.00				3-11 พค 60	15-18 พค 60	19 พค 60	24 พค 60	1 มิย 60				30 วัน	ง.1
	เกตและสารประกอบโซ							สอบถามภายใน 11 พค ชี้แจง 16 พค									ง.2
	เดียมไบคาร์บอเนต																
	อมป eb 22																

	รายการ		วงเงิน	รับราคา	อนุมัติแผน	รับ RQ	ประกาศ-ยื่นเปิดซอง	เปิดซอง	ประกาศผู้ชนะอนุมัติรับราคา	ใบสั่ง/สัญญา	ส่งของ	ตรวจรับ	PO	กำหนดส่ง	ครบสัญญา	ร้านค้า
	สอบชุด 1															
ส30	หินใหญ่ อมป.	บีพี	1,830,700.00	1,830,612.00	15 มีค 60	27 มีค 60	7-18เม.ย 60	20 เม.ย 60	25 เม.ย 60	15 พค 60				30		
ส31	ปูน อมนป.	cps	992,400.00	728,227.50			"	"	"	"				30 2 ง		
ส32	แผ่นใยสังเคราะห์ อมป.	go	640,700.00	634,480.00			"	"	"		11 พค 60			5 วันทำการ		
ส33	คอนกรีตผสมเสร็จ อมป	cps	1,980,000.00	1,962,000.00			"	"	"	รอ วศ						
	สอบชุด 2															
ส34	แผ่นไม้อัด อมป.	สมัยขา	1,055,000.00	813,390.00			11-21 เมย60	25 เม.ย 60	28 เม.ย 60		8 พค 60			5 วันทำการ		
ส35	หินลูกรัง อมนป.	ศรีชาค	652,000.00	243,908.00			"	"	"	1 มิย 60				30		
ส36	แผ่นสิ่นเหนียวสังเคราะห์ อมป.	kkl	1,641,300.00	1,529,780.00			"	"	"	18 พค 60				30		
ส37	หินย่อย เบอร์ 2 อมป	bp	682,400.00	679,635.00			"	"	"	15 พค 60				30		
	สอบชุด 3															
ส38	คอนกรีตผสมเสร็จ อมนป.	ธนา	1,434,400.00	1,433,748.00			18-28เม.ย60	2 พ.ค 60	5 พ.ค 60	26 พค 60				60		
ส39	แผ่นไม้อัด อมนป.	สมัยขา	1,229,700.00	948,240.00			"	"	"		15 พค 60			5 วันทำการ		
ส40	กรวดเบอร์ 2 อมป	บีพี	1,983,400.00	1,917,277.00			"	"	"	18 พค 60				30		
ส41	ทรายหยาบ อมนป.	ขโนทัย	837,300.00	768,537.00			"	"	"	18 พค 60				30		
	สอบชุด 4															
ส42	หินใหญ่ อมนป.	บีพี	761,600.00	758,991.00			19 เมย-1พค60	3 พ.ค 60	8 พ.ค 60	23 พค 60				30		
ส43	แผ่นสิ่นเหนียวสังเคราะห์ อมนป.	go	1,278,800.00	1,251,000.00			"	"	"		31 พค 60			5 วันทำการ		
ส45	หินลูกรัง อมนป.	กิตติ	1,314,300.00	1,126,202.00			"	"	"	รอ วศ				30		
	สอบชุด 5															
ส46	หินย่อย คมข	บีพี	664,300.00	660,964.00			27 เมย-8พค60	11 พ.ค 60	17 พ.ค 60	26 พค 60						
ส47	ปูน คมข	cps	1,527,000.00	975,545.00			"	"	"	26 พค 60						
ส48	คอนกรีตผสมเสร็จ ฝรบ	อุดมธนา	1,968,800.00	1,963,125.00			"	"	"	รอ กส 2						
ส49	หินใหญ่ ฝรบ	บีพี	943,700.00	936,360.00			"	"	"	23 พค 60				120 4 ง		
	สอบชุด 6															
ส50	กรวด # 2 ฝรบ	พชร	605,600.00	603,995.76			4-15พค60	17 พ.ค 60	19 พ.ค 60	1 มิย 60				120 4 ง		
ส51	ปูน ฝรบ	cps	1,099,500.00	1,092,092.00			"	"	"	26 พค 60						
ส52	คอนกรีตผสมเสร็จ คมข	cps	1,978,800.00	1,914,780.00			"	"	"	รอ กส 2				90 3 ง		
	สอบชุด 7															
ส53	หินยย. คมข	บีพี	1,761,900.00	1,005,717.00			9-19พค60	23 พ.ค 60	25 พ.ค 60	รอ กส 2						
ส54	หินย่อย #2 ฝรบ	วุฒิโชค	977,500.00	668,950.00			"	"	"	6 มิย 60						

	สอบชุด 8															
ส55	ทรายหยาบ ฝรบ	ศรียนต์	1,715,100.00	1,167,182.00			11-22 พค60	24 พ.ค 60	26 พ.ค 60	6 มิย 60						
	สอบชุด 9															
ส56	วัสดุทำบาน คมข	สันทรรศ์	686,300.00				30 พค-9 มิย60	13 มิย 60	15 มิย 60							
สจ	จ้างงานดิน ฝรบ		1,970,000.00				"	"	"							
สจ	จ้างงานดิน ฝรบ		1,997,000.00				1 -12 มิย60	14 มิย 60	16 มิย 60							
สจ	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือ	ยีโอเทค	1,712,900.00				16 -26 มิย60	28 มิย 60	30 มิย 60							
	วัดพฤติกรรมเขื่อน อมป															
สจ	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือ	ยีโอเทค	1,580,200.00				19 -29 มิย60	3 กค 60	5 กค 60							
	วัดพฤติกรรมเขื่อน อมนป															
	กรณีพิเศษ															
1	ไม้แปรรูป อมป.	อเจริญ	1,953,900.00	1,953,927.75			7 เม.ย 60			3 พค 60	30 พค 60		2 มิย 60			
2	ไม้แปรรูป อมนป.	กิตติ	2,451,000.00	2,450,713.38			11 เม.ย 60			3 พค 60	31 พค 60		2 มิย 60			
3	ไม้แปรรูป ฝรบ.	บีพี	795,100.00				1 พค 60	5 พค 60		15 พค 60				30		
4	ไม้แปรรูป คมข.	บีพี	10,642,900.00				25 เมย 60	1 พค 60		8 พค 60				120 4 ง		
								ประกาศราคากลาง								
5	ไม้แปรรูป ฝมล		1,132,700.00													
	เบ็ดเตล็ด อมป	อเจริญ	498,939.00													
	เบ็ดเตล็ด อมนป	สมัยขา	499,860.00													
	เบ็ดเตล็ด คมข	เอสที	98,818.00													
	เบ็ดเตล็ด ฝรบ	สันทรรศ์	98,856.00													

งบ.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

- ฝายห้วยไคร้(ลูกที่ ๒) พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๙๔.๑๓%
- ระบบส่งน้ำฝายตีนธาตุ เบิกจ่ายได้ ๙๗.๘๕%
- ฝายนาหมากปิน พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๗๕.๑๑%
- ระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่เงา เบิกจ่ายได้ ๙๔.๑๔%
- ฝายทาชมพู พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายได้ ๘๗.๙๔%
- อ่างเก็บน้ำห้วยเขียว เบิกจ่ายได้ ๗๑.๘๘%

<u>งบประมาณปี ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)</u>

- เสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่นาป๊าก เบิกจ่ายได้ ๑๑.๒๘%
- เสริมสันเขื่อนเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำแม่ปอน เบิกจ่ายได้ ๕.๕๒%
- โครงการผันน้ำจากลำน้ำแม่สา เบิกจ่ายได้ ๐.๗๑%
- ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายรูบ้วน เบิกจ่ายได้ ๖.๖๐%

ธก.คส.๑ รายงานผลการดำเนินงานด้านบริหาร ดังนี้

- ขอให้ส่งเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนเข้ามาพร้อมกับใบสมัคร (กรณีจ้างใหม่) และต้องถ่ายรูปให้ชัดเจน

ชก.คส.๑ รายงานตารางเปรียบเทียบการใช้น้ำมันและไฟฟ้า ดังนี้

- รายงานการใช้น้ำมันเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๙๗๗ ลิตร ลดลงจากเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๐ ๕๒ %
- รายงานการใช้ไฟฟ้าเดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙,๒๑๐ หน่วย เพิ่มจากเดือนเมษายน ปี ๒๕๖๐ ๑๖%

ตารางเปรียบเทียบ น้ำมันและไฟฟ้า ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560

การใช้น้ำมัน

เดือน	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	1,571	2013	28%	-	-
กุมภาพันธ์	1,907	1873	-	2%	-
มีนาคม	2,060	1501	-	27%	-
เมษายน	1,404	1302	-	7%	-
พฤษภาคม	1,918	1977	3%	-	เพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 60 ประมาณ 52%
มิถุนายน	1,546	-	-	-	-
กรกฎาคม	1,561	-	-	-	-
สิงหาคม	1,349	-	-	-	-
กันยายน	1,107	-	-	-	-
ตุลาคม	868	-	-	-	-
พฤศจิกายน	3,412	-	-	-	-
ธันวาคม	1,618	-	-	-	-

ตารางเปรียบเทียบ น้ำมันและไฟฟ้า ระหว่างปี 2559 และ ปี 2560

การใช้น้ำมัน

เดือน	ปี 2559	ปี 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	หมายเหตุ
มกราคม	1,571	2013	28%	-	-
กุมภาพันธ์	1,907	1873	-	2%	-
มีนาคม	2,060	1501	-	27%	-
เมษายน	1,404	1302	-	7%	-
พฤษภาคม	1,918	1977	3%	-	เพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย. 60 ประมาณ 52%
มิถุนายน	1,546	-	-	-	-
กรกฎาคม	1,561	-	-	-	-
สิงหาคม	1,349	-	-	-	-
กันยายน	1,107	-	-	-	-
ตุลาคม	868	-	-	-	-
พฤศจิกายน	3,412	-	-	-	-
ธันวาคม	1,618	-	-	-	-

<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา**

- ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณา

<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u> **เรื่องอื่น ๆ**

➢ ขอให้ บท.คส.๑ ดำเนินการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน และจัดทำคำสั่งมอบหมายให้ นายบรรจบ ปันเต๋ ไปปฏิบัติงานฝายรูบ้วน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

➢ กำหนดวันประชุมประจำเดือนครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

<u>เลิกประชุมเวลา</u> ๑๔.๔๕ น.

(นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง)

ผู้จัดทำรายงานการประชุม

รายชื่อผู้มาประชุมประจำเดือนโครงการ

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นายสุคชาย พรหมมลมาศ	ผคส.๑	อบรมนักปกครองระดับสูง	
๒	นายพิทยา อิ่มเอม	วศ.คส.๑		ทำหน้าที่ประธาน
๓	นายจุลทศักดิ์ จิตเจริญ	กส.๑ชป.๑		
๔	นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ	กส.๒ชป.๑	อบรมนักบริหารระดับกลาง	
๕	นายจะเด็ด สุวรรณธรรมา	กส.๓ชป.๑		
๖	นายปารเมศ การุณนราพร	กส.๔ชป.๑		
๗	นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วิศวกรชลประทานชำนาญการ		
๘	นายสามารถ อาษากิจ	นายช่างชลประทานชำนาญงาน		
๙	นายสมบัติ โนชัย	ชก.คส.๑		
๑๐	นางนิตยา สุ่มประดิษฐ์	บท.คส.๑		เลขานุการ
๑๑	นางปราณี กองงาม	งบ.คส.๑		
๑๒	นางสาวกัณฑารีย์ ภูวสินรังสรรค์	พด.คส.๑		
๑๓	นางสาวดวงเดือน รุ่งเรือง	ธก.คส.๑		ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔	นางสาวชลมาศ ทองคำ	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน	ปฏิบัติงานช่างเทคนิค	
๑๕	นางจินตนา ชูดวง	พนักงานพิมพ์ ส ๒		
๑๖	นายโยธิน สุธรรม	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์		
๑๗	นายอานนท์ ปะสันธิ	พนักงานขับรถ		
๑๘	นายเดชา ชรรัชพัฒน์	นายช่างชลประทาน		
