รายงานการประชุมประจำเดือน(ครั้งที่๗/๒๕๖๖)
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑.	นายนพดล น้อยไพโรจน์	ผคส.๑	ประธาน
๒.	นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วศ.คส.๑.	
๓.	นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ	กส.๒ ชป.๑	
๔.	นายวีระวิทย์ รงค์ทอง	กส.๓ ชป.๑	
๕.	นางสาวรชยา อยู่เชื้อ	บท.คส.๑	เลขา
๖.	นางสาวกัญฐณา ฐดิวัฒน์	พด.คส.๑	
๗.	นายณรงค์วัฒน์ มาเกิด	ชก.คส.๑	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสกลรัฐ ปรางงาม	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒.	นายสิทธิชัย ชัยวิรัช	นายช่างชลประทานชำนาญงาน แทน กส.๒
๓.	นายจักรกริช ซ่อนกลิ่น	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน แทน กส.๔
๔.	นางสาวณัฏฐา ทิมแก้ว	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๕.	นายอานันท์ นิลสนธิ	พนักงานทั่วไป
๖.	นางสาวปิยะธิดา จันทร์สูง	เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ที่ไม่มาประชุม

๑.	นายชยุต สมัครวงษ์	กส.๑ ชป.๑	ลาพักผ่อน
๒.	นายภูวเมศฐ์ อัศวมงคลพงษ์	กส.๔ ชป.๑	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผคส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

<u>ระเบียบวาระที่๑</u> **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- เนื่องด้วยช่วงที่ผ่านมาได้มีระเบียบต่างๆออกมาหลายอย่างรวมถึงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งจะให้ทาง บท.คส.๑ ชี้แจงและชักซ้อมความเข้าใจอีกครั้งในวาระที่ ๕ เพื่อที่จะได้ถือปฏิบัติตามหลักได้อย่างถูกต้อง
- กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์คาดการณ์ว่า ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของเราโดยตรง ให้ทุกงานก่อสร้างทำการประเมินความเสี่ยงและวางแผนการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อที่หากเกิดเหตุจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> **รับรองรายงานการประชุม**

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม

<u>ระเบียบวาระที่๓</u> **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

วศ.คส๑ รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมายดังนี้

รายงานการคุมเงินงบประมาณ





งบกันเหลื่อมปี 2565

	งบจัดสรร (บาท)	คุมประมาณการ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคุมประมาณการคงเหลือ (บาท)
หมวด 600 งบลงทุน	17,572,293.25	17,439,599.35	17,397,779.95	132,693.90
งบกลาง 65 (กปร.)	36,100,715.07	30,642,323.59	21,775,570.59	5,458,391.48
สรุปยอดวงเงิน	53,674,698.17	48,081,922.94	39,173,350.54	5,591,085.38


งบปี 2566


	งบจัดสรร (บาท)	คุมประมาณการ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคุมประมาณการคงเหลือ (บาท)
หมวด 600 งบลงทุน	208,062,794.69	159,741,380.37	152,178,290.72	48,321,414.32
หมวด 300 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	48,800.00	24,900.00	200
หมวด 300 ค่าไฟฟ้า	13,400	13,400	13,400	0
หมวด 450 ค่าสาธารณูปโภค	213,681	213,681	213,679.65	0
สรุปยอดวงเงิน	208,260,771.69	160,017,261.37	152,430,270.37	48,321,614.32


งบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(ปี 2566)


	งบจัดสรร (บาท)	คุมประมาณการ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคุมประมาณการคงเหลือ (บาท)
หมวด 600 งบลงทุน	989,800.00	943,643.16	838,292.86	46,156.84
สรุปยอดวงเงิน	989,800.00	943,643.16	838,292.86	46,156.84



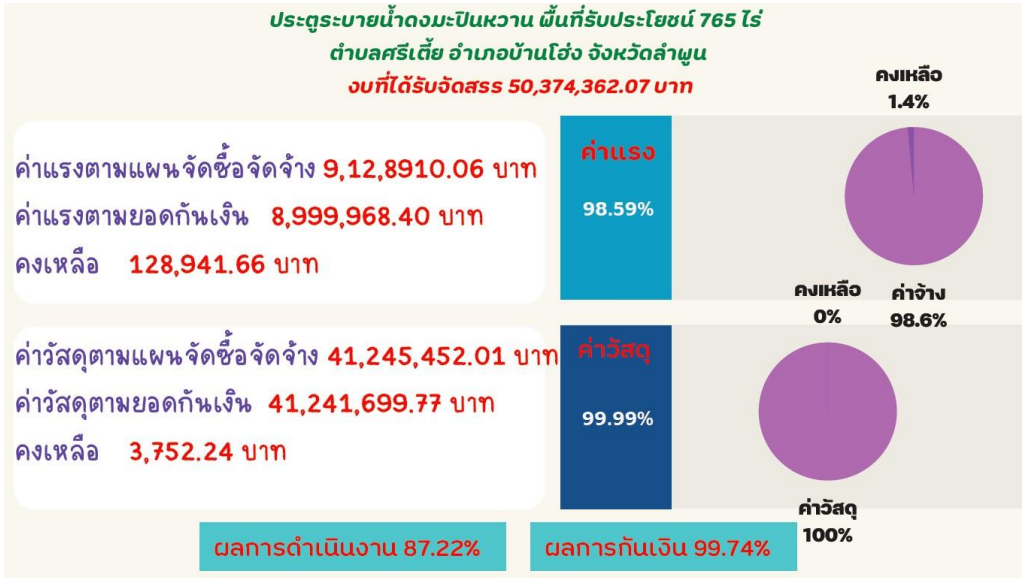

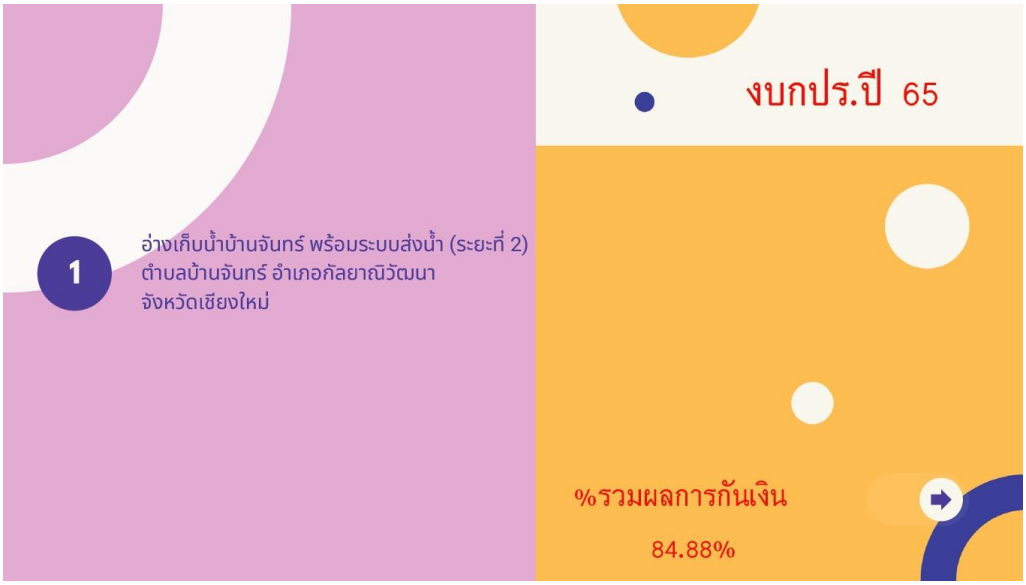
งบกปร.ปี 65
1
อ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์ พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2)
ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
%รวมผลการกันเงิน
84.88%

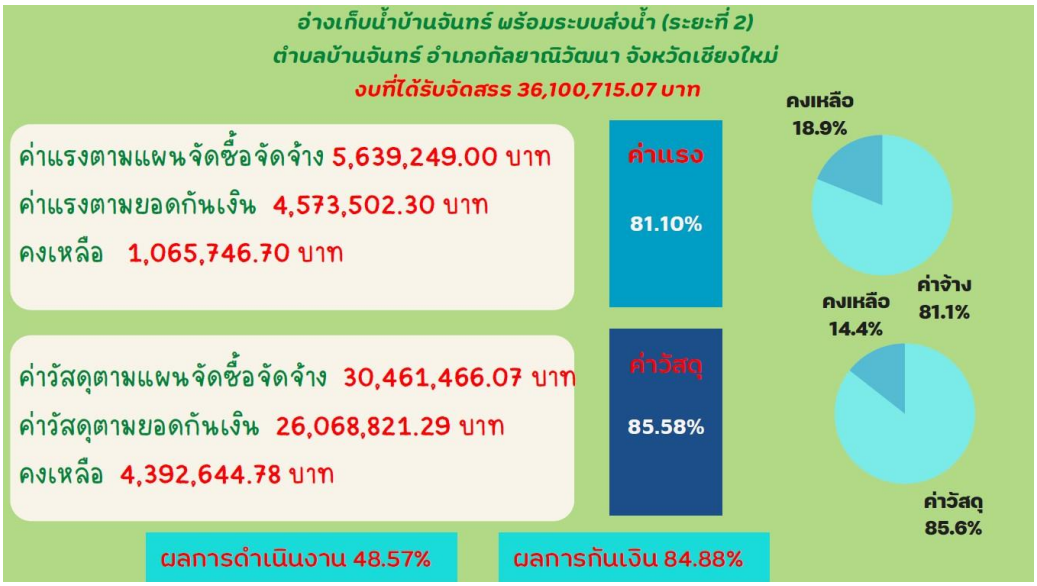

อ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์ พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2)
ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
งบที่ได้รับจัดสรร 36,100,715.07 บาท
ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 5,639,249.00 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 4,573,502.30 บาท
คงเหลือ 1,065,746.70 บาท
ค่าแรง
81.10%
ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 30,461,466.07 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 26,068,821.29 บาท
คงเหลือ 4,392,644.78 บาท
ค่าวัสดุ
85.58%
คงเหลือ
18.9%
ค่าจ้าง
81.1%
คงเหลือ
14.4%
ค่าวัสดุ
85.6%
ผลการดำเนินงาน 48.57%
ผลการกันเงิน 84.88%

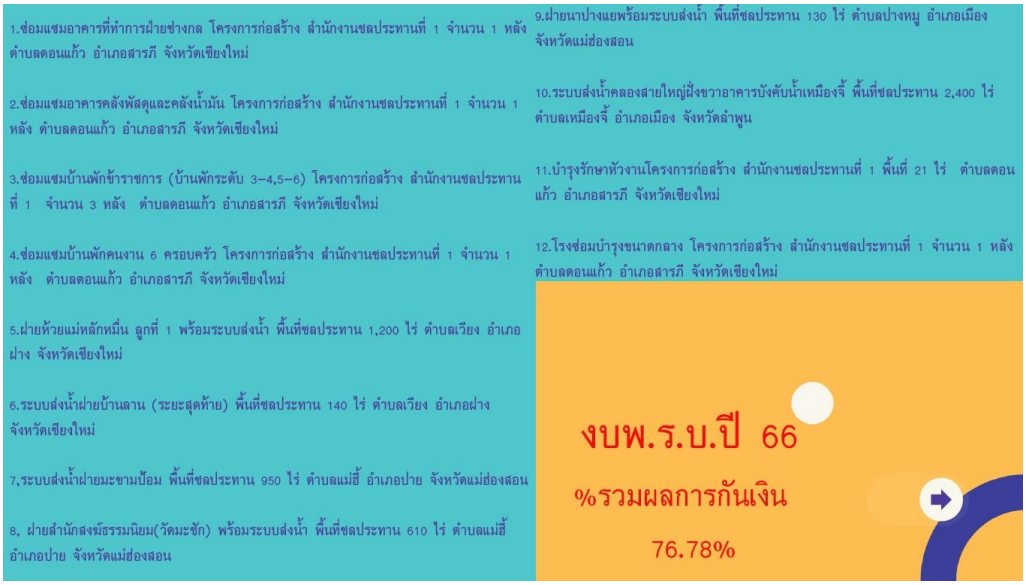
1.ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายช่างกล โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2.ซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุและคลังน้ำมัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
3.ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักระดับ 3-4,5-6) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 3 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4.ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
5.ฝายห้วยแม่หลักหมื่น ลูกที่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
6.ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน (ระยะสุดท้าย) พื้นที่ชลประทาน 140 ไร่ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
7.ระบบส่งน้ำฝายมะขามป้อม พื้นที่ชลประทาน 950 ไร่ ตำบลแม่ยี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8. ฝายสำนักสงฆ์ธรรมนิยม(วัดมะขัก) พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 610 ไร่ ตำบลแม่ยี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9.ฝายนาป่างแยพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 130 ไร่ ตำบลป่างหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10.ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวาอาคารบังคับน้ำเหมืองจี้ พื้นที่ชลประทาน 2,400 ไร่ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
11.บำรุงรักษาหัวงานโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 พื้นที่ 21 ไร่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
12.โรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
งบพ.ร.บ.ปี 66
%รวมผลการกันเงิน
76.78%

โรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง
ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
งบที่ได้รับจัดสรร 5,280,825 บาท

ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 90,825 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 43,600.00 บาท
คงเหลือ 47,225.00 บาท

ค่าแรง 48.00%



ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 5,190,000 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 0 บาท
คงเหลือ 5,190,000 บาท

ค่าวัสดุ 0%




ผลการดำเนินงาน 59.36%
ผลการกันเงิน 0.83%

ฝายห้วยแม่หลักหมื่น ลูกที่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบที่ได้รับจัดสรร 36,807,938.80 บาท


ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 13,887,722.32 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 10,692,650.95 บาท
คงเหลือ 3,195,071.37 บาท

ค่าแรง 76.99%



ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22,920,216.48 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 17,797,004.75 บาท
คงเหลือ 5,123,211.73 บาท

ค่าวัสดุ 77.65%




ผลการดำเนินงาน 67.98%
ผลการกันเงิน 77.40%

ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน (ระยะสุดท้าย) พื้นที่ชลประทาน 140 ไร่
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบที่ได้รับจัดสรร 13,097,801.29 บาท

ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 4,735,314.00 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 2,335,919.95 บาท
คงเหลือ 2,399,394.05 บาท

ค่าแรง 49.33%



ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 8,362,487.29 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 7,632,583.65 บาท
คงเหลือ 729,903.64 บาท

ค่าวัสดุ 91.27%



ผลการดำเนินงาน 64.17%
ผลการกันเงิน 76.11%

ระบบส่งน้ำฝายมะขามป้อม พื้นที่ชลประทาน 950 ไร่
ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
งบที่ได้รับจัดสรร 38,889,659.52 บาท


ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 11,649,807.00 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 6,378,433.45 บาท
คงเหลือ 5,271,373.55 บาท

ค่าแรง 54.75%



ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 27,239,852.52 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 22,016,835.50 บาท
คงเหลือ 5,223,017.02 บาท

ค่าวัสดุ 80.83%



ผลการดำเนินงาน 68.43%
ผลการกันเงิน 73.01%

ฝายสำนักสงฆ์ธรรมนิยม(วัดมะซัก) พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 610 ไร่
ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบที่ได้รับจัดสรร 43,675,665.15 บาท


ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 15,617,861.72 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 8,333,628.85 บาท
คงเหลือ 7,284,232.87 บาท

ค่าแรง 53.36%



ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 28,057,803.43 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 20,796,183.21 บาท
คงเหลือ 7,261,620.22 บาท

ค่าวัสดุ 74.12%




ผลการดำเนินงาน 43.25%
ผลการกันเงิน 66.70%

ฝายนาปางแยพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 130 ไร่
ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบที่ได้รับจัดสรร 32,091,247.53 บาท

ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 9,996,096.51 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 7,350,787.70 บาท
คงเหลือ 2,645,308.81 บาท

ค่าแรง 73.54%




ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22,095,151.02 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 21,566,249.13 บาท
คงเหลือ 528,901.89 บาท


ค่าวัสดุ 97.61%



ผลการดำเนินงาน 71.22%
ผลการกันเงิน 90.11%

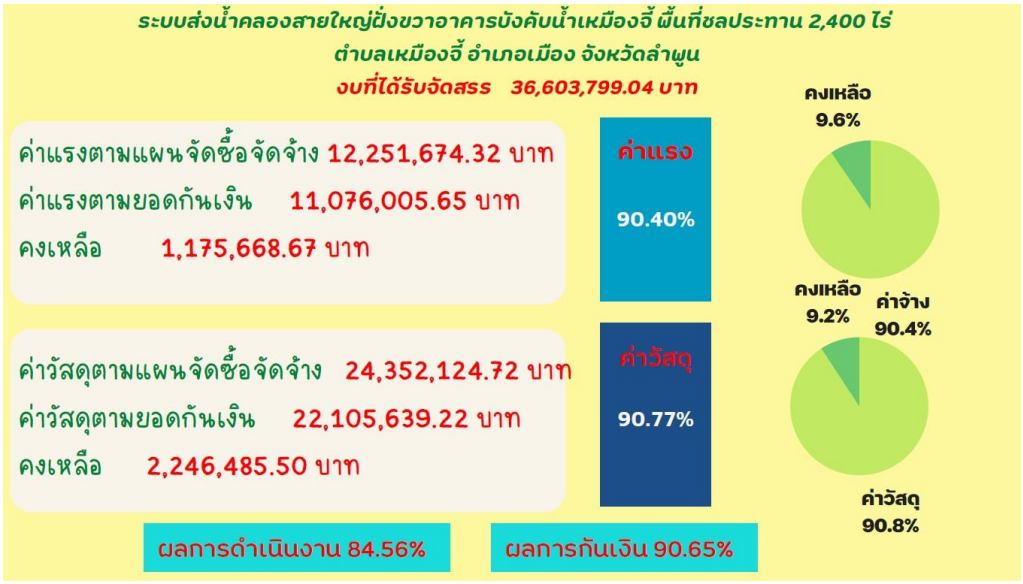
ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวาอาคารบังคับน้ำเหมืองจี้ พื้นที่ชลประทาน 2,400 ไร่
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
งบที่ได้รับจัดสรร 36,603,799.04 บาท
ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 12,251,674.32 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 11,076,005.65 บาท
คงเหลือ 1,175,668.67 บาท
ค่าแรง
90.40%
ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 24,352,124.72 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 22,105,639.22 บาท
คงเหลือ 2,246,485.50 บาท
ค่าวัสดุ
90.77%
ผลการดำเนินงาน 84.56%
ผลการกันเงิน 90.65%
คงเหลือ 9.6%
คงเหลือ 9.2%
ค่าจ้าง 90.4%
ค่าวัสดุ 90.8%


งบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ปี2566)
1.ปรับปรุงซ่องระบายทรายฝายทุ่งโปร่ง
ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
%รวมผลการกันเงิน
95.34%

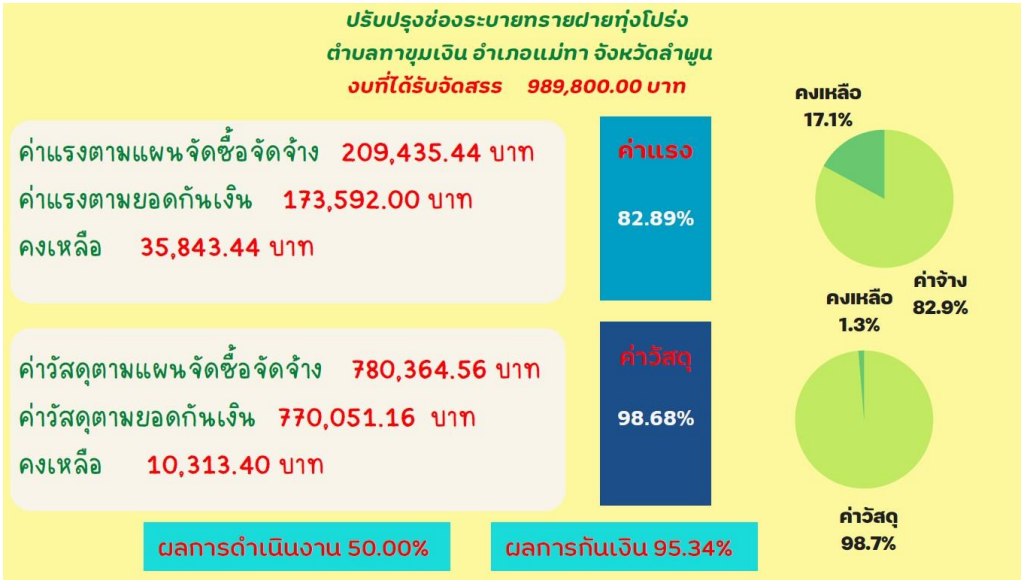
ปรับปรุงซ่องระบายทรายฝายทุ่งโปร่ง
ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
งบที่ได้รับจัดสรร 989,800.00 บาท
ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 209,435.44 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 173,592.00 บาท
คงเหลือ 35,843.44 บาท
ค่าแรง
82.89%
ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 780,364.56 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 770,051.16 บาท
คงเหลือ 10,313.40 บาท
ค่าวัสดุ
98.68%
ผลการดำเนินงาน 50.00%
ผลการกันเงิน 95.34%
คงเหลือ 17.1%
คงเหลือ 1.3%
ค่าจ้าง 82.9%
ค่าวัสดุ 98.7%


งานก่อสร้างในความรับผิดชอบ

นายสกลรัฐ ปรางงาม รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้


จัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ ๒

- การบดอัดดินหน้าหน้าทำนบดิน ปัจจุบันระดับอยู่ที่ +๑,๐๑๐.๙๕ ด้านหลังทำนบดิน ระดับอยู่ที่ +๑,๐๐๙.๘๕ และตรงกลางบริเวณร่องแกนระดับอยู่ที่ +๑,๐๑๐.๕๐
- การเรียงหินด้านหน้าทำนบดิน เรียงอยู่ที่ระดับ +๑,๐๑๐
- งานดินขุด Chimney Drain ปัจจุบันดำเนินการขุดได้ประมาณ ๙ เมตร
- งานเรียงหินของ Rock fill Toe ดำเนินการได้ประมาณ ๓ เมตร

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน

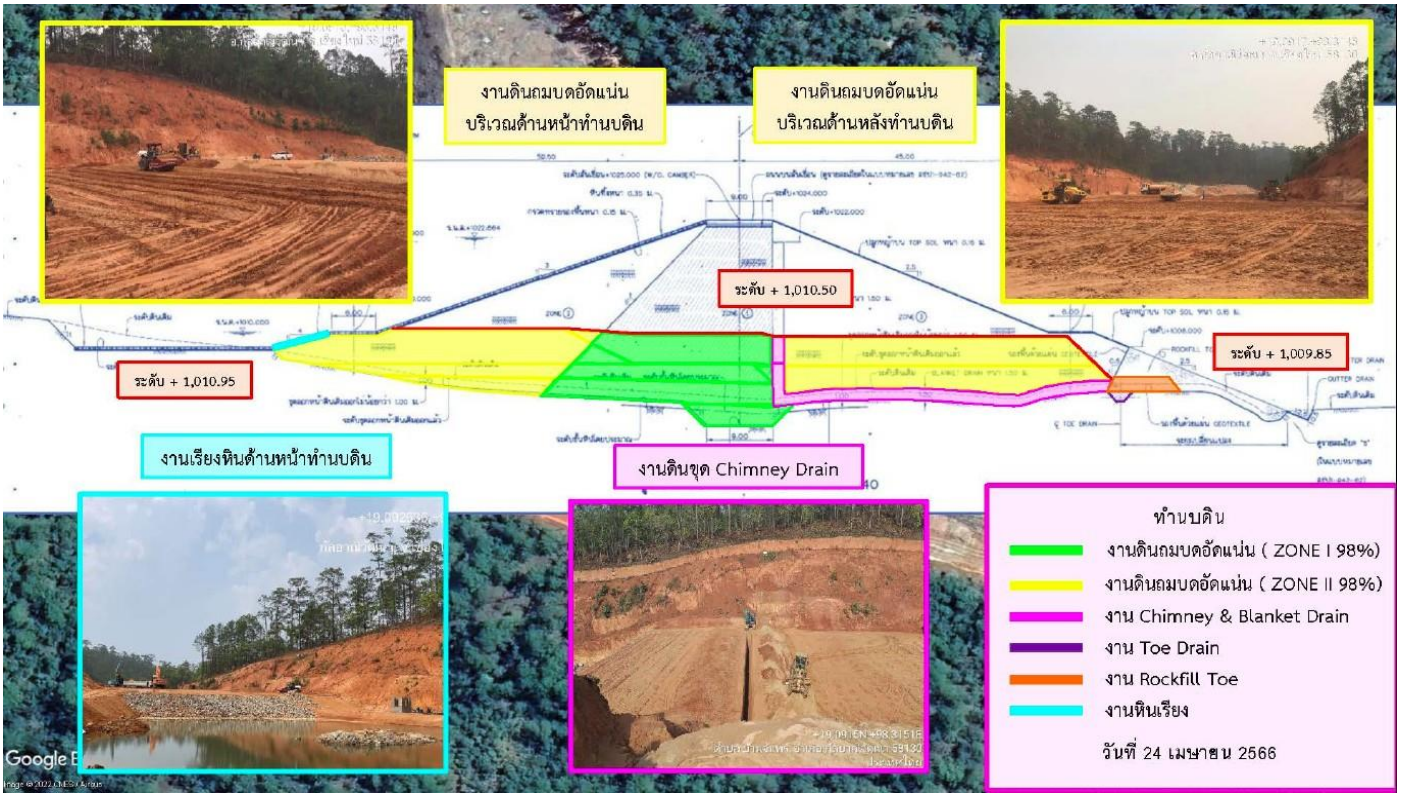


- ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายช่วงกม๔๐๐ – กม.๑,๐๐๐ได้ดำเนินการวางท่อแล้ว ๖๐๐ เมตร และถมดินแล้วประมาณ ๒๐๐ เมตร

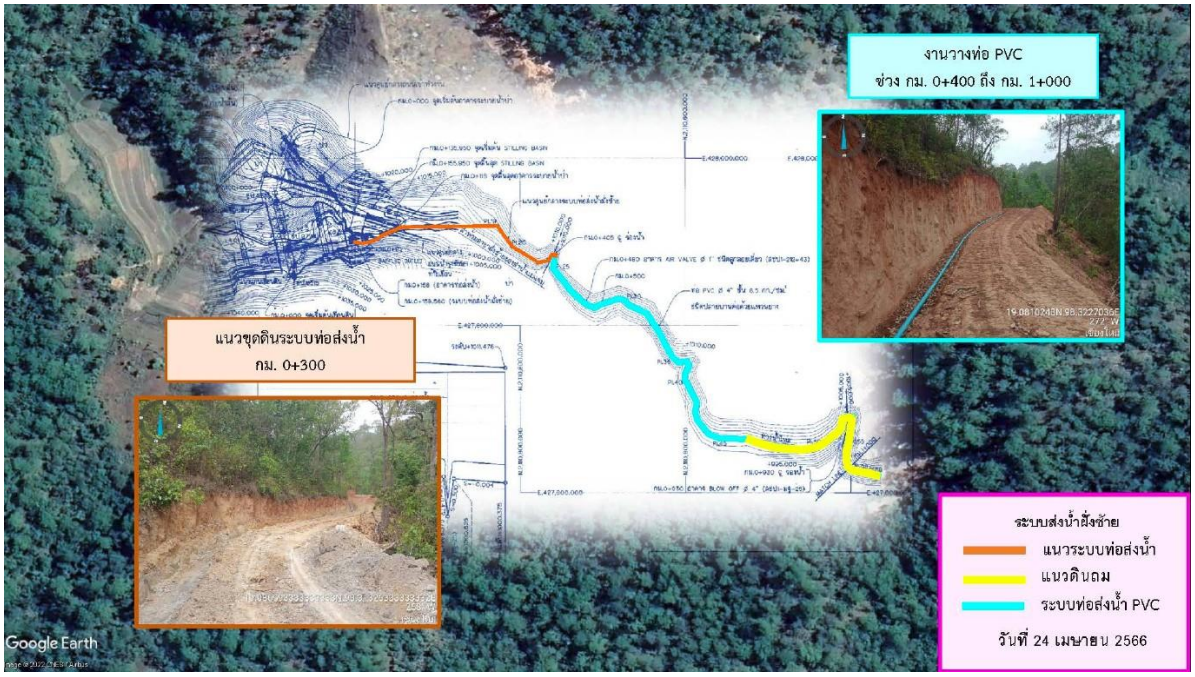

- งานถมดินช่วง กม.๑,๐๐๐ – กม.๒,๐๐๐ ดำเนินการวางท่อเรียบร้อยแล้วและได้ถมดินแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการบดอัดดิน




- งานวางท่อช่วง กม ๒,๐๐๐ ถึง ๓,๐๐๐ อยู่ระหว่างดำเนินการวางท่อแล้ว ๖๐๐ เมตร และถมดินแล้วประมาณ ๒๐๐ เมตร
- บ่อเก็บน้ำ ค.ส.ล ความจุ ๕๐๐ML ดำเนินการเทพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงระหว่างการตั้งแบบเทกำแพงบ่อ
- แนวท่อทั้งหมด ๓,๔๕๐ เมตร ดำเนินการไปแล้ว ๒,๖๐๐ เมตร ถมดินแล้ว ๑,๒๐๐ เมตร
- งานท่อทั้งหมดคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม
- ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ๔๘.๕๗%
  ดำเนินการเอง ๕๒.๐๗% จ้างเหมา ๓๙.๑๔%

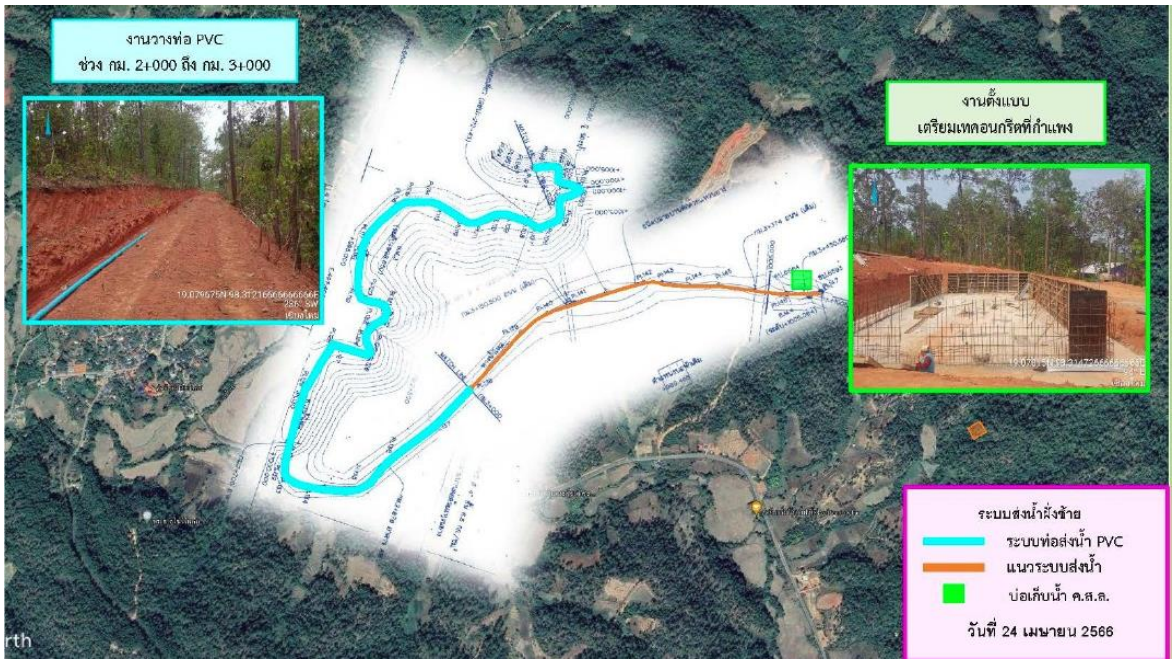



โรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑

- พื้นชั้นบนดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- พื้นชั้นล่างส่วนสีเหลืองอยู่ระหว่างดำเนินการเทตัวพื้น ยังคงค้างอีก ๑๒ แถว คาดว่าอีกประมาณ ๒ อาทิตย์จะแล้วเสร็จ
- บริเวณสีแดงรอบอาคารเป็นรางน้ำ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในอาทิตย์หน้า
- หลังคาและตัวเครนอยู่ในช่วงระหว่างเตรียมดำเนินการ
- ประตูและหน้าต่างได้ดำเนินการติดตั้งวงกบเรียบร้อยแล้ว
- ผลงานความก้าวหน้า ๕๙.๓๖%


ภาพแสดงความก้าวหน้างาน

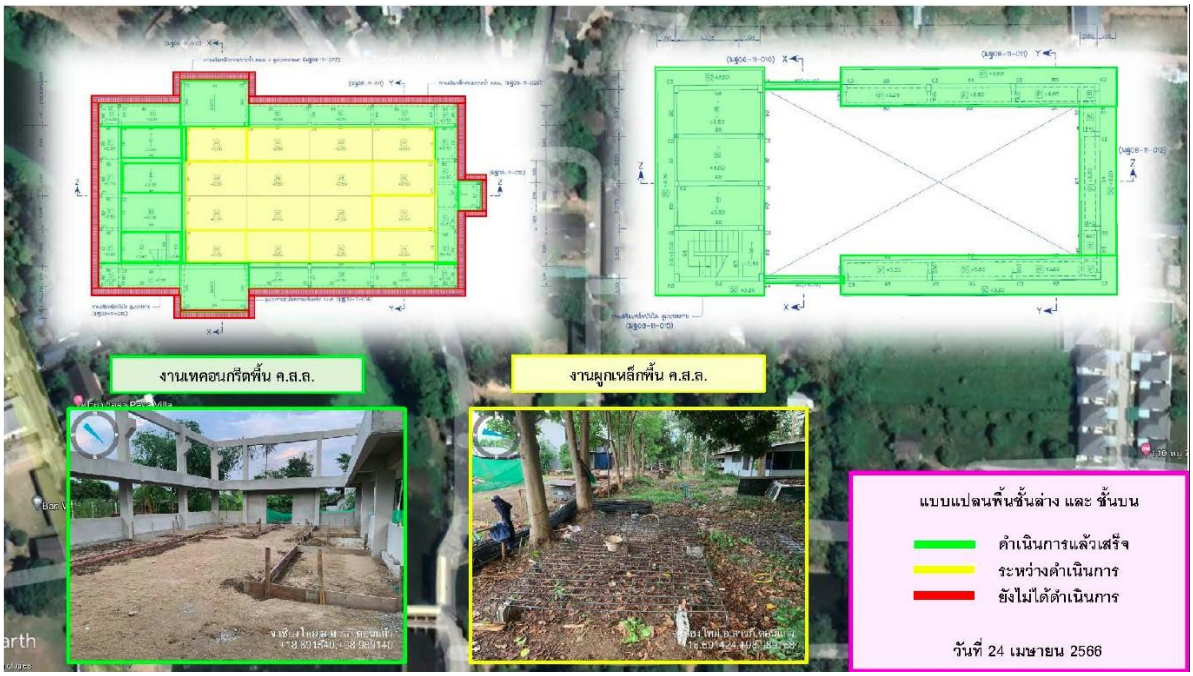

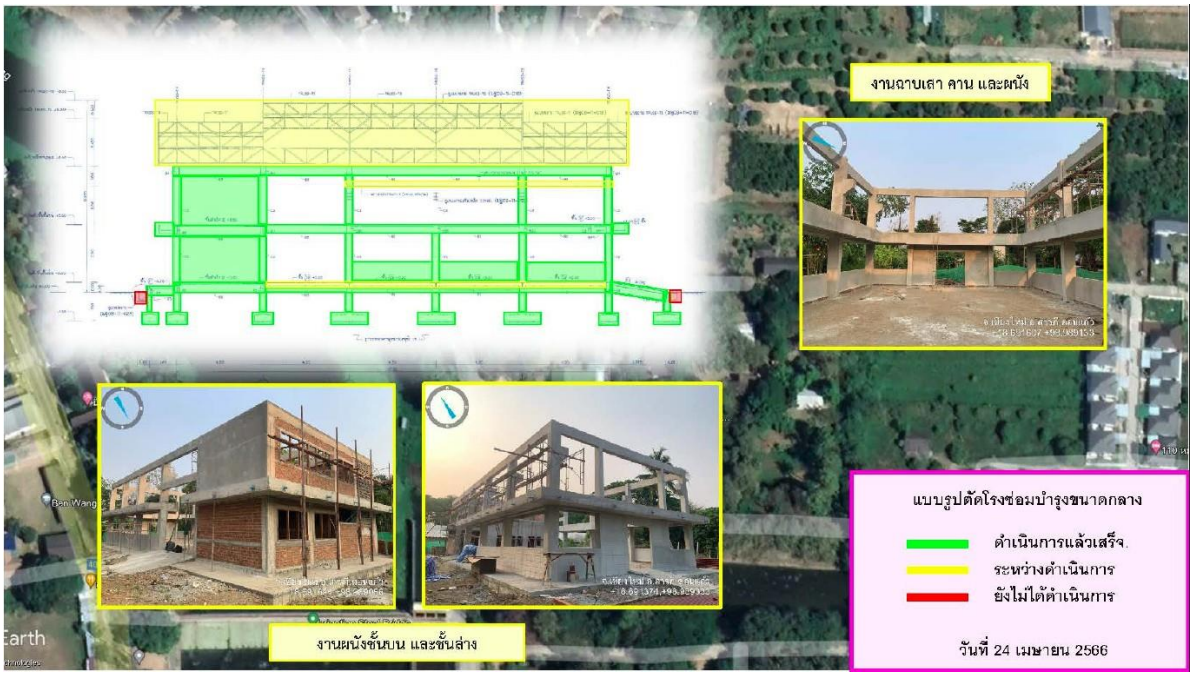

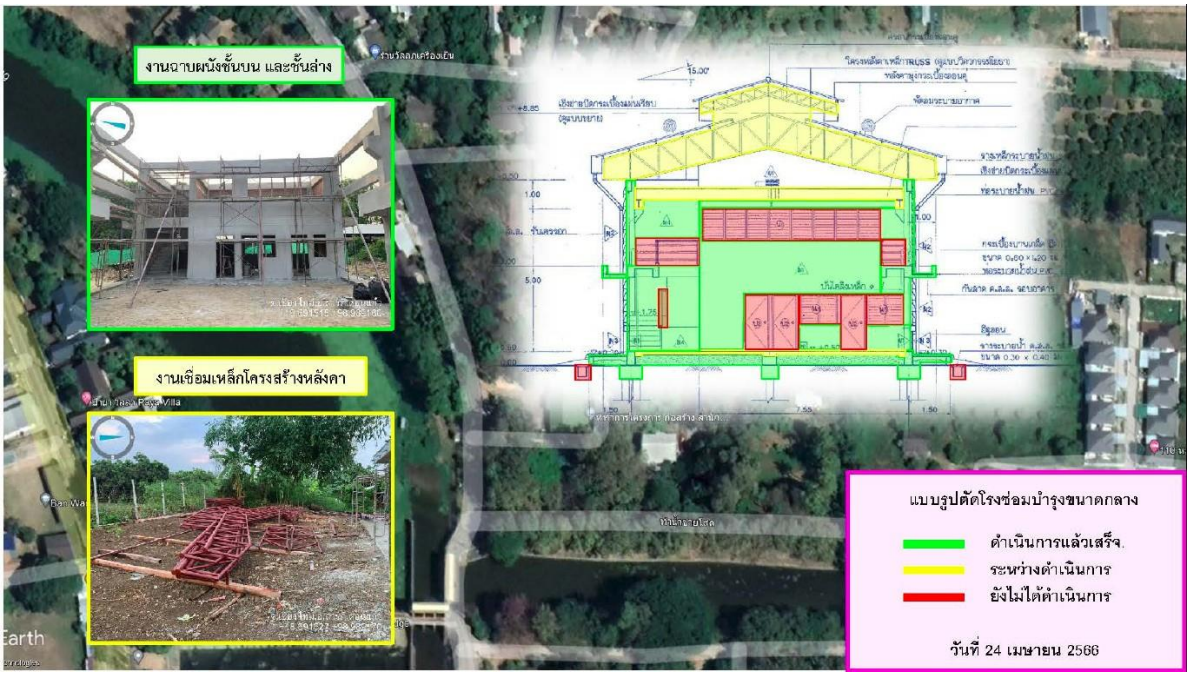

- การเบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆของทางผู้รับจ้าง ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งเรื่องตรวจสอบเพื่อเบิกงวดที่ ๑ แล้ว
- งวดที่ ๒ จะทำการเบิกหากดำเนินการเทพื้นเสร็จ
- งวดที่ ๓ จะทำการเบิกหากดำเนินการติดตั้งเครนและตัวหลังคาเรียบร้อย
- งวดที่ ๔ จะทำการเบิกหลังดำเนินการทาสีเก็บสีผนังทั้งหมดแล้ว
- งวดที่ ๕ จะทำการเบิกหลังจากติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ
- งวดที่ ๖ จะทำการเบิกหลังจากเก็บงานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
-

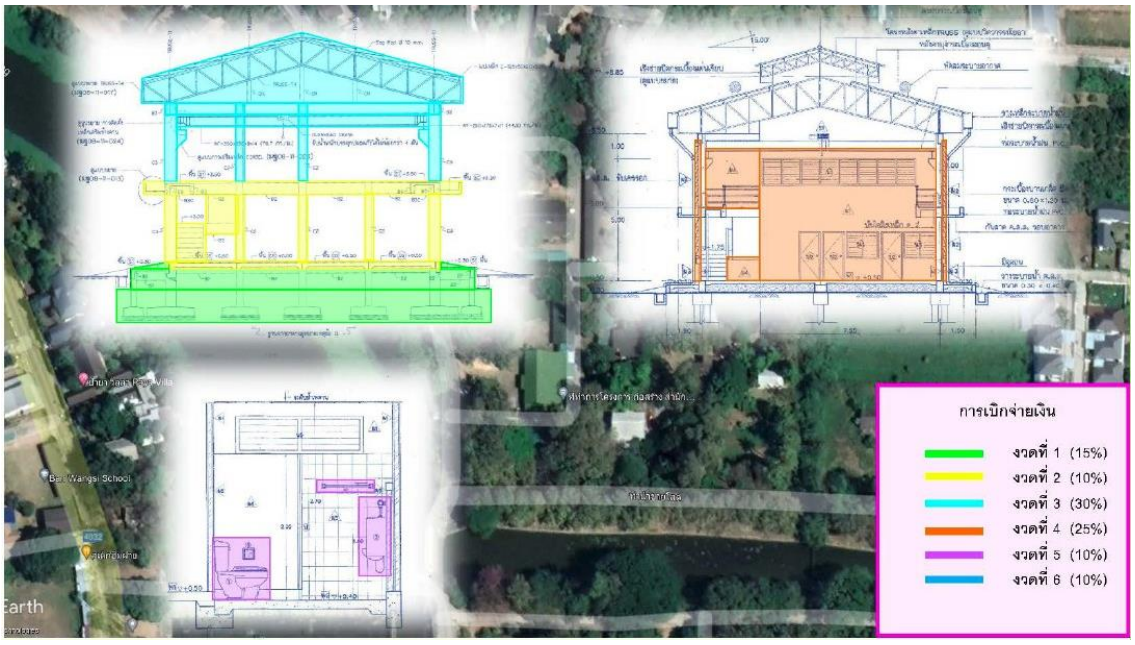


นางสาวณัฏฐา ทิมแก้ว รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้


ฝ่ายสำนักสงฆ์ธรรมนิยม(วัดมะชัก)พร้อมระบบส่งน้ำ

- ตัวฝายดำเนินการเทคอนกรีตช่วงแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตั้งแบบช่วงที่ ๒ และ ๓
- ด้านหน้าตัวฝายด้านซ้ายอยู่ระหว่างการถมดินและปรับแต่งเพื่อทำการเรียงกล่อง Gabion คาดว่าแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม
- ด้านฝั่งขวาจะเริ่มดำเนินการภายในเดือน พฤษภาคม

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน

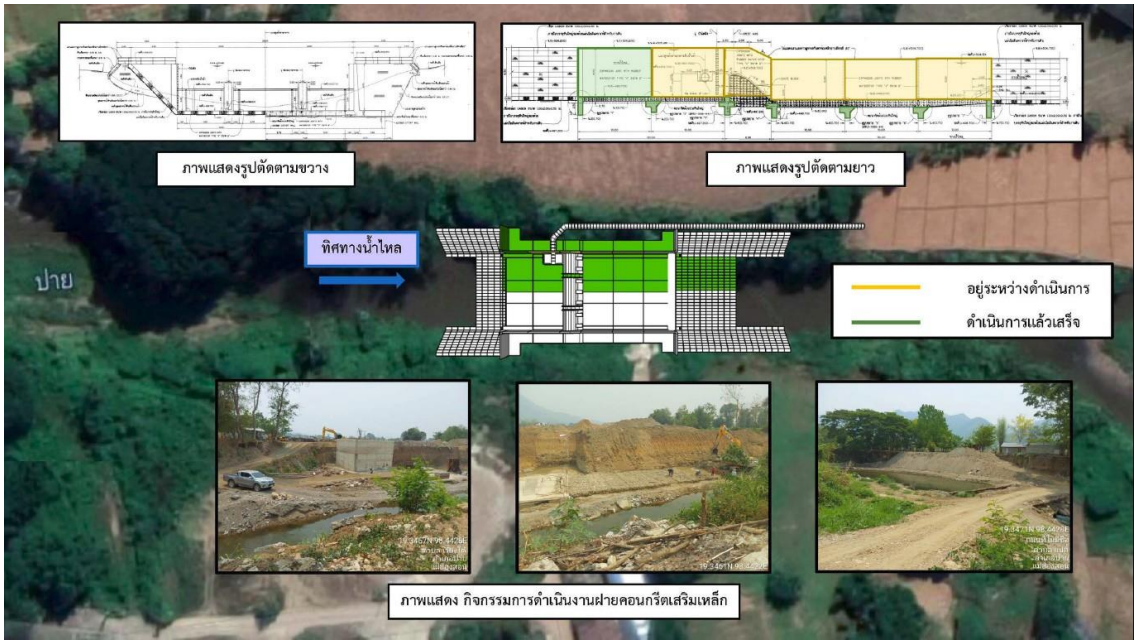

- ระบบส่งน้ำรางค.ส.ล. เริ่มดำเนินการในพื้นที่ที่พักไว้ได้แล้วคาดว่าแล้วเสร็จเดือนมิถุนายนพร้อมกับถมดินด้านข้าง
- ผลงานความก้าวหน้า ๔๓.๒๕%

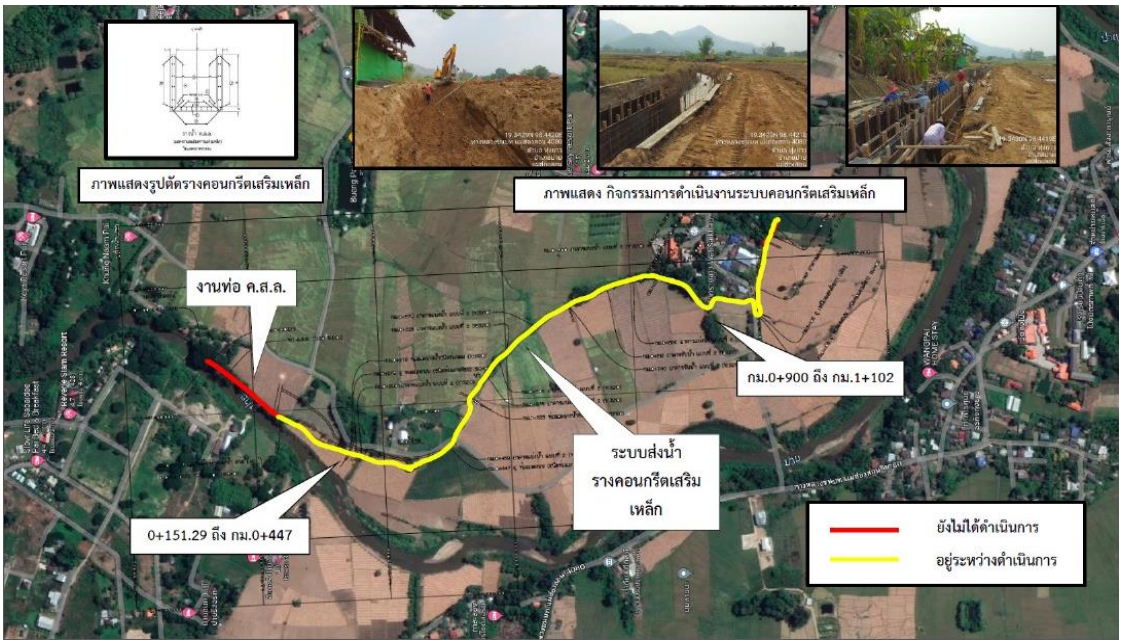

*ผคส.๑ เน้นย้ำการป้องกันบ่อก่อสร้างในช่วงฤดูน้ำหลากเนื่องจากแม่น้ำปายน้ำค่อนข้างเยอะ

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑

นายสิทธิชัย ชัยวิรัชรายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมายแทน กส.๑ชป.๑ ดังนี้

งานก่อสร้างในความรับผิดชอบ


ประตูระบายน้ำดงมะปินหวาน

- ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ๘๗.๒๒%
  ดำเนินการเอง ๙๒.๒๘% จ้างเหมา ๖๓.๗๗%
- งานโครงสร้างหลักแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้วคงค้าง งานบันไดซ่อมบำรุงฝั่งขวา ป้ายโครงการ และการเก็บรายละเอียดงานต่างๆ
- งานจ้างเหมาค้างติดตั้งบานระบายและคันยก

*ผคส.๑ เน้นย้ำให้เร่งติดตามงานจ้างให้แล้วเสร็จก่อนถึงฤดูน้ำหลาก

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



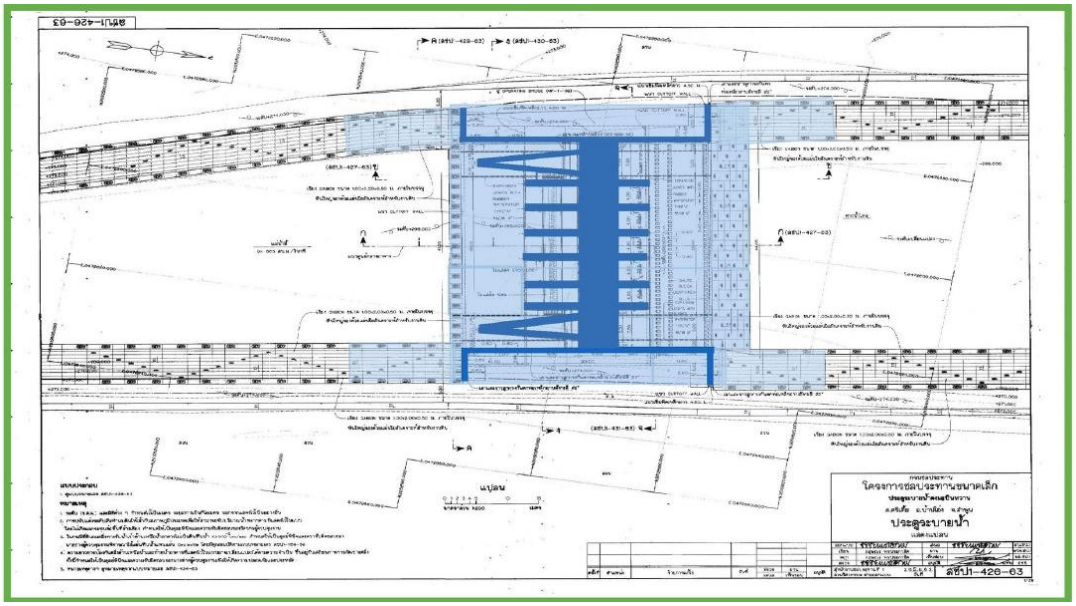

ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวาอาคารบังคับน้ำเหมืองจี้

- ผลงานความก้าวหน้า ๘๔.๕๖%
- งานคอนกรีตดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คงค้างงานบดอัดดินด้วยแรงคน และอาคารประกอบ ท่อส่งน้ำ ๑ แห่ง อาคารรับน้ำ ๑ แห่ง และเก็บรายละเอียดงาน


ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



ปรับปรุงช่องระบายทรายฝายทุ่งโปร่ง

- ผลงานความก้าวหน้า ๕๐%
- อยู่ระหว่างการดำเนินงานเจาะติดตั้งPlate เหล็ก

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน

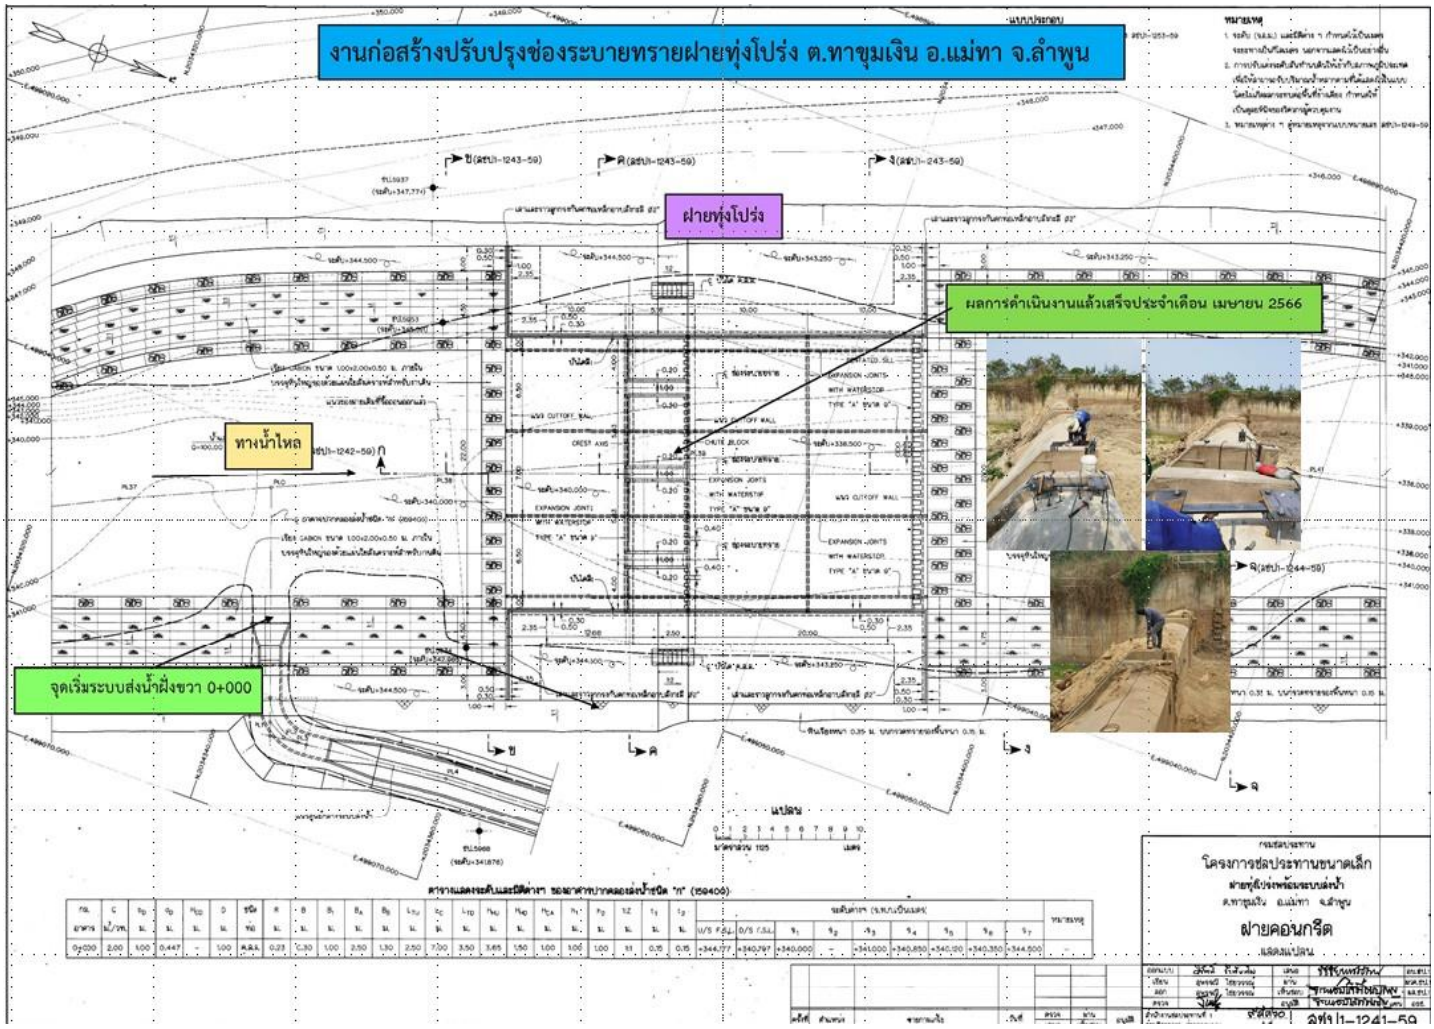


ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒


กส.๒ชป.๑ รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

ฝายนาปางแยพร้อมระบบส่งน้ำ

- ผลงานความก้าวหน้า ๗๑.๒๒%
- ตัวฝายดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือรางระบบส่งน้ำดำเนินการแล้ว ๓๔%
- อาคารป้องกันตลิ่ง ดำเนินการแล้ว ๕๘%
- คาดว่าแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน

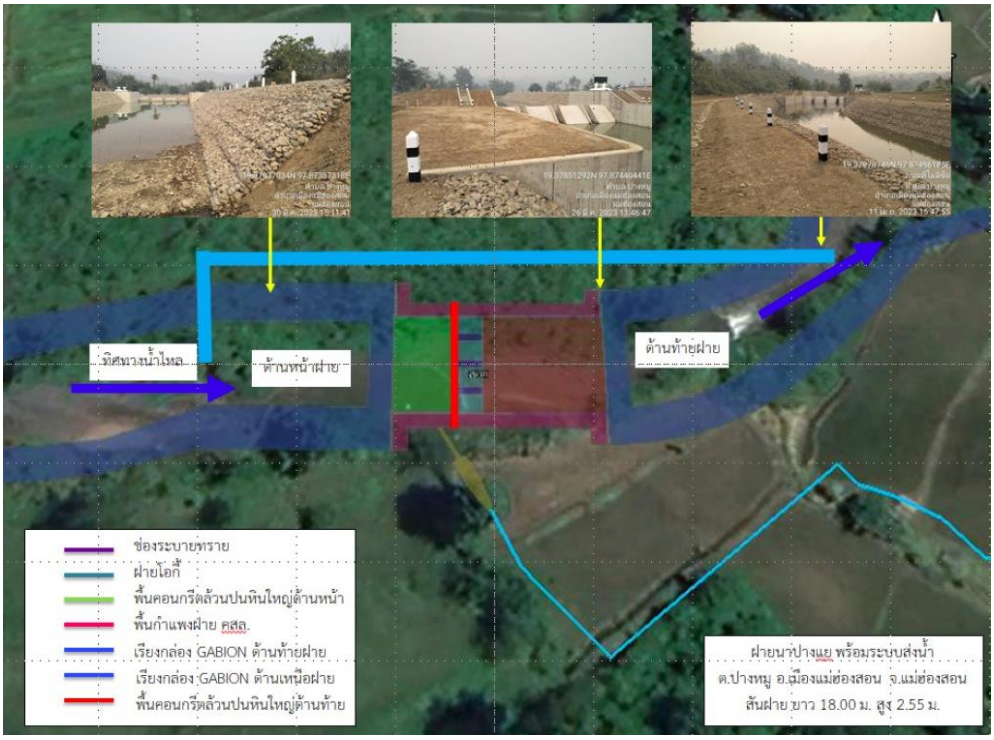

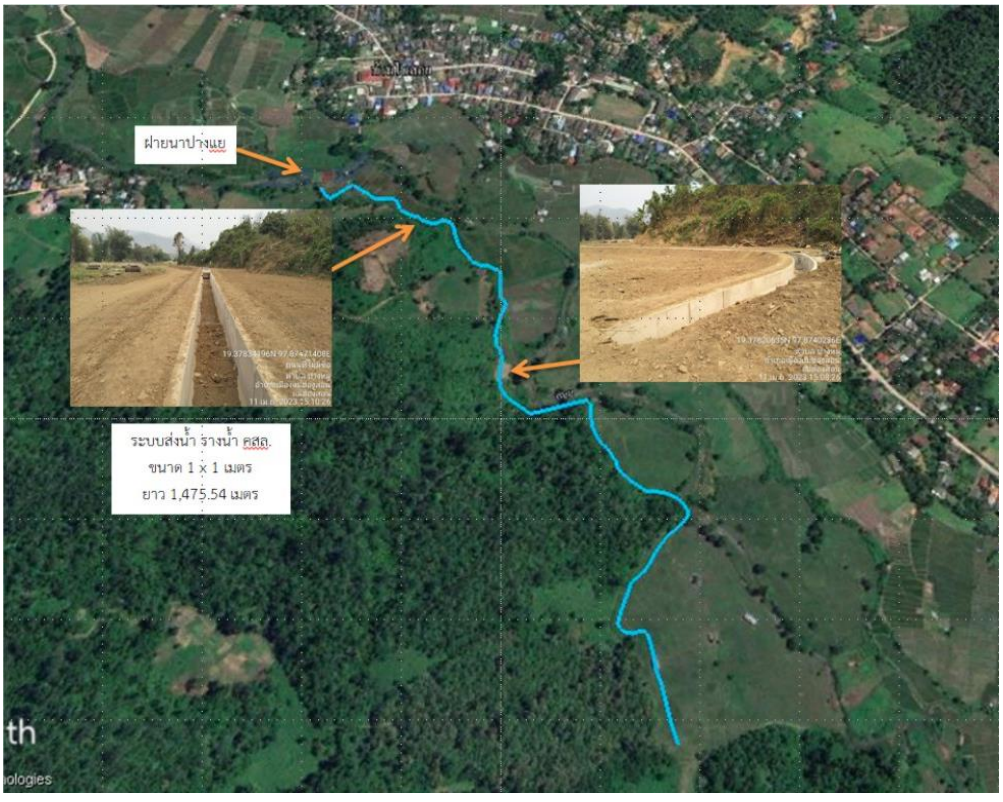

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

กส.๓ชป.๑ รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน(ระยะสุดท้าย)

- ผลงานความก้าวหน้า ๖๔.๑๗%
- ผลงานต่ำกว่าแผน ๑.๖% เนื่องจากงานบางส่วนเข้าไปในพื้นที่ของสวนส้มการลำเลียงวัสดุเพื่อการดำเนินการก่อสร้างจึงลำบากกว่าปกติ เบื้องต้นได้ทำการเพิ่มกำลังการก่อสร้างเพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันตามแผน
- งานคอนกรีตดำเนินการไปแล้ว ๙๐๐ เมตร คงค้างอีกประมาณ ๕๐๐ เมตร
- คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม


ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



ระบบส่งน้ำฝายมะขามป้อม

- ปัจจุบันดำเนินการแล้ว ๒,๘๐๐ เมตร จากทั้งหมด ๔,๘๐๐ เมตร
- ผลการดำเนินงาน ๖๘.๔๓%
- คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม

ภาพความก้าวหน้างาน

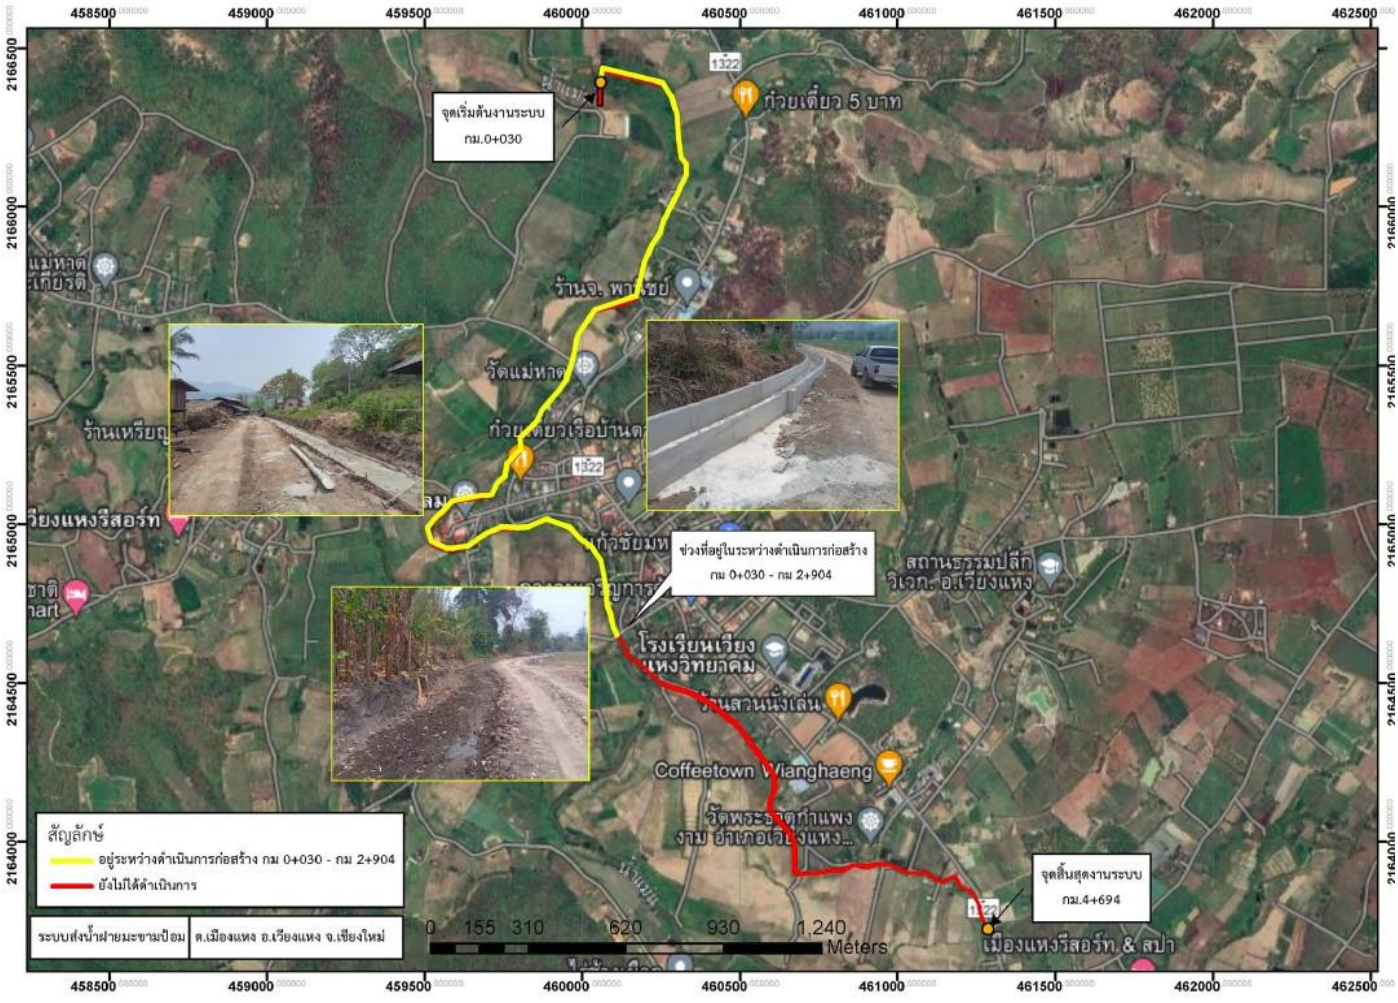

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๔

นายจักรกริช ซ่อนกลิ่น รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมายแทน กส.๔ชป.๑ ดังนี้

ฝายห้วยแม่หลักหมื่น ลูกที่ ๑

- งานระบบดำเนินการเทพื้นและผนังแล้ว ๒,๔๐๐ เมตรเหลืออีกประมาณ ๑๒๐ เมตร
- ตัวฝายอยู่ระหว่างดำเนินการตัวผนังช่วงกลางฝาย
- ผลงานความก้าวหน้า ๖๗.๙๘%
- คาดว่าแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณเดือน กรกฎาคม

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน





ฝ่ายบริหารทั่วไป

บท.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
รายงานสรุปผลการเบิก-จ่าย งาน/ปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน เมษายน 2566
รายงาน ณ งวดวันที่ 24-27 เมษายน 2566

(เบิกจ่ายจริงตามรายงานของงานการเงินและบัญชี สั่งให้ หน่วยเบิกจ่าย)

รายการ	เงินจัดสรร ง.241 (1)	ข้อผูกพัน/สัญญา (2)	รวมเบิกงวดก่อน (3)	รวมเบิกงวดนี้ (4)	รวมเบิกทั้งสิ้น (3) + (4)	% เบิกจ่าย	คงเหลือ งปม. (1)-(2)-(3)-(4)
งบดำเนินงาน ปี 2566							
หมวด 300 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	24,900.00	24,900.00	-	24,900.00	49.80	200.00
หมวด 300 (ไฟฟ้า)	13,400.00	-	13,400.00	-	13,400.00	100.00	-
	-	-	-	-	-		-
หมวด 450 ค่าสาธารณูปโภค	213,681.00	-	213,679.65	-	213,679.65	100.00	1.35
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
รวมหมวด 300 , 450	277,081.00	24,900.00	251,979.65	-	251,979.65	90.94	201.35

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
รายงานสรุปผลการเบิก-จ่าย งาน/ปีงบประมาณ 2565 *(เงินกันเหลื่อมปี)*
ประจำเดือน เมษายน 2566
รายงาน ณ งวดวันที่ 24-27 เมษายน 2566

(เบิกจ่ายจริงตามรายงานของงานการเงินและบัญชี สั่งให้ หน่วยเบิกจ่าย)

รายการ	เงินจัดสรร ง.241 (1)	ข้อผูกพัน กันแบบ(PO,CK) (2)	รวมเบิกงวดก่อน (3)	รวมเบิกงวดนี้ (4)	เบิก % งวดนี้	รวมเบิกทั้งสิ้น (3) + (4)	รวม % เบิกจ่าย	คงเหลือ งปม. กันแบบ CK (1)-(2)-(3)-(4)
เงินกันเหลื่อมปี 2565								
1.ฝ่ายเก็บน้ำบ้านจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ ต	29,542,115.09	9,811,911.80	18,184,385.66	114,975.00	0.39	18,299,360.66	61.96	1,430,842.63
(ระยะที่ 2) อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่	-							
2.อาคารบังคับน้ำเหมืองขี้ ต	363,428.80	-	363,428.80	-	-	363,428.80	100.00	-
จ.ลำพูน จ	6,450,000.00	-	6,450,000.00	-		6,450,000.00	100.00	-
3.ประตูระบายน้ำคลองแป้นหวาน ต	1,702,303.83	50,319.40	1,519,290.53	-	-	1,519,290.53	89.25	132,693.90
จ.ลำพูน จ	6,450,000.00	6,450,000.00			-		-	-
4.ฝ่ายบางปายพร้อมระบบส่งน้ำ ต	754,728.70	-	754,728.70	-	-	754,728.70	100.00	-
จ.แม่ฮ่องสอน จ	1,691,896.19	-	1,691,896.19	-	-	1,691,896.19	100.00	-
รวมงานดำเนินการเอง	32,362,576.42	9,862,231.20	20,821,833.69	114,975.00	0.36	20,936,808.69	64.69	1,563,536.53
รวมงานจ้างเหมา	14,591,896.19	6,450,000.00	8,141,896.19	-	-	8,141,896.19	55.80	-
รวมเงินทั้งสิ้น	46,954,472.61	16,312,231.20	28,963,729.88	114,975.00	0.24	29,078,704.88	61.93	1,563,536.53

หมายเหตุ

1.ฝ่ายเก็บน้ำบ้านจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายในปี 65 ไปแล้ว = 3,591,184.93

2.อาคารบังคับน้ำเหมืองขี้ เบิกจ่ายในปี 65 ไปแล้ว = 39,233,502.99 + จ้างจัดหาเข็มพืดฯ= 4,838,520

3.ประตูระบายน้ำคลองแป้นหวาน เบิกจ่ายในปี 65 ไปแล้ว = 38,761,365.38 +จ้างจัดหาเข็มพืดฯ = 3,301,800

4.ฝ่ายบางปายพร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายในปี 65 ไปแล้ว =31,404,117.89 + งานจ้างงวดที่1 เบิกไปแล้ว = 1,170,827.50

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1

รายงานสรุปผลการเบิก-จ่าย งานปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน เมษายน 2566

รายงาน ณ งวดวันที่ 24-27 เมษายน 2566

(เบิกจ่ายจริงตามรายงานของงานการเงินและบัญชี สั่งให้ หน่วยเบิกจ่าย)

รายการ		เงินจัดสรร จ.241 (1)	ข้อผูกพัน (2)	รวมเบิกงวดก่อน (3)	รวมเบิกงวดนี้ (4)	เบิก % งวดนี้	รวมเบิกทั้งสิ้น (3) + (4)	รวม % เบิกจ่าย	คงเหลือ สปม. (1)-(2)-(3)-(4)
งานปีงบประมาณ 2566									
1.ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายต่างๆ	ค	373,899.58	-	373,899.58	-	-	373,899.58	100.00	0.00
2.ซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุและคลังน้ำมัน	ค	287,105.70	-	287,105.70	-	-	287,105.70	100.00	0.00
3.ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักระดับ 3-4,5-6)	ค	430,164.03	-	430,164.03	-	-	430,164.03	100.00	0.00
4.ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว	ค	479,895.15	-	479,895.15	-	-	479,895.15	100.00	0.00
									-
5.ฝายหัวงานแม่พลิกหมื่น ลูกที่ 1 จ.เชียงใหม่	ค	36,807,938.80	3,392,446.80	28,332,655.95	35,017.00	0.10	28,367,672.95	77.07	5,047,819.05
6.ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน (ระยะสุดท้าย) จ.เชียงใหม่	ค	13,097,801.29	537,161.00	9,766,728.72	-	-	9,766,728.72	74.57	2,793,911.57
7.ระบบส่งน้ำฝายแม่ขามป้อม จ.เชียงใหม่	ค	38,889,659.52	2,563,291.90	27,274,182.90	16,500.00	0.06	27,290,682.90	70.17	9,035,684.72
									-
8.ฝายลำนักองข่อการเกษตร(วัดแม่ชัก) จ.แม่ฮ่องสอน	ค	43,675,665.15	7,585,660.00	27,548,778.11	101,535.00	0.23	27,650,313.11	63.31	8,439,692.04
9.ฝายขาป่างอยพร้อมระบบส่งน้ำ จ.แม่ฮ่องสอน	ค	32,091,247.53	1,771,387.90	27,249,109.46	-	-	27,249,109.46	84.93	3,070,750.17
10.ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา อาคารบังคับน้ำเหมืองจี้ จ.น่าน	ค	36,603,799.04	904,323.80	30,360,737.22	1,785,797.76	4.88	32,146,534.98	87.82	3,552,940.26
11.บำรุงรักษาหัวงานโครงการก่อสร้าง จ.เชียงใหม่	ค	44,793.90	-	44,793.90	-	-	44,793.90	100.00	0.00
		-	-	-			-		-
12.โรงซ่อมบำรุงชนาคกลาง-	ค	90,825.00	13,960.00	30,240.00	-		30,240.00	33.29	46,625.00
โครงการก่อสร้าง อชป.1 จ.เชียงใหม่	จ	5,190,000.00	5,190,000.00	-	-		-		-
13.ปรับปรุงช่องระบายทราย ฝายทุ่งโป่ง จ.น่าน	ค	989,800.00	57,740.70	838,292.86	-		838,292.86	84.69	93,766.44
รวมงานดำเนินการเอง		203,862,594.69	16,825,972.10	153,016,583.58	1,938,849.76	0.95	154,955,433.34	76.01	32,081,189.25
รวมงานจ้างเหมา		5,190,000.00	5,190,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมเงินทั้งสิ้น		209,052,594.69	22,015,972.10	153,016,583.58	1,938,849.76	0.93	154,955,433.34	74.12	32,081,189.25

พด.คส.๑ รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมายแทน ดังนี้

ลำดับที่	เลขที่	รายการ	เชิญชวน	ยื่นซอง	เดช	ประก	ทรณ์ 7	ทำสัญญา	วดส่งมอบ	ครบสัญญา	PO		คกก ตรวจรับ	คกก ตรวจงานเอง
1	จ.17	จ้างจัดทำบานระบาย	พงษ์ไพศาล					17 พค 65			ขยายเบิกจ่าย	สั่งชะลอ11 ตค65	ชยุต	สิทธิโชค
		พร้อมเครื่องกว้าน	6,450,000.00					180 วัน		6,450,000.00		รับทราบ 17 ตค	สิทธิชัย	อัครพงษ์
		ดงมะปิน										แจ้งปรับ 14 พย	วราวิทย์	ธนิต
											สั่งเข้า 27 มีค รอห้างตลดค่าปรับ			

ลำดับที่	เลขที่	รายการ	เชิญชวน	ยื่นซอง	เปิดซอง	อนุมัติ/ประกาศผู้ชนะ	รออุทรณ์ 7 วัน	ทำสัญญา	ครบสัญญา	PO	ค้าง
1	ค.จ.01/65	จ้างจัดหาท่อส่งน้ำและ	14 ต.ค 64	20 ต.ค 64	21 ต.ค 64	27 ต.ค 64	4 พ.ย 64	17 มค 65	15 สค 65	18 กค 65	
	14 ต.ค 24	ตะแกรงกันสวะพร้อมติดตั้ง	2,502,000	08.30-16.30	10.00			210 วัน	เบิกจ่ายครั้งที่ 1 50%		
		(2รายการ) 2,505,294.94	หจก.ชม.เอกพัฒน์						8 กค 65 = 1,251,000		
		(วัดจันทร์)							เบิกจ่ายครั้งที่ 2 30%		
									เบิกจ่ายครั้งที่ 3 20%		
									8 กค 65 = 1,251,000		
2	คจ.06/65	จ้างงานดิน (วัดจันทร์)	ชม.ศรีสุนทร			365 วัน		21 พย 64	5 พย 65	7 มค 65	
	2 พย 64		7,300,000.00						ง.1 5 มค 65	ส่งการเงิน	
									1,113,700.00	6 พค 65	
									ง.2 18 มีค 65	ส่งการเงิน	
									2,234,040.00	6 พค 65	
									ง.3 18 เมย 65	ส่งการเงิน	
									609,530.40	6 พค 65	
									ง.4 19 กย 65	ส่งการเงิน	
									3,342,726.60	22 กย 65	
3	ค.จ.02/65	จ้างก่อสร้างงานดิน	26 ต.ค 64	2 พ.ย 64	3 พ.ย 64	8 พ.ย 64	16 พย 64	6 มค 65	7 มค 66		
	26 ต.ค 64	(1รายการ) 1,818,007.50	ชม.S.P.S	08.30-16.30	10.00	360 วัน			ง.1 17 มิย 65	24 มิย 65	
		(แม่แจ่มฝั่งขวา)							905,064.42		
									ง.2 12 กย 65	15 กย 65	
									912,943.08		
4	ค.จ.03/65	จ้างก่อสร้างงานดิน	28 ต.ค 64	3 พ.ย 64	4 พ.ย 64	9 พ.ย 64	17 พย 64	6 มค 65	9 กย 65		
	28ต.ค 64	(1รายการ) 1,558,734.52	โชล่าร์	08.30-16.30	13.30	240 วัน			ง.1 1 มิย 65	23 มิย 65	
	เงินมาแล้ว	(แม่หาร)							795,701.79		
									ง.2 9 กย 65	16 กย 65	
									763,032.73		

5	ค.จ.04/65	จ้างก่อสร้างงานดิน	10 พ.ย 64	16 พ.ย 64	17 พ.ย 64	19 พ.ย 64	2 ธค 64	11 มค 65	12 สค 65	19 กย 65		
	10 พ.ย 64	(1รายการ) 2,052,500	ปางมะผ้า	08.30-16.30	10.00	210 วัน			ง.1 15 สค 65			
		(สอตือ)							2,052,500			
6	ค.จ.05/65	จ้างก่อสร้างงานดิน	10 พ.ย 64	16 พ.ย 64	17 พ.ย 64	19 พ.ย 64	2 ธค 64	11 มค 65	15 สค 65			
	10 พ.ย 64	(1รายการ) 2,862,723.69	ปางมะผ้า	08.30-16.30	10.00	210 วัน			ง.1 26 พค 65	24 มิย 65		
		(นาตกป่าย)							1,170,827.50			
							รอการตรวจรับ	15 สค 65	ง.2 1691896.19			กันเงิน PO
7	ค.จ.06/65	จ้างก่อสร้างงานดิน	23 พ.ย 64	30 พ.ย 64	1 ธค 64	7 ธค 64	16 ธค 64	18 มค 65	22 สค 65	2 มิย 65		
	23 พ.ย 64	(1รายการ) 3,765,000	เมืชชา 3,755,365.19	13.00-15.00	14.00	210 วัน			ง.1 17 พค 65			
		(ปกต เหมืองชี้)							1,496,066.16			
									ง.2 19 สค 65	1 กย 65		
									2,259,299.03			
8	ค.จ.07/65	จ้างงานดิน	ชม sps			2 พ.ย 64		6 มค 65	5 พค 65	2 มิย 65		
		ดินธาตุ 481,021	481,021.00			360 วัน			481,021.00			
9		จ้างเข็มพืด	ยู พี เอ เอ็นเตอร์ไพรซ์			7 ธค 65		25 มค 65	8 มีค 65	8 เมย 65		
		ดงมะปิน 3,462,691.2	3,301,800.00			60 วัน			3,301,800.00			
10	EB	จ้างเข็มพืด	ยู พี เอ เอ็นเตอร์ไพรซ์	30 มค 65		7 มค 65		8 กพ 65	18 มีค 65	8 เมย 65		
		อมจ 5,166,302.40	4,838,520.00					60 วัน	4,838,520.00			
11	จ.17	จ้างจัดทำบานระบาย	พงษ์ไพศาล					17 พค 65	13 พย 65			กันเงิน PO
		พร้อมเครื่องกว้าน	6,450,000.00					180 วัน	6,450,000.00			
		ดงมะปิน										
12	จ.18	จ้างทำบานระบาย	พงษ์ไพศาล					17 พค 65	13 พย 65			กันเงิน PO
		พร้อมเครื่องกว้าน	6,450,000.00					180 วัน	6,450,000.00			

ลำดับ	รายการ	เลขที่	ราคากลาง	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	รายงานขอซื้อ/จ้าง	ประกาศ /ขาย	ยื่นเสนอราคา	ปิดซอ	อนุมัติ	รออุทธรณ์	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอบ	งวดส่งมอบ	ส่งมอบ	ผลเทส	PO
วค	โครงการจัดหาน้ำแบับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่																	
1	หญ้า	609 ซ.		ทิพพสาร	114,975.00	114,975.00	23 สค 65				25 สค 65		26 สค 65	240 วัน	23 เมย 66	23 เมย 66		24 เมย 66
2	จ้างงานดิน	EB จ.05		สิริภูมิ	11,108,973.00	7,400,000.00		2-9 กย 65	12 กย 65		19 กย 65		20 ตค 65	360 วัน	4 พย65 - 29 ตค 66		22 กพ 66	ขยายเบิกจ่าย
3	จ้างจัดหาและติดตั้งวัตพฤติกรรมเชื่อน	EB จ.06		ยีโอเทค	2,297,600.00	2,296,900.00		5-12 กย 65	13 กย 65		19 กย 65		16 มีค 66	180 วัน	50,30,20%	50% 25 เมย 66		1 พค 66
														12 กย 66				
4	น้ำมันดีเซล B7	266 ซ.		สุชุม	101,051.80	101,051.80	20 เมย 66				20 เมย 66		20 เมย 66		20 เมย 66			1 พค 66
					13,521,548.00	9,811,875.00												

ลำดับ	รายการ	ประกาศแผน	เลขที่	ราคากลาง	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	ยงงานขอซื้อ/จ้	TOR	ประกาศ/ขาย	ยื่นเสนอราคา	โหลด/เปิด	อนุมัติ	รออุทธรณ์	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอ	งวดส่งมอบ	PO
	โรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 (รบก.)								12-19 ตค									
1	จ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง	3 สค 65	02 จ.		บ้านสล่า	5,413,000.00	5,190,000.00		19-25 ตค	26-9 พย	10 พย 65	11 พย 65	14 พย 65	22 พย 65	22 ธค 65	300 วัน	30 ธค 65 -25 ตค 66	
									ปรับปรุง									

ลำดับ	รายการ	ภาค	เลขที่	ภา	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	เขยอ	TOR	ภาค	/แผนอรา	คดเอก	อนุมัติ	รออุทธรณ์	สนอง	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอบ	งวดส่งมอบ	เร่งส่งมอบ	ผลเทส	รมาส	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	PO
วศ	ฝายลำนักสงฆ์ธรรมนิยม (วัดนะชัก) พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 610 ไร่ ต. แม่ปี๋ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน																							
1	หินใหญ่ก้องน้ำ คก. 15-30 ซม.3720 ลบม		55 ข.	"	ป่างมะผ้า	3,013,200.00	5,905,800.00	28ตค-	2	7 พย	18 พย 65	พย 6	24 พย 65	2 ธค 65	5 ธค 65	8 ธค 65	300 วัน	ค1 15ธค-11มค66	13 ธค 65			960,000		18 มค 66
	หินใหญ่ละคก. 15-30 ซม.820 ลบม				ข.27	856,080.00												ค2 6 กพ-21 เมย 66		รอผล		1,918,600.00		
	กรวด เบอร์ 2 3230 ลบม.					3,003,900.00												ค3						
	ทรายหยาบ 2966 ลบม					2,346,106.00																		
2	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค		56 ข.	"	ไทย่า	4,621,712.00	4,546,358.00		31	ตค	4 กย 65	พย 6	9 พย 65	17 พย 65	18 พย 65	23 พย 65	300 วัน	ค1 25 พย-6ธค65	ครบ 19 เมย 65			832,600.00		24 มค 66
					ข.17													ค2 9-13 มค 66				868,800.00		6 กพ 66
																		ค3 6-20 กพ 66					760,200.00	18 เมย 66
																		ค4 3 เมย 66					760,200.00	21 เมย 66
																		ค5 7-21 เมย66		รอผล				
																		ค6						
3	กล่องลวดตาข่ายชนิด Gabion		57 ข.	"	วรรณอาร	2,539,125.00	2,918,190.00		7-14	พ	15 พย 65	พย	23 พย 65	1 ธค 65		6 ธค 65	120 ว 4/4		ครบ 5 เมย66					
	แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน				ข.25	579,975.00											ง.1 30 ว	5 มค 66	14 ธค 65			730,060.00		2 กพ 66
																	ง.2 30 ว	4 กพ 66	1 กพ 66			729,670.00		6 กพ 66
																	ง.3 30 ว	1 มีค 66		22 กพ 66		729,670.00		7 มีค 66
																	ง.4 30 ว	3 เมย 66		22 กพ 66			728,790.00	4 เมย 66
4	วัสดุในการจัดทำตระแกรงกันสวะ		129 ข.		เสมัยชา	16,197.00	15,888.83	28 พย 65								รออกใบสั่ง	5 วันทำการ							
5	วัสดุในการจัดทำบานระบายพร้อมเครื่องยก		61 ข.		เสมัยชา	74,446.00		27 ตค 65					31 ตค 65			รออกใบสั่ง	5 วันทำการ							
6	น้ำมันดีเซล B7 (สำนัก)		234 ข.		สุขุม	140,520.00	140,520.00	มีค 66								20 มีค 66	1 วันทำการ	20 มีค 66					140,520.00	3 เมย 66
7	น้ำมันดีเซล B7		238 ข.		สุขุม	138,520.00	138,520.00	27 มีค 66					27 มีค 66			27 มีค 66	1 วันทำการ	27 มีค 66					138,520.00	5 เมย 66
8	เบ็ดเตล็ด 4		241 ข.		กิตติ	413,367.00	413,367.00	มีค 66					29 มีค 66			29 มีค 66	5 วันทำการ	31 มีค 66					413,367.00	4 เมย 66
9	น้ำมันไฮดรอลิค (สำนัก)		244 ข.		สุขุม	54,960.00	54,960.00	มีค 66					30 มีค 66			30 มีค 66	5 วันทำการ	3 เมย 66						18 เมย 66
10	น้ำมันดีเซล B7		246 ข.		สุขุม	103,890.00	103,890.00	มีค 66					29 มีค 66			29 มีค 66	5 วันทำการ	29 มีค 66					103,890.00	7 เมย 66
11	น้ำกลั่นและอื่นๆ		249 ข.		สุขุม	3,419.00	3,419.00	มีค 66					3 เมย 66			3 เมย 66	5 วันทำการ	4 เมย 66					3,419.00	7 เมย 66
12	น้ำมันดีเซล (สำนัก)		254 ข.		สุขุม	120,858.70	120,858.70	เมย 66					5 เมย 66			5 เมย 66	1 วันทำการ	5 เมย 66					120,858.70	19 เมย 66
13	เฟืองทองเหลืองและอื่นๆ (สำนัก)		256 ข.		สันป่าข่อย	203,220.00	203,220.00	เมย 66					7 เมย 66			7 เมย 66	5 วันทำการ	19 เมย 66						1 พค 66
14	เฟืองเกียร์และอื่นๆ (สำนัก)		257 ข.		อนุพงษ์	19,993.00	19,993.00	เมย 66					7 เมย 66			7 เมย 66	5 วันทำการ	18 เมย 66						1 พค 66
15	กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ		259 ข.		ต.รุ่งทรัพย์	101,535.00	101,535.00	เมย 66					18 เมย 66			18 เมย 66	5 วันทำการ	20 เมย 66						21 เมย 66
16	แผ่นคลัทช์และอื่นๆ (สำนัก)					89,975.00	รออก RQ 28 เมย 66																	
17	อะไหล่รถผสมคอนกรีต					86,843.00	รออก RQ 3 พค 66																	
18	อะไหล่รถยนต์					8,215.00	รออก RQ 23 พค 66																	
						18,536,056.70	14,686,519.53														0.00	6,769,400.00	3,169,764.70	

ลำดับ	รายการ	ประกาศแผน	เลขที่	ภา	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	งานขอซื้อ	TOR	ภาค	/แผนอรา	ลด/ปฏิ	มีอนุมัติ	รออุทธรณ์	สนองรับ	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอบ	งวดส่งมอบ	เร่งส่งมอบ	ผลเทส	รมาส	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	PO
กส 1	ระบบส่งน้ำคลองหายใหญ่ฝั่งขวาอาคารบังคับน้ำเหมืองจี้ พื้นที่ชลประทาน 2,400 ไร่ ต. เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน (ร.อมจ.)																							
1	วัสดุในการจัดทำท่อส่งน้ำเข้านา		27 ข.		อนุพงษ์	2,539.99	2,539.99	5 ตค 65					7 ตค 65			รออกใบสั่ง	5 วันทำการ							
2	วัสดุในการจัดทำบานระบายพร้อมเครื่องยก		29 ข.		อนุพงษ์	6,838.00	6,837.68	5 ตค 65					7 ตค 65			รออกใบสั่ง	5 วันทำการ							
3	เฟืองท้ายและอื่นๆ (สำนัก)		235 ข.		สันป่าข่อย	166,158.00	166,158.00	20 มีค 66					22 มีค 66			22 มีค 66	5 วันทำการ	27 มีค 66					166,158.00	4 เมย 66
4	จ้างซ่อมรถยนต์		26 จ.		สินธุวา	84,600.00	84,600.00	21 มีค 66					23 มีค 66			23 มีค 66	5 วันทำการ	27 มีค 66					84,600.00	4 เมย 66
5	น้ำมันดีเซล B7 (สำนัก)		243 ข.		สุขุม	118,193.60	118,193.60	28 มีค 66					28 มีค 66			28 มีค 66	1 วันทำการ	28 มีค 66					118,193.60	5 เมย 66
6	น้ำมันดีเซล B7		264 ข.		สุขุม	79,101.00	79,101.00	9 เมย 66					19 เมย 66			19 เมย 66	1 วันทำการ	19 เมย 66						1 พค 66
7	กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ		268 ข.		เบสท์คอม	88,528.00		20 เมย 66					24 เมย 66			24 เมย 66	5 วันทำการ	26 เมย 66						3 พค 66
8	เบ็ดเตล็ด 5		272 ข.		ต.รุ่งทรัพ	311,071.00		24 เมย 66					26 เมย 66			26 เมย 66	5 วันทำการ	28 เมย 66						3 พค 66
9	shaft และอื่นๆ (สำนัก)					149,980.00	รออก RQ 25 เมย 66																	
10	อะไหล่รถยนต์					24,312.00	รออก RQ 28 เมย 66																	
11	อะไหล่รถยนต์ (ยาง)					72,000.00	รออก RQ 15 พค 66																	
						1,103,321.59	457,430.27														0.00	0.00	368,951.60	

ลำดับ	รายการ	ะกาศแผ	เลขที่	ภาคก	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	เขยอ	TOR	ภาค	/แผนอรา	โหลด/เปิด	อนุมัติ	รออุทธรณ์	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอบ	งวดส่งมอบ	เร่งส่งมอบ	ผลเทส	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	po
กส2	ฝายนาป่างแย พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 130 ไร่ ต. ป่างหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน																						
1	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค		73 ข.	"	กิตติ	1,957,437.00	1,945,990.00		1-	8 พย	8 พย 65	9 พย 65	14 พย 65	22 พย 65	30 พย 65	300 วัน ค.1	6-13 ธค 65				204,000.00		2 กพ 66
					ข.18											ค.2	20ธค65-14 มีค 27 มีค 66				884,000.00		3 เมย 66
																ค3	21 มีค-13 มิย สุดท้าย				857,990.00		
2	สินค้าคงคลัง		154 ข.		กิตติ	25,200.00	25,200.00	ธค 65					14 ธค 65		รออกใบสั่ง								
3	วัสดุในการจัดทำบานระบายพร้อมเครื่องยก		153 ข.		กิตติ	31,394.00		9 ธค 65					14 ธค 65		รออกใบสั่ง								
4	น้ำมันไฮดรอลิคและอื่นๆ		236 ข.		สุขุม	69,986.00	69,986.00	มีค 66					23 มีค 66		23 มีค 66		27 มีค 66					69,986.00	3 เมย 66
5	อะไหล่รถยนต์		237 ข.		อนุพงษ์	30,190.00	30,190.00	มีค 66					23 มีค 66		23 มีค 66		27 มีค 66					30,190.00	3 เมย 66
6	อะไหล่รถยนต์		240 ข.		อนุพงษ์	30,410.00	30,410.00	มีค 66					29 มีค 66		29 มีค 66		30 มีค 66					30,410.00	4 เมย 66
7	น้ำมันดีเซล B7		242 ข.		สุขุม	104,520.00	104,520.00	8 มีค 66					28 มีค 66		28 มีค 66		28 มีค 66					104,520.00	5 เมย 66
8	เฟืองทองเหลืองและอื่นๆ(สำนัก)		245 ข.		สันป่าข่อย	275,888.00	275,888.00	มีค 66					30 มีค 66		30 มีค 66		5 เมย 66						18 เมย 66
9	เบ็ดเตล็ด 3		251 ข.		ทิพพสาร	499,966.00	499,966.00	มีค 66					3 เมย 66		3 เมย 66		10 เมย 66						18 เมย 66
10	ปากกาเขียนไวท์บอร์ดและอื่นๆ		252 ข.		ทิพพสาร	121,915.00	121,915.00	มีค 66					4 เมย 66		4 เมย 66		10 เมย 66						18 เมย 66
11	จ้างซ่อมรถยนต์		27 จ.		อนุพงษ์	17,200.00	17,200.00	มีค 66					4 เมย 66		4 เมย 66		7 เมย 66						18 เมย 66
12	เฟืองเกียร์และอื่นๆ (สำนัก)		255 ข.		อนุพงษ์	29,966.00	29,966.00	เมย 66					7 เมย 66		7 เมย 66		18 เมย 66						1 พค 66
13	อะไหล่รถยนต์		261 ข.		สินธุวา	76,251.00	18 เมย 66						20 เมย 66		20 เมย 66		25 เมย 66						3 พค 66
14	จ้างซ่อมรถยนต์		29 จ.		สินธุวา	50,000.00	18 เมย 66						20 เมย 66		20 เมย 66		25 เมย 66						3 พค 66
15	น้ำมันดีเซล B7		270 ข.		สุขุม	51,510.00	21 เมย 66						21 เมย 66		21 เมย 66		21 เมย 66						1 พค 66
16	ก้านกระทุ้งวาล์วและอื่นๆ (สำนัก)					99,988.00	รออก RQ 28 เมย 66																	
17	อะไหล่รถยนต์					64,035.00	รออก RQ 26 พค 66																	
						3,535,856.00	3,151,231.00														1,945,990.00	235,106.00	

ลำดับ	รายการ	ภาค	เลขที่	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	ขอซื้อ	ภาค	ขอ	ค/อนุมัติ	อุทธร	สนอง	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอบ	งวดส่งมอบ	วงเงิน	เร่งส่ง	ผลเทสต์	ไตรมาส1/36	ไตรมาส2	ไตรมาส3	PO
กส.3	ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน(ระยะสุดท้าย)พื้นที่ชลประทาน 140 ไร่ ต. ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ร.ฝบล.)																					
1	อะไหล่รถยนต์		253 ช.	กิตติ	76,831.00		31 มีค 66			4เมย 66			4เมย 66		7 เมย 66							18 เมย 66
2	น้ำมันดีเซล B7,น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91(บร.)		267 ช.	สุขุม	113,143.60		20 เมย 66			20 เมย 66			20 เมย 66		20 เมย 66							1 พค 66
					76,831.00																	

ลำดับ	รายการ	ภา	เลขที่	ตาก	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	ขอซื้อ	TOR	ประกาศ /ขาย	ยื่นเสนอราคา	โหลดเอกสาร	อนุมัติ	รอพุทธรณ์	สนอง	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอบ	งวดส่งมอบ	เร่งส่งมอบ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	PO
กส.3	ระบบส่งน้ำฝายนะขามป้อม พื้นที่ชลประทาน 950 ไร่ ต. เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ (ร.มชป.)																					
1	ปุ๋ยฟีเมนต์ไฮดรอลิค		ค02/66		CPS	3,227,563.00	3,202,811.75	2 ตค 65		12 ตค 65	20 ตค 65	21 ตค 65	25 ตค 65	2 พย 65	3 พย 65	7 พย 65	300 วัน	ค.1 19 ม.ค66			630,825.00	24 มค 66
					ช.08													ค.2 14ก.พ66			630,825.00	17 กพ 66
																		ค3 29 มีค 66			630,825.00	3 เมย 66
																		ค4 3 เมย - 9 พค 66				
5	ดินถมที่		13 ช.		SPS	486,850.00	486,850.00	9 กย 65					21 กย 65			รอออกใบสั่	120 วัน	15 วัน 8 ง				
6	อะไหล่รถยนต์		260 ช.		สันป่าข่อย	29,030.00	29,030.00	7 เมย 66					18 เมย 66			18 เมย 66		24 เมย 66				3 พค 66
7	จ้างซ่อมรถยนต์		28 จ.		บิ๊ง	16,500.00	16,500.00	7 เมย 66					18 เมย 66			18 เมย 66		24 เมย 66				3 พค 66
8	น้ำมันดีเซล B7		269 ช.		สุขุม	91,806.00	91,806.00	1 เมย 66					21 เมย 66			21 เมย 66		21 เมย 66				1 พค 66
9	ไดชาร์ทและอื่นๆ (สำนัก)					149,994.00	รออก RQ 25 เมย 66															
10	อะไหล่รถยนต์					17,660.00	รออก RQ 10 พค 66															
11	อะไหล่รถยนต์					98,670.00	รออก RQ 15 พค 66															
12	อะไหล่รถยนต์					80,141.00	รออก RQ 30 พค 66															
						4,198,214.00	3,826,997.75														1,892,475.00	

ลำดับ	รายการ	ภาค	เลขที่	ร้านค้า	วงเงิน		รับราคา	ขอซื้อ	ภาค	/	ยื่นเสนอราคา	เปิดซอง	อนุมัติ	รอพุทธรณ์	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอบ	งวดส่งมอบ	เร่งส่งมอบ	ผลเทส	PO
กส.4	ฝายห้วยแม่หลักหมื่น ลูกที่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่																			
1	หินใหญ่คละ ขนาด ศก.15-30 ซม.		EB๗25	ขโนทัย	1,591,214.00															
	หินย่อย		ช.24		1,919,950.00	4,659,289.00	3,082,838.00	4- 11 พย			14 พย 65	15 พย 65	18 พย 65	1 ธค 65	6 ธค 65	300 ว	ค.1 7-9 ธ.ค 65	371,670.00		16 มค 66
	ทรายหยาบ				1,148,125.00											ครบ 2ตค.66	ค.2 27ตค65-30มค66	1,155,250.00		2 กพ 66
																	ค.3 10 มีค 66	583,455.00		3เมย 66
																	ค.4 31 มีค 66	422,983.00		19 เมย 66
																	ค 5	549,480.00		
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.		EB๗26	เรืองชัย	720,039.00		699,811.00	7 - 14 พย			15 พย 65	16 พย 65	21 พย 65	1 ธค 65	6 ธค 65	210 ว	ค.1 7-9 ธ.ค 65	134,925.00		24 มค 66
			ช.26	คอนกรีต												ครบ 4กค.66	ค.2 8 มีค 66	296,835.00	4 เมย 66	19 เมย 66
																	ค.3 14-31 มีค	107,940.00		รอผล
																	ค 4	106,111.00		
3	ปุ๋ยฟีเมนต์ไฮดรอลิค		ค.06	จินทนาพร	2,191,235.00		2,162,961.00	9 - 14 พย			15 พย 65	16 พย 65	21 พย 65	29 พย 65	2 ธค 65	300 ว	ค.1 3-8 ธ.ค 65	550,800.00		14 กพ 66
			ช.23													ครบ 28กย.66	ค.2 3-30 ม.ค 66	459,000.00		9 มีค 66
																	ค.3 1-27 กพ	765,000.00		21 มีค 66
																สุดท้าย	ค.4 13- 27 มีค	388,161.00		รอผล
4	แผ่นไม้อัดเคลือบฟีโน่มด้ำ		EB๗27	สุวรรณ	1,741,350.00			25พย-2ธค			6 ธค 65	7 ธค 65		21 ธค 65	22 ธค 65	135ว 5ง					
			ช.31	อามา												ง.1 10 ม.ค 66	ง.1 3 ม.ค 66	337,050.00		9 ม.ค 66
																ง.2 9 ก.พ 66	ง.2 2 กพ 66	337,680.00		13 กพ 66
																ง.3 11 มี.ค 66	ง.3 2 มีค 66	337,680.00		9 มีค 66
																ง.4 10 เม.ย 66	ง.4-5 3 เมย 66	337,680.00		5 เมย 66
																ง.5 10 พ.ค 66		337,680.00		
5	วัสดุในการจัดทำบานระบายพร้อมเครื่องยก		113 ช.	อนุพงษ์	156,759.00		16 พย 65						18 พย 65		รอออกใบสั่ง	5 วันทำการ				
6	น้ำมันดีเซล (สำนัก)		210 ช.	สุขุม	106,050.00	106,050.00	21 กพ 66						21 กพ 66		21 กพ 66	1 วันทำการ	21 กพ 66	106,050.00		7 มีค 66
7	น้ำมันเครื่องและอื่นๆ		239 ช.	สุขุม	89,991.00	89,991.00	7 มีค 66						29 มีค 66		29 มีค 66	5 วันทำการ	3 เมย 66	89,991.00		19 เมย 66
8	ท่อยางออยล์คูเลอร์และอื่นๆ (สำนัก)		258 ช.	อนุพงษ์	35,017.00	35,017.00	5 เมย 66						7 เมย 66		7 เมย 66	5 วันทำการ	18 เมย 66			25 เมย 66
9	เฟืองทองเหลืองและอื่นๆ (สำนัก)		262 ช.	สันป่าข่อย	329,131.00	329,131.00	19 เมย 66						21 เมย 66		21 เมย 66	5 วันทำการ	25 เมย 66			3 พค 66
10	น้ำมันดีเซล		263 ช.	สุขุม	101,550.00	101,550.00	19 เมย 66						19 เมย 66		19 เมย 66	1 วันทำการ	19 เมย 66			1 พค 66
11	เบ็ดเตล็ด 4		265 ช.	สิริธร	483,354.00	483,354.00	19 เมย 66						21 เมย 66		21 เมย 66	5 วันทำการ	25 เมย 66			3 พค 66
12	อะไหล่รถยนต์		271 ช.	กิตติ	6,501.00		24 เมย 66								26 เมย 66		28 เมย 66			3 พค 66
13	จ้างซ่อมรถยนต์		30 จ.	กิตติ	15,500.00		24 เมย 66								26 เมย 66		28 เมย 66			3 พค 66
14	Shaft และอื่นๆ (สำนัก)				149,955.00		รออก RQ 25 เมย 66													
15	อะไหล่รถยนต์				78,559.00		รออก RQ 19 พค 66													
16	จ้างซ่อมรถยนต์				12,500.00		รออก RQ 2 มิย 66													
17	อะไหล่รถยนต์				50,887.00		รออก RQ 2 มิย 66													
	รวม				10,927,667.00	5,804,382.00	5,945,610.00											7,775,421.00		

ชก.คส.๑ รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและยานพาหนะ (ส่วนกลาง) ของโครงการฯ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน






งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและยานพาหนะ (สนาม) ของโครงการฯ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน







งานสนับสนุนภารกิจของฝ่ายก่อสร้างและฝ่ายวิศวกรรม






<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

แผนงานเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๑

<u>งานในความรับผิดชอบ</u>

1. ระบบส่งน้ำฝายดอยครั่ง (ระยะที่ 6) งบประมาณ 48,000,000 บาท
2. ระบบส่งน้ำฝายสบกึม งบประมาณ 25,000,000 บาท
3. อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ 126,000,000 บาท

1.ระบบส่งน้ำฝายดอยครั่ง (ระยะที่ 6) บ.ดอยครั่ง ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน
งบประมาณ 48,000,000 บาท

เอกสารประมาณการ	แบบรูปรายการ	Masterplan	เอกสารความพร้อมด้านที่ดิน			เอกสารการมีส่วนร่วม		
			หนังสืออุทิศที่ดิน	หนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า	หนังสืออนุญาตกรมเจ้าท่า	MOU	ประชาคม	กลุ่มผู้ใช้น้ำ
√	√		√	ไม่ต้องขอใช้ พท.	ไม่ต้องขอใช้ พท.	√	√	√

ภาพก่อนดำเนินการ





ประชาคมชาวบ้าน วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเหมืองจี้





2.ระบบส่งน้ำฝายสบกึม บ.ท้องฝาย ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน
งบประมาณ 25,000,000 บาท

เอกสารประมาณการ	แบบรูปรายการ	Masterplan	เอกสารความพร้อมด้านที่ดิน			เอกสารการมีส่วนร่วม		
			หนังสืออุทิศที่ดิน	หนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า	หนังสืออนุญาตกรมเจ้าท่า	MOU	ประชาคม	กลุ่มผู้ใช้น้ำ
√	√		√	ไม่ต้องขอใช้ พท.	ไม่ต้องขอใช้ พท.	√	√	√

ภาพก่อนดำเนินการ





ประชาคมชาวบ้าน วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลทาทุ่งหลวง





3. อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ำ บ.ใหม่สวรรค์ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
งบประมาณ 126,000,000 บาท

เอกสารประมาณการ	แบบรูปรายการ	Masterplan	เอกสารความพร้อมด้านที่ดิน			เอกสารการมีส่วนร่วม		
			หนังสืออุทิศที่ดิน	หนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า	หนังสืออนุญาตกรมเจ้าท่า	MOU	ประชาคม	กลุ่มผู้ใช้น้ำ
√	√		√	√	ไม่ต้องขอใช้ พท.	ไม่ต้องมี	√	√

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒

การเตรียมความพร้อมแผนงานงบประมาณ ปี 2567
ฝ่ายก่อสร้างที่ 2

ที่	รายการงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ศึกษา	สำรวจ	แบบรูป	ตรวจสอบพื้นที่	ประชาคม	ขอตรวจสอบพื้นที่ป่า	ขออนุญาติใช้พื้นที่ป่า
1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง								
1.1	อ่างเก็บน้ำห้วยผักปิ้ง ต.ขุมยวม อ.ขุนยวม	50.0	√	√	√	16 ก.พ.66	16 ก.พ.66	√	√
1.2	อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหนำ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย	75.0	√	√	√	23 ม.ค.66	23 ม.ค.66	√	√
2	ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท								
2.1	ฝายห้วยต้นนุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม	38.0	√	√	√	15 ก.พ.66	15 ก.พ.66	√	√
	รวม	163.0							

การเตรียมความพร้อมแผนงานงบประมาณ ปี 2568
ฝ่ายก่อสร้างที่ 2

ที่	รายการงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ศึกษา	สำรวจ	แบบรูป	ลงพื้นที่ตรวจสอบ	ประชาคม	ขอตรวจสอบพื้นที่ป่า	ขออนุญาติใช้พื้นที่ป่า
1	ฝายบ้านแพะ พร้อมระบบส่งน้ำ ม.3 บ้านแพะ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง	26.5	√	√	X	21 มี.ค.66	21 มี.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67
2	อ่างเก็บน้ำห้วยช้างตาย ม.1 บ้านขุมยวม ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม	40.5	√	√	√	16 ก.พ.66	16 ก.พ.66		
3	ฝายบ้านห้วยนา พร้อมระบบส่งน้ำ ม.5 ห้วยนา ต.แม่เงา อ.ขุนยวม	38.0	√	√	X	22 มี.ค.66	22 มี.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67
4	ปรับปรุงตัวเขื่อนห้วยหมากฟักทองพร้อมอาคารประกอบ ม.10 ทุ่งรวงทอง ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย	45.0	√	X	X	21 มี.ค.66	21 มี.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67
	รวม	150.0							

การเตรียมความพร้อมแผนงานงบประมาณ ปี 2569
ฝ่ายก่อสร้างที่ 2

ที่	รายการงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	ศึกษา	สำรวจ	แบบรูป	ลงพื้นที่ตรวจสอบ	ประชาคม	ขอตรวจสอบพื้นที่ป่า	ขออนุญาติใช้พื้นที่ป่า
1	อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อคี ม.2 เมืองปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม	63.0	√	√	X	ม.ค.67	ม.ค.67	ม.ค.67	ก.พ.67
2	ฝายห้วยไม้ซาง พร้อมระบบส่งน้ำ ม.7 สันติพัฒนา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย	41.0	X	X	X	20 เม.ย.66	20 เม.ย.66	ม.ค.67	ก.พ.67
3	ฝายนาปู่ป้อม พร้อมระบบส่งน้ำ (แปลงใหญ่) ม.1 บ้านนาปู่ป้อม ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า	43.0	√	X	X	พ.ค.66	พ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67
4	ฝายนาบอน พร้อมระบบส่งน้ำ ม.8 บ้านหลวง ต.แม่เงา อ.ขุนยวม	35.0	X	X	X	20 เม.ย.66	20 เม.ย.66	ม.ค.67	ก.พ.67
	รวม	182.0							

หมายเหตุ
ฝายห้วยไม้ซาง ฝายนาบอน มีแผนศึกษา ฯ ปี 2567

การเตรียมความพร้อมแผนงานงบประมาณ ปี 2569

ฝายห้วยไม้ซาง พร้อมระบบส่งน้ำ ม.7 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน









ฝายก่อสร้างที่ 2 โครงการก่อสร้าง สชป.1

การเตรียมความพร้อมแผนงานงบประมาณ ปี 2569

ฝายห้วยไม้ซาง พร้อมระบบส่งน้ำ ม.7 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

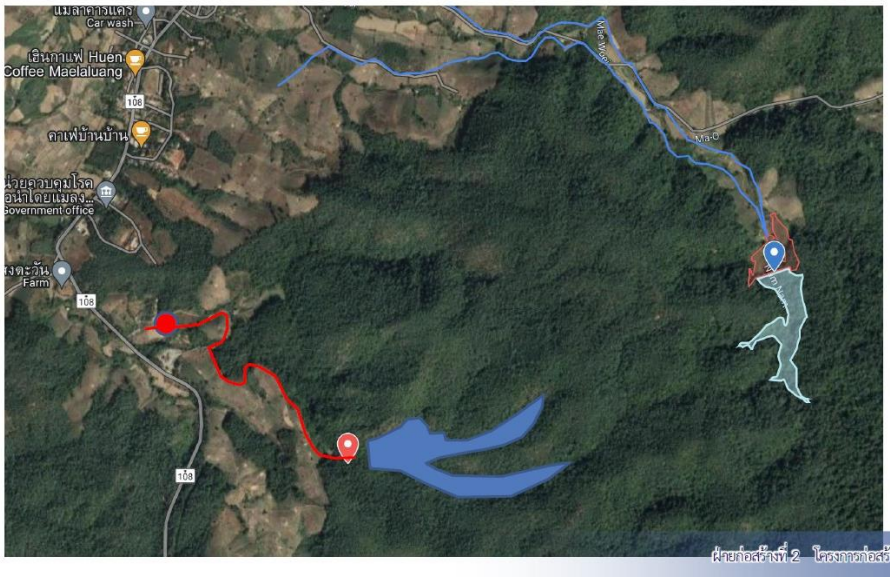

ฝายก่อสร้างที่ 2 โครงการก่อสร้าง สชป.1

การเตรียมความพร้อมแผนงานงบประมาณ ปี 2569

ฝายนาบอน พร้อมระบบส่งน้ำ ม.8 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน








ฝายก่อสร้างที่ 2 โครงการก่อสร้าง สชป.1

การเตรียมความพร้อมแผนงานงบประมาณ ปี 2569

ฝายนาบอน พร้อมระบบส่งน้ำ ม.8 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน



การเตรียมความพร้อมแผนงานงบประมาณ ปี 2569

ฝายนาบอน พร้อมระบบส่งน้ำ ม.8 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน







ฝายก่อสร้างที่ 2 โครงการก่อสร้าง สงป.1

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

แผนเตรียมความพร้อมประจำปี ๖๗

แผนเตรียมความพร้อม ประจำปีงบประมาณ 2567

งานในความรับผิดชอบ

1. ฝายอมแฮดพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ 70,000,000 บาท
2. ระบบส่งน้ำฝายแม่แจ่มฝั่งขวา ระยะที่ 2 งบประมาณ 40,000,000 บาท
3. สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังน้ำหยาด 2 งบประมาณ 50,000,000 บาท

1. ฝายอมแฮดพร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ 70,000,000 บาท

เอกสารประมาณการ	แบบรูปรายการ	Masterplan	เอกสารความพร้อมด้านที่ดิน			เอกสารการมีส่วนร่วม		
			หนังสืออุทิศที่ดิน	หนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า	หนังสืออนุญาตกรมเจ้าท่า	MOU	ประชาคม	กลุ่มผู้ใช้น้ำ
√	√	ไม่ต้องใช้	√	อยู่ระหว่างขออนุญาติป่า 2484	ไม่ต้องใช้	ไม่ต้องมี	√	√

หมายเหตุ

1. หนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า อยู่ในขั้นตอนแจ้ง

ภาพก่อนดำเนินการ







การประชาคมชี้แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำ




2. ระบบส่งน้ำฝายแม่แจ่มฝั่งขวาระยะที่ 2 งบประมาณ 40,000,000 บาท

เอกสารประมาณการ	แบบรูปรายการ	Masterplan	เอกสารความพร้อมด้านที่ดิน			เอกสารการมีส่วนร่วม		
			หนังสืออุทิศที่ดิน	หนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า	หนังสืออนุญาตกรมเจ้าท่า	MOU	ประชาคม	กลุ่มผู้ใช้น้ำ
√	√	√	√	ไม่ต้องใช้	ไม่ต้องใช้	ไม่ต้องมี	√	√

ภาพก่อนดำเนินการ





การประชาคมชี้แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำ




3. สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังน้ำหยาด 2 งบประมาณ 50,000,000 บาท

เอกสารประมาณการ	แบบรูปรายการ	Master plan	เอกสารความพร้อมด้านที่ดิน			เอกสารการมีส่วนร่วม		
			หนังสืออุทิศที่ดิน	หนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า	หนังสืออนุญาตกรมเจ้าท่า	MOU	ประชาคม	กลุ่มผู้ใช้น้ำ
อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ	ไม่ต้องใช้	√	ไม่ต้องใช้	อยู่ระหว่างดำเนินการ	√	√	√

หมายเหตุ

1. มีการย้ายตำแหน่งสถานีสูบน้ำ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขแบบ
2. หนังสือขออนุญาตกรมเจ้าท่า อยู่ในขั้นตอนเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่า ร่วมกับกรมป่าไม้

ภาพก่อนดำเนินการ





การประชาคมชี้แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำ





ฝ่ายก่อสร้างที่ ๔

งานในความรับผิดชอบ

1. อาคารบังคับน้ำเหมืองนางู พร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ 35,000,000 บาท
2. อาคารบังคับน้ำเหมืองลุ่มบ้าน พร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ 34,000,000 บาท
3. ฝายทดน้ำแม่ฮ้อยเงินใต้ พร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ 33,000,000 บาท

1. อาคารบังคับน้ำเหมืองนางู พร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ 35,000,000 บาท

เอกสารประมาณการ	แบบรูปรายการ	Masterplan	เอกสารความพร้อมด้านที่ดิน			เอกสารการมีส่วนร่วม		
			หนังสืออุทิศที่ดิน	หนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า	หนังสืออนุญาตกรมเจ้าท่า	MOU	ประชาคม	กลุ่มผู้ใช้น้ำ
√	√	ไม่ต้องใช้	√	ไม่ต้องใช้	ไม่ต้องใช้	√	√	√

หมายเหตุ

- แบบส่วนที่เพิ่มเติม อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
- กำลังดำเนินการปรับแก้ไขประมาณการ

ภาพก่อนดำเนินการ





การประชาคมชี้แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำ





2. อาคารบังคับน้ำเหมืองลุ่มบ้าน พร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ 34,000,000 บาท

เอกสารประมาณการ	แบบรูปรายการ	Masterplan	เอกสารความพร้อมด้านที่ดิน			เอกสารการมีส่วนร่วม		
			หนังสืออุทิศที่ดิน	หนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า	หนังสืออนุญาตกรมเจ้าท่า	MOU	ประชาคม	กลุ่มผู้ใช้น้ำ
√	√	ไม่ต้องใช้	√	ไม่ต้องใช้	ไม่ต้องใช้	√	√	√

หมายเหตุ

- แบบส่วนที่เพิ่มเติม อนุมัติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
- กำลังดำเนินการปรับแก้ไขประมาณการ

ภาพก่อนดำเนินการ





การประชาคมชี้แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำ





3. ฝายทดน้ำแม่ฮ้อยเงินใต้ พร้อมระบบส่งน้ำ งบประมาณ 33,000,000 บาท


เอกสารประมาณการ	แบบรูปรายการ	Masterplan	เอกสารความพร้อมด้านที่ดิน			เอกสารการมีส่วนร่วม		
			หนังสืออุทิศที่ดิน	หนังสืออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า	หนังสืออนุญาตกรมเจ้าท่า	MOU	ประชาคม	กลุ่มผู้ใช้น้ำ
√	√	ไม่ต้องใช้	√	ไม่ต้องใช้	ไม่ต้องใช้	√	√	√

หมายเหตุ

- แบบที่ปรับแก้ไข อนุมัติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
- กำลังดำเนินการปรับแก้ไขประมาณการ

ภาพก่อนดำเนินการ



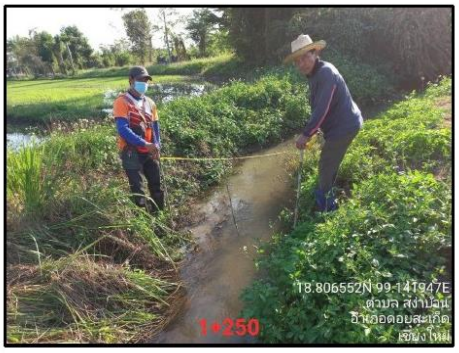

การประชาคมชี้แจงกลุ่มผู้ใช้น้ำ





การถ่ายโอน


การถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2560 - 2565

ลำดับ	ชื่องาน	ปีงบประมาณ	งบประมาณ	เดือนที่คาดว่าจะส่งมอบ												ถ่ายโอนให้หน่วยงาน	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ	2561	48,000,000									✓				โครงการพลประทาน จังหวัดลำพูน	สิ่งแล่มถ่ายโอนให้ผู้รับมอบลงนาม	
2	ฝายทุ่งโป่งพร้อมระบบส่งน้ำ	2562	34,369,000									✓				องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	ส่งมอบพร้อมกับงาน ปรับปรุงช่องระบายทรายด้านหน้าประตู	
	ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน																	
3	อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ำ	2562	52,156,300			✓										โครงการพลประทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ถ่ายโอนแล้ว	
	ต.แม่อูคอ อ.แม่อูคอ จ.แม่ฮ่องสอน																	
4	จัดหาน้ำสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่แจ่ม(แห่งใหม่) อ่างเก็บน้ำหลวงแม่ปาน พร้อมระบบส่งน้ำ	2563	48,800,000				✓									โครงการพลประทาน จังหวัดเชียงใหม่	นัดวันส่งมอบอีกครั้ง	
	ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่																	
5	ระบบส่งน้ำบ้านประตูเมือง พื้นที่พลประทาน 140 ไร่	2564	14,540,447			✓										โครงการพลประทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ถ่ายโอนแล้ว	
	ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน																	
6	ปรับปรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	2564	7,000,000					✓								โครงการพลประทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	สิ่งแล่มถ่ายโอนให้ผู้รับมอบลงนาม	
	ต.สบโอง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน																	
7	อาคารบังคับน้ำพร้อมระบบส่งน้ำฝายถอยครั้ง	2564 เพิ่มเติม	9,800,000	✓												เทศบาลตำบลเหมืองจี้	ถ่ายโอนแล้ว	
	ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน																	
8	อาคารบังคับน้ำห้วยอีต้อพร้อมระบบส่งน้ำ	2564 เพิ่มเติม	9,930,000					✓								อบต.แม่วิน	อบต.ขอเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการใหม่	
	ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่																	
9	ฝายทรายมูลพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่พลประทาน 300 ไร่	2565	31,212,000					✓								เทศบาลสะเมิงใต้	รอพบนายกเทศบาลสะเมิงใต้	
	ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่																	
10	ฝายบ้านทรายแดง พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่พลประทาน 470 ไร่	2565	29,269,000									✓				อบต.สันต้นหมื้อ	รองบประมาณ งานเขื่อนโป่งทันตลิ่ง	
	ตำบล สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่																	
11	ระบบส่งน้ำฝายแม่แจ่มฝั่งขวา (ระยะที่1) พื้นที่พลประทาน 2050 ไร่	2565	39,291,100					✓								โครงการพลประทาน จังหวัดเชียงใหม่	อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการของบประเสียใหม่สรวจสอบ	
	ต.ทางดง อ.฿อด จ.เชียงใหม่																	
12	อาคารบังคับน้ำเหมืองจี้ พื้นที่รับประโยชน์ 6900 ไร่	2565	39,617,300					✓								โครงการพลประทาน จังหวัดลำพูน	อยู่ระหว่างทำแผ่นส่งมอบ	
	ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน																	
13	ฝายนาดกปายพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่พลประทาน 780 ไร่	2565	32,285,300					✓								อบต.ปางหมู	รอแผ่นส่งมอบคืนมาจาก อบต.	
	ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน																	
14	ฝายแม่หารพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่พลประทาน 490 ไร่	2565	29,666,600		✓											อบต.บ้านกาศ	ถ่ายโอนแล้ว	
	ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน																	
15	ฝายสองตือพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่พลประทาน 130 ไร่	2565	29,135,100					✓								อบต.ขุนยวม	อยู่ระหว่างนัดวันส่งมอบ	
	ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน																	
16	ระบบส่งน้ำบ้านประตูเมือง (ระยะสุดท้าย) พื้นที่พลประทาน 100 ไร่	2565	24,380,000			✓										โครงการพลประทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	สิ่งแล่มถ่ายโอนให้ผู้รับมอบลงนาม	
	ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน																	
17	ประตูระบายน้ำลดและกันทรวน พื้นที่รับประโยชน์ 765 ไร่	2565	40,405,400									✓				เทศบาลศรีเตี้ย	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน																	
18	อาคารป้องกันตลิ่งเหมืองจี้	2565	26,553,100					✓								โครงการพลประทาน จังหวัดลำพูน	อยู่ระหว่างทำแผ่นส่งมอบ	
	ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน																	
19	โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลบ้านจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	2563/2565	68,974,400								✓					โครงการพลประทาน จังหวัดเชียงใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	อ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ																	

<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u> เรื่องอื่นๆ

สืบเนื่องจาก วาระที่๑ บท.คส.๑ ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ดังนี้

- ในเรื่องของหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายดังกล่าว ทางโครงการฯของเรายังมีจุดที่ดำเนินการไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ จึงขอให้ปรับแก้ไขในเรื่องการลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลา ไม่ให้ใช้เป็นการพิมพ์ให้ลงชื่อเป็นลายมือ เท่านั้นตามแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ และ ให้เริ่มดำเนินการในเดือนถัดไปทั้งการปฏิบัติงานปกติและนอกเวลา

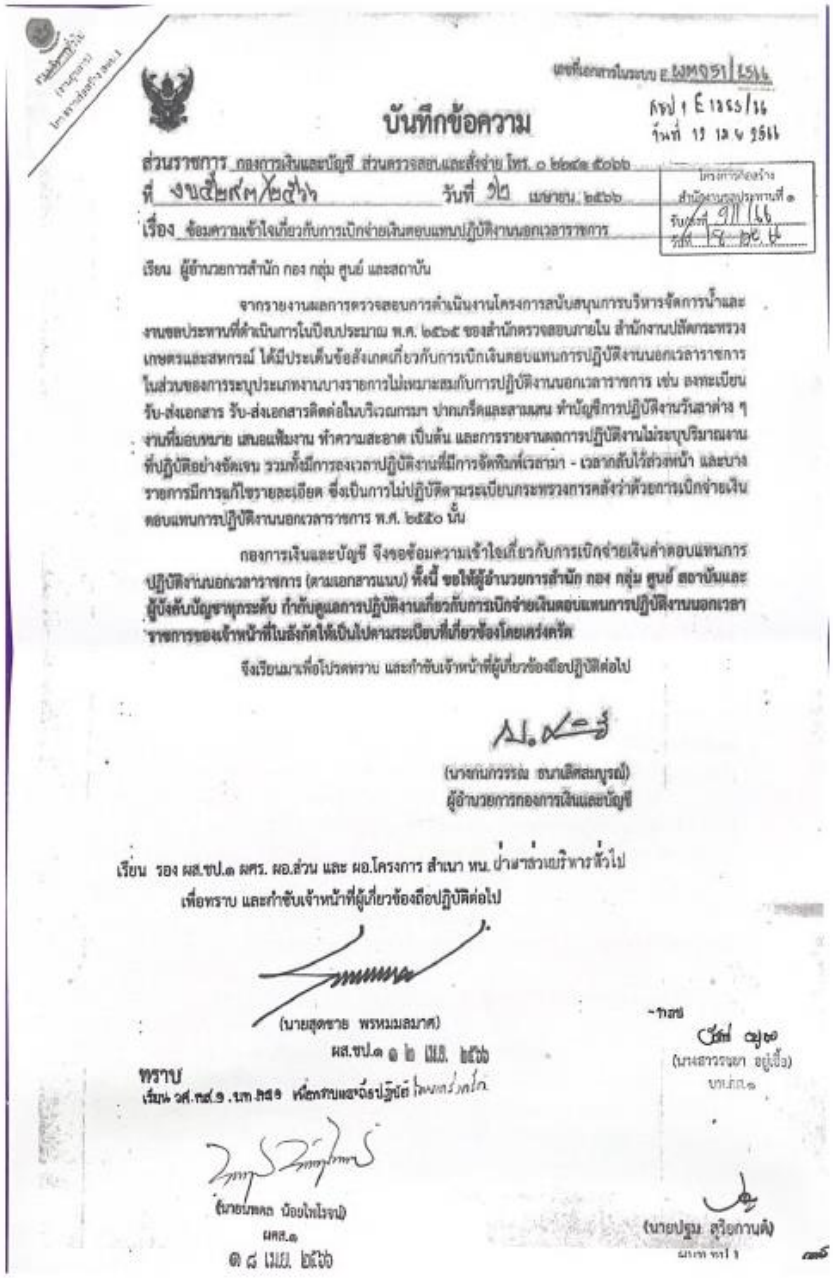

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนตรวจสอบและสั่งจ่าย โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๐๐๖

ที่ งน๕๒๘๗/๒๕๖๖ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ และสถาบัน

จากรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทานที่ดำเนินการโนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในส่วนของการระบุประเภทงานบางรายการไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เช่น งานทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร รับ-ส่งเอกสารติดต่อในบริเวณกรมฯ ปากเกร็ดและสามสน ทำบัญชีการปฏิบัติงานวันเสาร์ต่าง ๆ งานที่มอบหมาย เสนอแฟ้มงาน ทำความสะอาด เป็นต้น และการรายงานผลการปฏิบัติงานไม่ระบุปริมาณงานที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการลงเวลาปฏิบัติงานที่มีการจัดพิมพ์เวลามา - เวลากลับไว้ล่วงหน้า และบางรายการมีการลูกไขรายละเอียด ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น

กองการเงินและบัญชี จึงขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ สถาบันและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ กำกับดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(นางกนกวรรณ ธนาลิศสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

เรียน รอง ผส.ชป.๑ ผศร. ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ สำนัก หน. ฝ่ายส่วนบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(นายสุดชาย พรหมมลมาศ)
ผส.ชป.๑ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖

ทราบ
เรียน วศ.ชป.๑ ,บท.คส.๑ เพื่อทราบและจัดปฏิบัติ

(นายมนตรี น้อยไพโรจน์)
ผศร.๑
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖

(นางสาวรจนา อยู่เจือ)
บท.การเงิน๑

(นายปฐม สุวิชกานต์)

ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

(เอกสารแนบท้ายหนังสือกองการเงินและบัญชี ที่ งบ ๕๒๓๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖)

การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๑. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายให้อนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๑๔๒/๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี โดยพิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั้งนั้น ๆ และลักษณะของประเภทงานให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสำคัญ

กรณีลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ หรือการปฏิบัติงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือในวันหยุดพิเศษ ซึ่งจะต้องจ่ายค่าจ้างนอกเวลา หรือค่าจ้างในวันหยุดหรือค่าอาหารนอกเวลาให้กระทำได้ในกรณีที่จำเป็นและรีบด่วน โดยมีคำสั่งของผู้มีอำนาจเป็นหลักฐาน

๒. การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้จัดทำแบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ขป. ๓๐๕) เรียน อธช. ในฐานะผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และการลงนามอนุมัติให้ลงชื่อและระบุตำแหน่งในฐานะผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (.....ปฏิบัติราชการแทน อธช.)

ทั้งนี้ การจัดทำแบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ขป.๓๐๕) จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงานหรือไม่นั้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุม กำกับ ดูแลของหน่วยงาน และการผ่านผู้มีหน้าที่คุมเงินงบประมาณ หรือหน่วยงานอาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน

๓. กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทาง เมื่อการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและกลับถึงที่ตั้งสำนักงานในวันใด หากจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้น ให้เบิกเงินตอบแทนได้

๔. กรณีข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในวันนั้น ๆ เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติในเวลาราชการในวันที่เข้ารับการฝึกอบรม

อัตราการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๑. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ ๔ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๕๐ บาท

๒. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ ๗ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท ยกเว้น

กรณีลูกจ้างชั่วคราว รายวัน และรายชั่วโมง มาปฏิบัติงาน

- วันหยุดประจำสัปดาห์ จ่ายค่าจ้าง ๒ เท่า ของอัตราค่าจ้างอัตราปกติ
- วันหยุดราชการหรือวันหยุดพิเศษ จ่ายค่าจ้างเพิ่ม ๑ เท่า ของอัตราค่าจ้างอัตราปกติ

๓. กรณี...

๓. กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติ โดยมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนและมีลักษณะเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่วนราชการอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนเป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ ๗ ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ ๖๐ บาท

๔. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้นับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพื่อเบิกเงินตอบแทนสำหรับวันนั้น

๕. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นของทางราชการสำหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว

๖. การปฏิบัติงาน**ที่ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้** ได้แก่

๖.๑ การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือตามระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม่มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน

๖.๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจำนวนชั่วโมง

การควบคุมดูแลและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้

๑. การลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ปฏิบัติ ดังนี้

๑.๑ ให้ใช้สมุดลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแยกจากสมุดลงเวลามาปฏิบัติงานปกติ หรือจะใช้แบบฟอร์ม บัญชีลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (แบบฟอร์มแนบท้าย)

๑.๒ การลงลายมือชื่อและชื่อสกุล โดยเขียนด้วยตัวบรรจง พร้อมลงเวลามาและเวลากลับ

๑.๓ การลงลายมือชื่อและชื่อสกุล ให้เรียงลำดับก่อนหลังตามวันและเวลาปฏิบัติงาน

๑.๔ ห้ามประทับตราหรือพิมพ์ชื่อและชื่อสกุล เวลามาและเวลากลับไว้ล่วงหน้า

๑.๕ ห้ามลงลายมือชื่อแทนกัน

๑.๖ ผู้ไม่มาปฏิบัติงาน ไม่ต้องลงลายมือชื่อ

๒. ผู้รับรองการปฏิบัติงานต้องมีรายชื่อในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในแบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ขป.๑๐๕) และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กรณีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงลำพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง

๓. ให้ผู้รับรองการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน โดยลงลายมือชื่อกำกับในหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานทุกวัน (สมุดลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือแบบฟอร์มบัญชีลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) กรณีผู้รับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดินทางไปราชการ หรือไม่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันใด ให้ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรายอื่นเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน และลงลายมือชื่อกำกับในหลักฐานการลงเวลาปฏิบัติงานในวันนั้น

๔. ผู้รับรองการปฏิบัติงานเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (บก.-กจ.๘) และรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน กรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับรองการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

๕. การรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในช่องปริมาณงานที่ต้องทำ ต้องระบุปริมาณงานที่ปฏิบัติแล้วเสร็จให้ชัดเจน โดยแสดงจำนวนชิ้นงานที่ปฏิบัติ และต้องสอดคล้องกับงานที่ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแนบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน

- ๓ -

ที่ ข ๑๑๔๒/๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยเรียน อธช. ในฐานะผู้มีอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ และการลงนามรับทราบผลการปฏิบัติงาน ให้ลงชื่อและระบุตำแหน่งในฐานะผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (.....ปฏิบัติราชการแทน อธช.)

การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงานหรือไม่นั้น ให้พิจารณาตามความเหมาะสมในการควบคุม กำกับ ดูแลของหน่วยงาน

หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีดังนี้

๑. แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ขป. ๓๐๕) ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว พร้อมรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

๒. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติรับทราบแล้ว ตามแบบแนบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๑๔๒/๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓. หลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (บก.-กจ. ๘) โดยด้านหลังแบบ บก.-กจ.๘ ให้ผู้มีสิทธิรับเงินประทับตราเข้าบัญชีธนาคาร ระบุชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี จำนวนเงิน พร้อมลงลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่ขอรับเงิน

๔. กรณีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แนบสำเนาคำสั่งจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

การจัดทำและนำส่งหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จะต้องดำเนินการภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว

- ๔ -

บัญชีลงชื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	ชื่อและชื่อสกุล (ตัวบรรจง)	ลายมือชื่อ	เวลามา	ลายมือชื่อ	เวลากลับ	หมายเหตุ

ลงชื่อ

(.....)

ผู้รับรองการปฏิบัติงาน

แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปป.๓๐๕

เรื่อง ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เรียน .....

ด้วยงาน/โครงการ.....สำนัก/กอง/โครงการ.....

มีงาน.....

.....

.....

มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานปกติ.....คน ไม่เพียงพอจะทำงานตามปกติให้เสร็จได้เพราะ.....

.....

.....

ถ้าไม่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจะทำให้งานนี้เกิดการเสียหายคือ.....

.....

.....

จึงขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่จำนวน.....คน ดังบัญชีรายนามที่แนบ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ระหว่างวันที่.....เดือน.....พ.ศ. .....

ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ..... โดยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เกินวันละ.....ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา.....น. ถึงเวลา..... น. หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ไม่เกินวันละ.....ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา..... น. ถึงเวลา..... น. ในเดือนหนึ่งให้คนหนึ่งทำงานรวมกันไม่เกิน.....วัน หรือ.....ชั่วโมง ใช้เงินจากแหล่งของเงิน.....

รหัสงบประมาณ..... กิจกรรมหลัก.....

กิจกรรมย่อย.....รายการงบประมาณ.....

ชื่อบัญชีเงินยกประเภท.....เป็นเงินงบประมาณ.....บาท

(.....) โดยมี นาย / นาง / นางสาว.....

ตำแหน่ง..... เป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

งาน.....ฝ่าย/ กลุ่ม.....สำนัก/กอง/โครงการ.....


รายชื่อผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ระหว่างวันที่.....เดือน ..... พ.ศ.....ถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ

หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ

- แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแนบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน จากเดิมใช้เป็น ข๒๔๐ ให้เปลี่ยนเป็น คำสั่งกรม ที่ ข๑๑๔๒/๑/๒๕๖๔ ลว ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

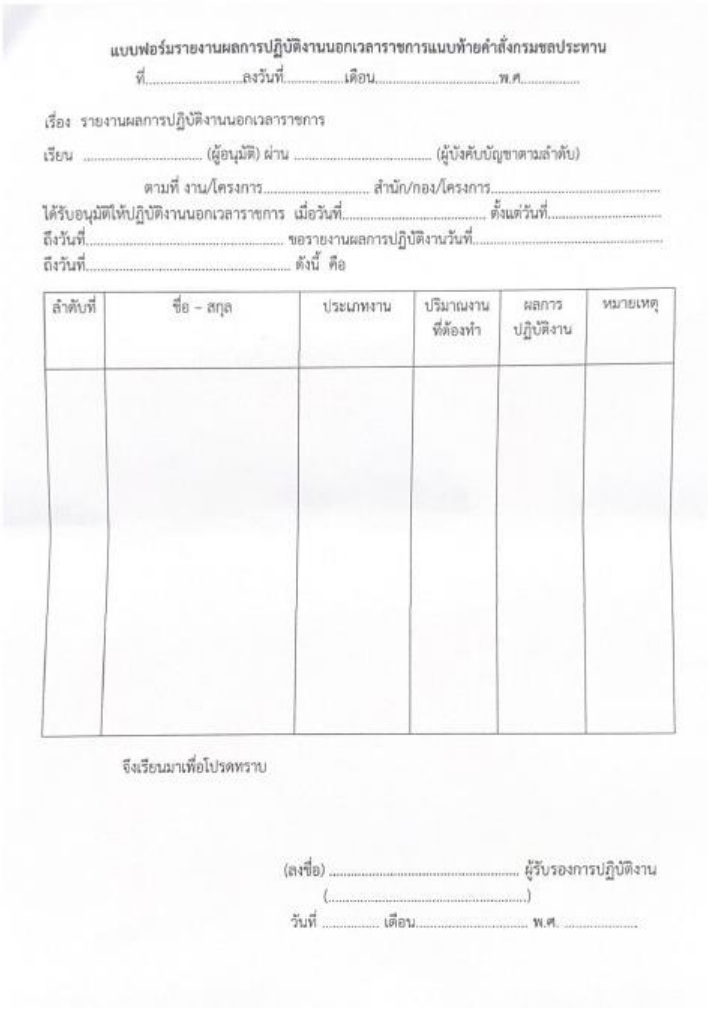

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแนบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน

ที่.....ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เรียน ..... (ผู้อนุมัติ) ผ่าน ..... (ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ)

ตามที่ งาน/โครงการ..... สำนัก/กอง/โครงการ.....
ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เมื่อวันที่..... ตั้งแต่วันที่.....
ถึงวันที่..... ขอรายงานผลการปฏิบัติงานวันที่.....
ถึงวันที่..... ดังนี้ คือ

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ประเภทงาน	ปริมาณงานที่ต้องทำ	ผลการปฏิบัติงาน	หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับรองการปฏิบัติงาน
(.....)
วันที่ ..... เดือน..... พ.ศ. .....

- ประชุมครั้งต่อไปวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐น.

(นางสาวปิยะธิดา จันทร์สูง)
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางสาวรชยา อยู่เชื้อ)
ผู้ตรวจ
