รายงานการประชุมประจำเดือน(ครั้งที่๘/๒๕๖๖)
โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑.	นายนพดล น้อยไพโรจน์	ผคส.๑	ประธาน
๒.	นายสิทธิโชค พิรุณรัตน์	วศ.คส.๑.	
๓.	นายชยุต สมัครวงษ์	กส.๑ ชป.๑	
๔.	นายกิตติ์วริศ ภัคเชียรโชติ	กส.๒ ชป.๑	
๕.	นายวีระวิทย์ รงค์ทอง	กส.๓ ชป.๑	
๖.	นายภูวเมศฐ์ อัศวมงคลพงษ์	กส.๔ ชป.๑	
๗.	นางสาวรชยา อยู่เชื้อ	บท.คส.๑	เลขา
๘.	นางสาวกัญฐณา ฐดิวัฒน์	พด.คส.๑	
๙.	นายณรงค์วัฒน์ มาเกิด	ชก.คส.๑	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสกลรัฐ ปรางงาม	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒.	นางสาวณัฏฐา ทิมแก้ว	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๓.	นายเจตนิพิฐ ดวงฤทธิ์	วิศวกรโยธา
๔.	นายอานันท์ นิลสนธิ	พนักงานทั่วไป
๕.	นางสาวปิยะธิดา จันทร์สูง	เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ที่ไม่มาประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผคส.๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

<u>ระเบียบวาระที่๑</u> **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศแจ้งให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องติดตามในเรื่องของ ฝน พายุ ปริมาณน้ำฝนในบริเวณที่ได้มีการก่อสร้างอยู่ตลอด เพื่อที่จะได้วางแผนรับมือ ป้องกันได้อย่างทันท่วงที
- ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบต่างๆในหลายๆเรื่องรวมถึงระเบียบทางด้านพัสดุซึ่งเกี่ยวข้องกับทางโครงการฯทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้มอบหมายให้ทาง พด.คส.๑ ทำการสรุปเนื้อหาและชี้แจงให้ทุกท่านทราบและซักซ้อมความเข้าใจ ในวาระต่อไป
- การตรวจสอบจากทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน ให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมในทุกเรื่อง โดยเฉพาะ การจ้างค่าแรง การบริหารควบคุมต่างๆ หากมีการเข้าตรวจสอบจะได้พร้อมให้ดำเนินการตรวจสอบตลอดเวลา

<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u> **รับรองรายงานการประชุม**

รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม

<u>ระเบียบวาระที่๓</u> **เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ**

วศ.คส๑ รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมายดังนี้

รายงานการคุมเงินงบประมาณ





งบกันเหลื่อมปี 2565

	งบจัดสรร (บาท)	คุมประมาณการ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคุมประมาณการคงเหลือ (บาท)
หมวด 600 งบลงทุน	17,572,293.25	17,451,351.59	17,447,599.35	132,693.90
งบกลาง 65 (กปร.)	36,100,715.07	31,211,195.89	23,370,100.39	4,889,519.18
สรุปยอดวงเงิน	53,673,008.32	48,662,547.48	40,817,699.74	5,022,213.08


งบปี 2566

	งบจัดสรร (บาท)	คุมประมาณการ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคุมประมาณการคงเหลือ (บาท)
หมวด 600 งบลงทุน	208,062,794.69	172,048,125.21	168,298,492.20	36,014,669.48
หมวด 300 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	55,354.00	48,800.00	24,900.00	6,554
หมวด 450 ค่าสาธารณูปโภค	231,691	231,691	218,133.49	0
สรุปยอดวงเงิน	208,349,839.69	172,328,616.21	168,541,525.69	36,021,223.48


งบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(ปี 2566)


	งบจัดสรร (บาท)	คุมประมาณการ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ยอดคุมประมาณการคงเหลือ (บาท)
หมวด 600 งบลงทุน	989,800.00	953,956.56	953,426.56	46,156.84
สรุปยอดวงเงิน	989,800.00	953,956.56	953,426.56	46,156.84



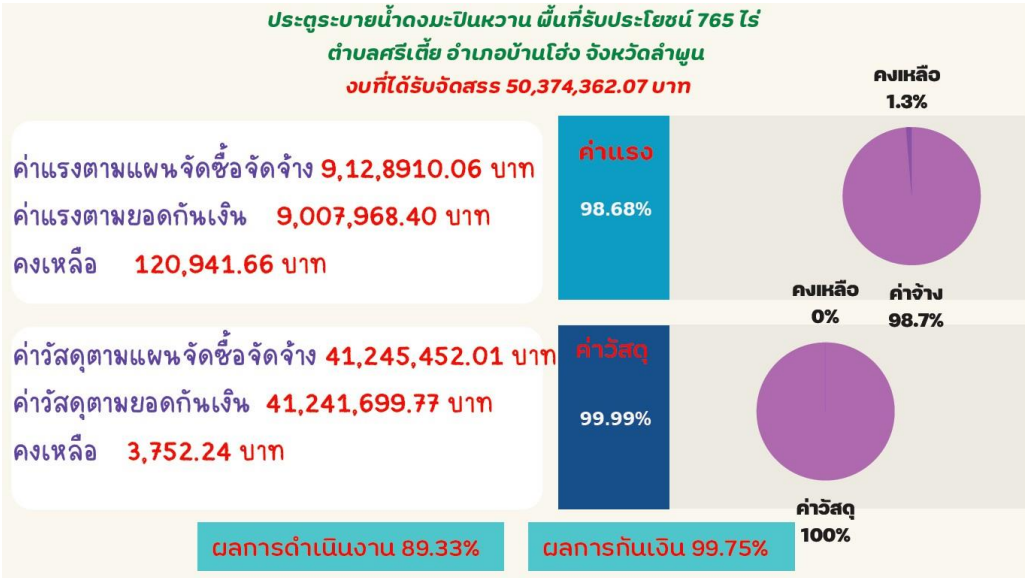


งบกปร.ปี 65
1
อ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์ พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2)
ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
%รวมผลการกันเงิน
86.46%

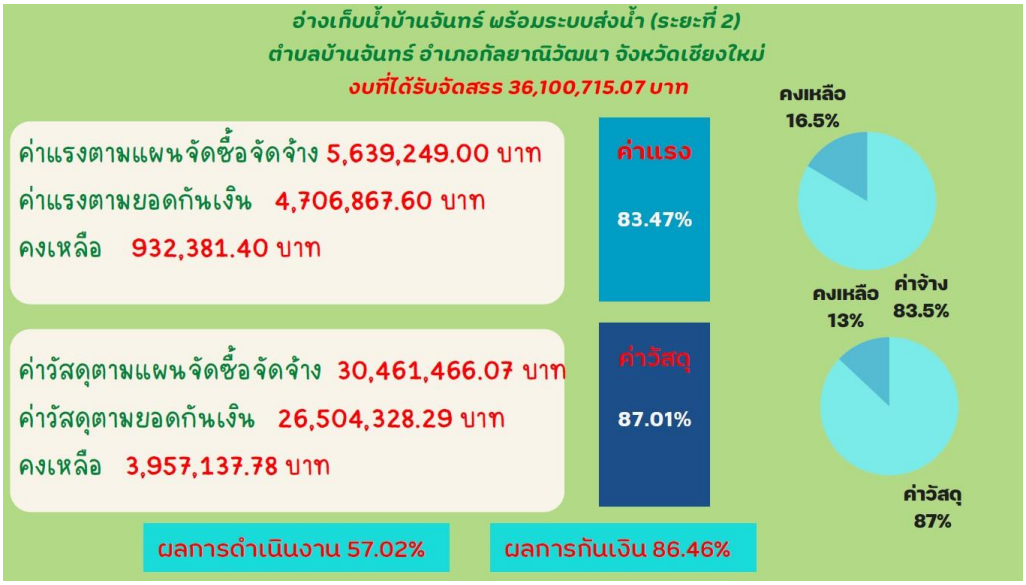

อ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์ พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2)
ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
งบที่ได้รับจัดสรร 36,100,715.07 บาท
ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 5,639,249.00 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 4,706,867.60 บาท
คงเหลือ 932,381.40 บาท
ค่าแรง
83.47%
ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 30,461,466.07 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 26,504,328.29 บาท
คงเหลือ 3,957,137.78 บาท
ค่าวัสดุ
87.01%
ผลการดำเนินงาน 57.02%
ผลการกันเงิน 86.46%
คงเหลือ
16.5%
คงเหลือ
13%
ค่าจ้าง
83.5%
ค่าวัสดุ
87%

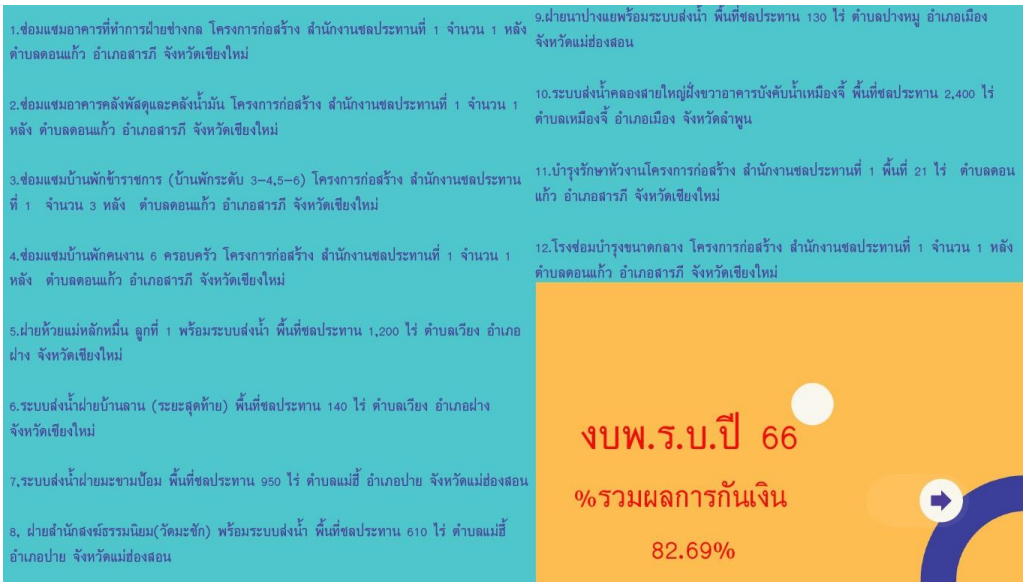
1.ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายช่างกล โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2.ซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุและคลังน้ำมัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
3.ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักระดับ 3-4,5-6) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 3 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
4.ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
5.ฝายห้วยแม่หลักหมื่น ลูกที่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
6.ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน (ระยะสุดท้าย) พื้นที่ชลประทาน 140 ไร่ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
7.ระบบส่งน้ำฝายมะขามป้อม พื้นที่ชลประทาน 950 ไร่ ตำบลแม่ยี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8. ฝายสำนักสงฆ์ธรรมนิยม(วัดมะซัก) พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 610 ไร่ ตำบลแม่ยี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9.ฝายนาป่างแยพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 130 ไร่ ตำบลป่างหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10.ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวาอาคารบังคับน้ำเหมืองจี้ พื้นที่ชลประทาน 2,400 ไร่ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
11.บำรุงรักษาหัวงานโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 พื้นที่ 21 ไร่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
12.โรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
งบพ.ร.บ.ปี 66
%รวมผลการกันเงิน
82.69%

โรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง
ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
งบที่ได้รับจัดสรร 5,280,825 บาท

ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 90,825 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 59,400.00 บาท
คงเหลือ 31,425.00 บาท

ค่าแรง 65.40%



ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 5,190,000 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 0 บาท
คงเหลือ 5,190,000 บาท

ค่าวัสดุ 0%




ผลการดำเนินงาน 70.91%
ผลการกันเงิน 1.12%

ฝายห้วยแม่หลักหมื่น ลูกที่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบที่ได้รับจัดสรร 36,807,938.80 บาท


ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 13,887,722.32 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 10,942,650.95 บาท
คงเหลือ 2,945,071.37 บาท

ค่าแรง 78.79%



ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22,920,216.48 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 19,137,067.75 บาท
คงเหลือ 3,783,148.73 บาท

ค่าวัสดุ 83.49%

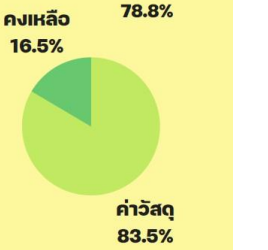


ผลการดำเนินงาน 73.09%
ผลการกันเงิน 81.72%

ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน (ระยะสุดท้าย) พื้นที่ชลประทาน 140 ไร่
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
งบที่ได้รับจัดสรร 13,097,801.29 บาท

ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 4,735,314.00 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 2,601,410.65 บาท
คงเหลือ 2,133,903.35 บาท

ค่าแรง 54.94%



ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 8,362,487.29 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 7,822,558.25 บาท
คงเหลือ 539,929.04 บาท

ค่าวัสดุ 93.54%




ผลการดำเนินงาน 72.13%
ผลการกันเงิน 79.59%

ระบบส่งน้ำฝายมะขามป้อม พื้นที่ชลประทาน 950 ไร่
ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
งบที่ได้รับจัดสรร 38,889,659.52 บาท

ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 11,649,807.00 บาท
ค่าแรงตามยอดก้นเงิน 8,114,156.00 บาท
คงเหลือ 3,535,651.00 บาท

ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 27,239,852.52 บาท
ค่าวัสดุตามยอดก้นเงิน 22,564,570.00 บาท
คงเหลือ 4,675,282.52 บาท

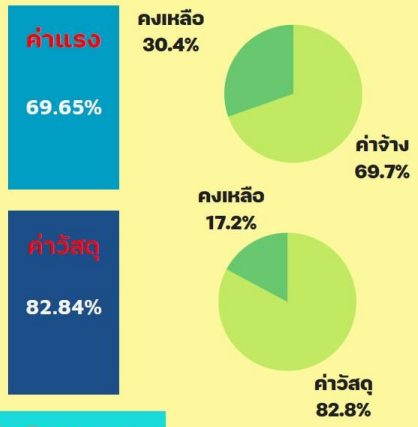


ผลการดำเนินงาน 79.75%
ผลการก้นเงิน 78.89%

ฝายสำนักสงฆ์ธรรมนิยม(วัดมะชัก) พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 610 ไร่
ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบที่ได้รับจัดสรร 43,675,665.15 บาท

ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 15,047,861.72 บาท
ค่าแรงตามยอดก้นเงิน 10,012,652.90 บาท
คงเหลือ 5,035,208.82 บาท

ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 28,627,803.43 บาท
ค่าวัสดุตามยอดก้นเงิน 24,025,004.01 บาท
คงเหลือ 4,602,799.42 บาท

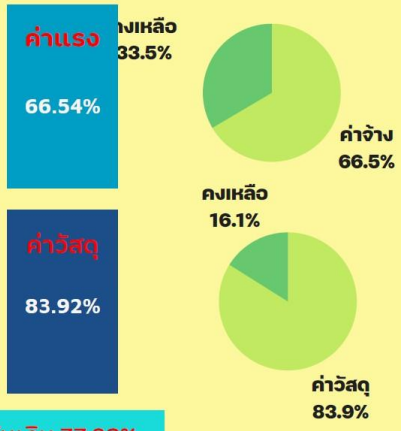


ผลการดำเนินงาน 51.70%
ผลการก้นเงิน 77.93%


ฝายนาปางแยพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 130 ไร่
ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
งบที่ได้รับจัดสรร 32,091,247.53 บาท

ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 9,494,490.51 บาท
ค่าแรงตามยอดก้นเงิน 8,566,864.50 บาท
คงเหลือ 927,626.01 บาท


ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 22,596,757.02 บาท
ค่าวัสดุตามยอดก้นเงิน 21,566,249.13 บาท
คงเหลือ 1,030,507.89 บาท

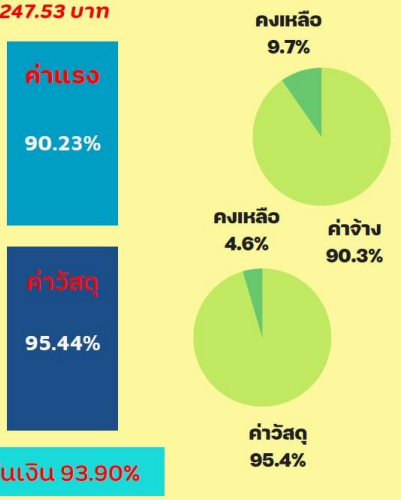

ผลการดำเนินงาน 83.38%
ผลการก้นเงิน 93.90%

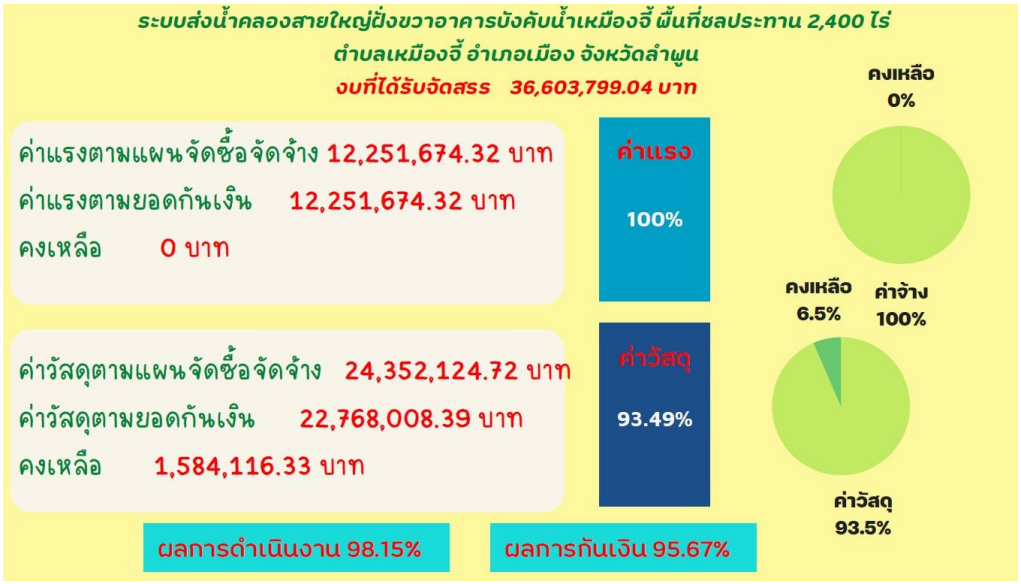
ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวาอาคารบังคับน้ำเหมืองจี้ พื้นที่ชลประทาน 2,400 ไร่
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
งบที่ได้รับจัดสรร 36,603,799.04 บาท
ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 12,251,674.32 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 12,251,674.32 บาท
คงเหลือ 0 บาท
ค่าแรง
100%
ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 24,352,124.72 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 22,768,008.39 บาท
คงเหลือ 1,584,116.33 บาท
ค่าวัสดุ
93.49%
ผลการดำเนินงาน 98.15%
ผลการกันเงิน 95.67%
คงเหลือ
0%
คงเหลือ
6.5%
ค่าจ้าง
100%
ค่าวัสดุ
93.5%


งบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ปี2566)
1.ปรับปรุงซ่องระบายทรายฝายทุ่งโปร่ง
ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
%รวมผลการกันเงิน
96.38%

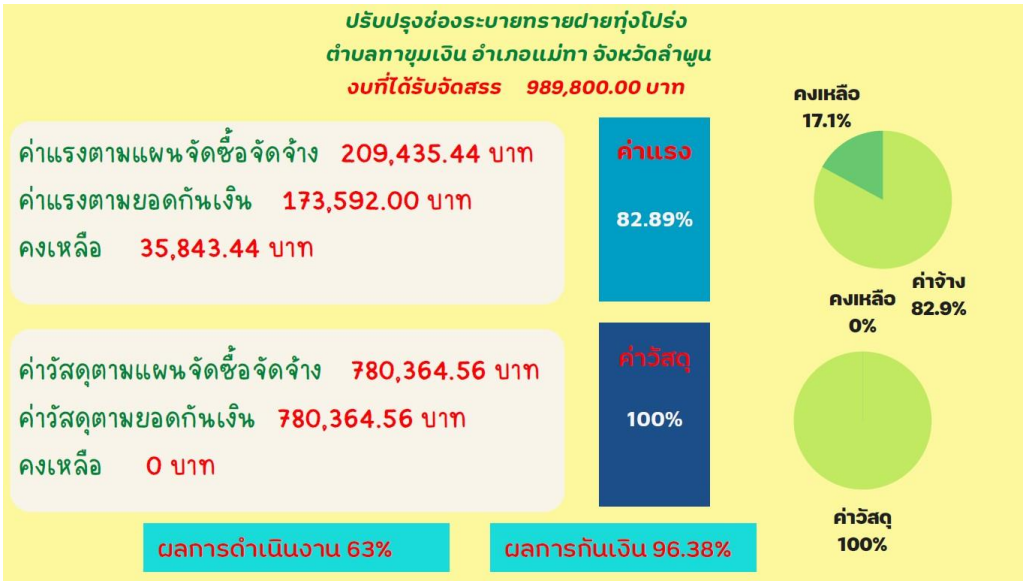
ปรับปรุงซ่องระบายทรายฝายทุ่งโปร่ง
ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
งบที่ได้รับจัดสรร 989,800.00 บาท
ค่าแรงตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 209,435.44 บาท
ค่าแรงตามยอดกันเงิน 173,592.00 บาท
คงเหลือ 35,843.44 บาท
ค่าแรง
82.89%
ค่าวัสดุตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 780,364.56 บาท
ค่าวัสดุตามยอดกันเงิน 780,364.56 บาท
คงเหลือ 0 บาท
ค่าวัสดุ
100%
ผลการดำเนินงาน 63%
ผลการกันเงิน 96.38%
คงเหลือ
17.1%
ค่าจ้าง
82.9%
คงเหลือ
0%
ค่าวัสดุ
100%

รายงานผลการเบิกจ่ายและผลการทดสอบวัสดุของงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566



การเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
แผนกรม	20	45	65	100
แผนสำนัก	30.05	60.68	85.76	100
แผนโครงการก่อสร้าง	30.33	45	65	100

ผลการทดสอบวัสดุของงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ลำดับ	รายการ/โครงการ	ผลการทดสอบ								
		เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	ปูนซีเมนต์	คอนกรีต	หินใหญ่	หินย่อย	ทรายหยาบ	Rubber water stop	Elastic Filler หนา 1 ซม.	กล่องลวด Gabion	แผ่นใยสังเคราะห์
1	ฝายหัวขอแม่หลักหมื่น ลูกที่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	ฝายลำนักสงฆ์ธรรมนิยม(วัดมะซัก) พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 610 ไร่ ตำบลแม่อี อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	√	4.1 ได้ผลทดสอบแล้ว 4.2 ได้ผลทดสอบแล้ว 4.3 ได้ผลทดสอบแล้ว 4.4 ได้ผลทดสอบแล้ว 4.5 ได้ผลทดสอบแล้ว 4.6 ส่งทดสอบวันที่ 1/4/66	-	√	√	√	√	√	√	√
3	ฝายนาปางแอพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 130 ไร่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

ผลการทดสอบวัสดุของงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ลำดับ	รายการ/โครงการ	ผลการทดสอบ									
		เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	ปูนซีเมนต์	คอนกรีต	หินใหญ่	หินย่อย	ทรายหยาบ	Rubber water stop	Elastic Filler หนา 1 ซม.	กล่องลวด Gabion	แผ่นใยสังเคราะห์
4	ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวาอาคารบังคับน้ำเหมืองจี้ พื้นที่ชลประทาน 2,400 ไร่ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	√	√	√	-	√	√	-	√	-	-
5	ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน (ระยะสุดท้าย) พื้นที่ชลประทาน 140 ไร่ ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-
6	ระบบส่งน้ำฝายแขวมป๋อม พื้นที่ชลประทาน 950 ไร่ ตำบลเมืองแหง อำเภอเชียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	√	√	-	-	√	√	√	√	-	-

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566



ลำดับที่	รายการ/โครงการ	งบประมาณที่รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
		208,063,416.16	24.57%	33.17%		
			51,125,734.19	17,226,697.89		
1	โรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	5,280,825				
2	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายช่างกลโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	374,000	348,224.53			
3	ซ่อมแซมอาคารคลังพัสดุและคลังน้ำมันโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	288,000	276,704.40			
4	ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ(บ้านพักระดับ 3-4,5-6) โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 3 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	431,000	416,362.08			

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566



ลำดับที่	รายการ/โครงการ	งบประมาณที่รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
5	ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 1 หลัง ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	480,000	464,293.20			
6	บำรุงรักษาห้วงานโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 พื้นที่ 21 ไร่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	44,900	44,836.50			
7	ฝายห้วยแม่หลักหมื่นลูกที่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	39,131,000	7,075,175.93	344,0642.68		
8	ฝายสำนักสงฆ์ธรรมนิยม(วัดมะขัก)พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 610 ไร่ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	49,045,000	10,338,052.04	1,750,612.00		

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566



ลำดับที่	รายการ/โครงการ	งบประมาณที่รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566			
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
9	ฝายนาปางแยพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 130 ไร่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	34,156,000	6,208,884.99	3,993,327.94		
10	ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวาอาคารบังคับน้ำเหมืองจี้ พื้นที่ชลประทาน 2,400 ไร่ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	39,169,000	9,475,086.02	3,596,432.48		
11	ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน(ระยะสุดท้าย) พื้นที่ชลประทาน 140 ไร่ ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่	14,539,000	5,237,901.70	126,635.00		
12	ระบบส่งน้ำฝายมะขามป้อม พื้นที่ชลประทาน 950 ไร่ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	42,123,000	11,240,213.25	4,319,074.79		


งานก่อสร้างในความรับผิดชอบ

นายสกลรัฐ ปรางงาม รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้


จัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ ๒

- งานดินถมบดอัดแน่นบริเวณด้านหน้าทำนบดิน อยู่ที่ระดับ +๑,๐๑๔ ช่วงกลางอยู่ที่ระดับ ๑,๐๑๕.๖๐ และช่วงท้ายอยู่ที่ระดับ ๑,๐๑๒.๖๕
- งานขุด Chimney Drain อยู่ที่ระดับ ๑๒ เมตร
- งานเรียงหินจากทั้งหมด ๒๕๐๐ คิว เรียงไปแล้วประมาณ ๓๗๐ ลบ.ม คิดเป็น ๑๕% จากทั้งหมด
  *ผคส.๑ เน้นย้ำในส่วนของน้ำด้านหน้าบริเวณทำนบดินให้เร่งระบายออกจากบ่อก่อสร้าง

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน

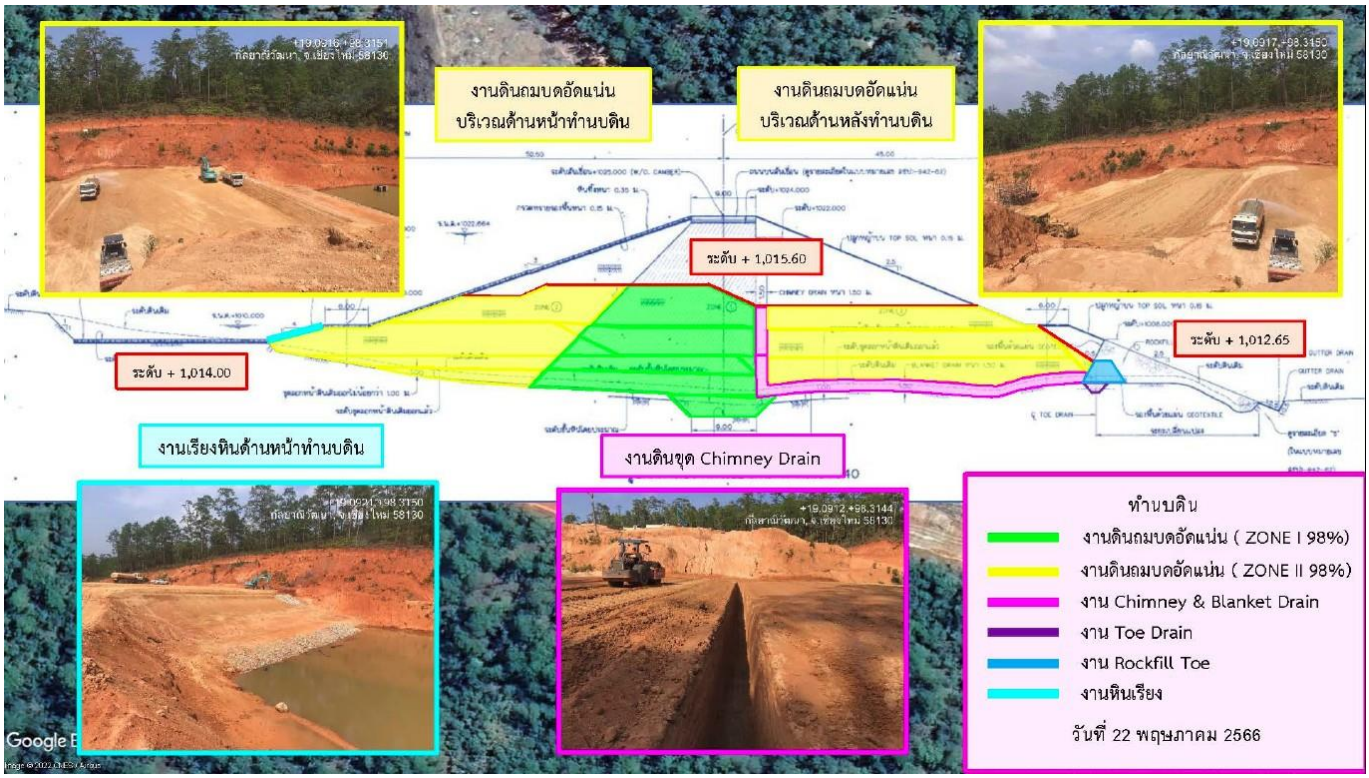

- อาคารควบคุมอยู่ระหว่างการตั้งแบบเตรียมเทคอนกรีตคาน
- แนวระบบท่อส่งน้ำ ยังคงค้างอีกประมาณ ๑๕๐ เมตร

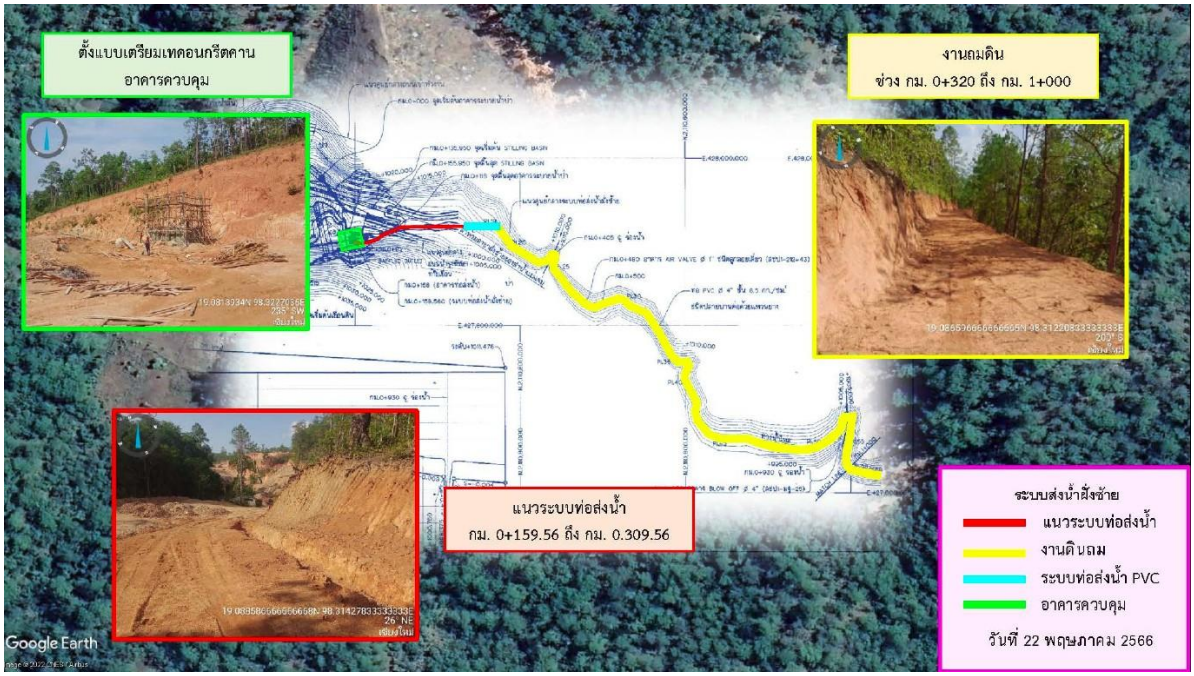

- บ่อเก็บน้ำ ค.ส.ล ดำเนินการเทคอนกรีตเรียบร้อยแล้วคงค้างการถมดินด้านข้างกำแพง
- ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ๕๗.๐๒%
  ดำเนินการเอง ๕๗.๗๑% จ้างเหมา ๕๕.๒๗%




โรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑


- พื้นคอนกรีตภายในตัวอาคารดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินการตัวรางน้ำ ค.ส.ล ปัจจุบันดำเนินการแล้ว ๕๐%


ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



- อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งโครงหลังคาและติดตั้งเหล็ก WF
- ดำเนินการติดตั้ง Crane ภายในอาทิตย์นี้
- ผลงานความก้าวหน้า ๗๐.๙๑%

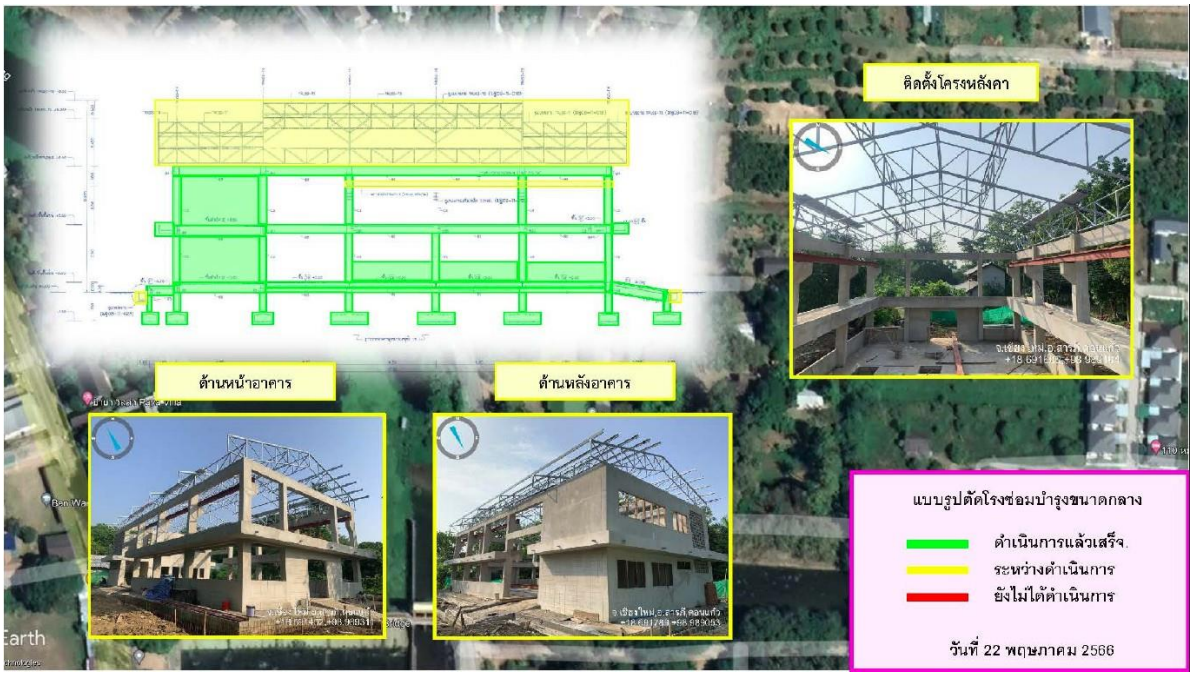

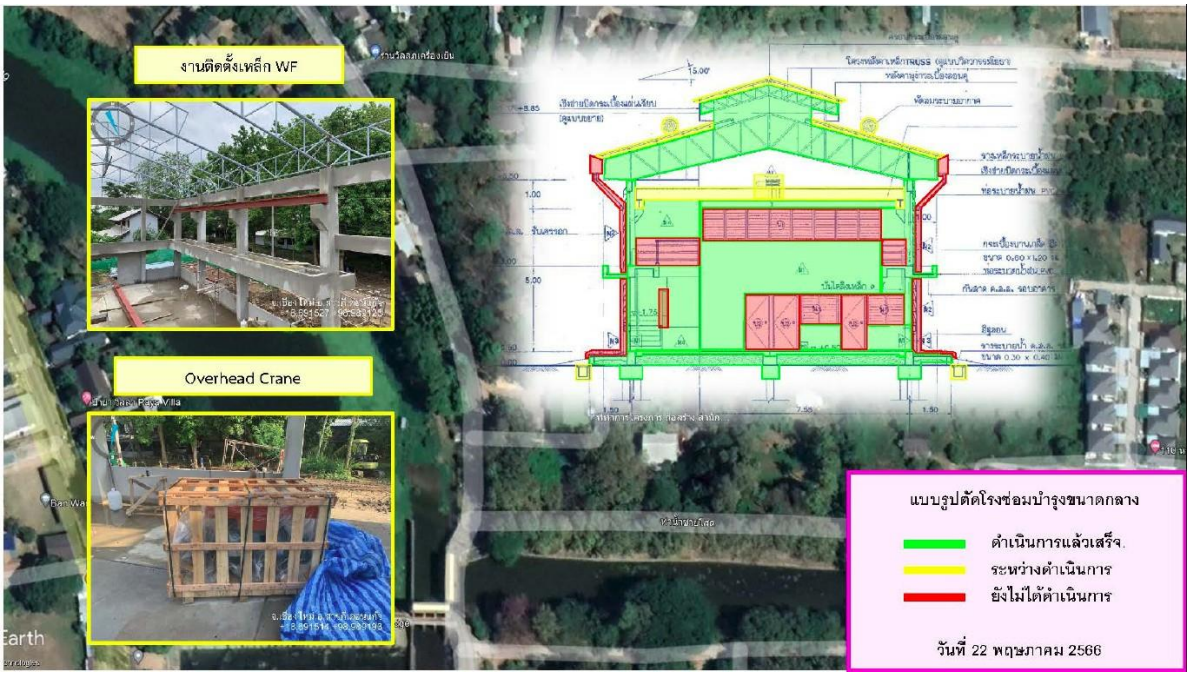

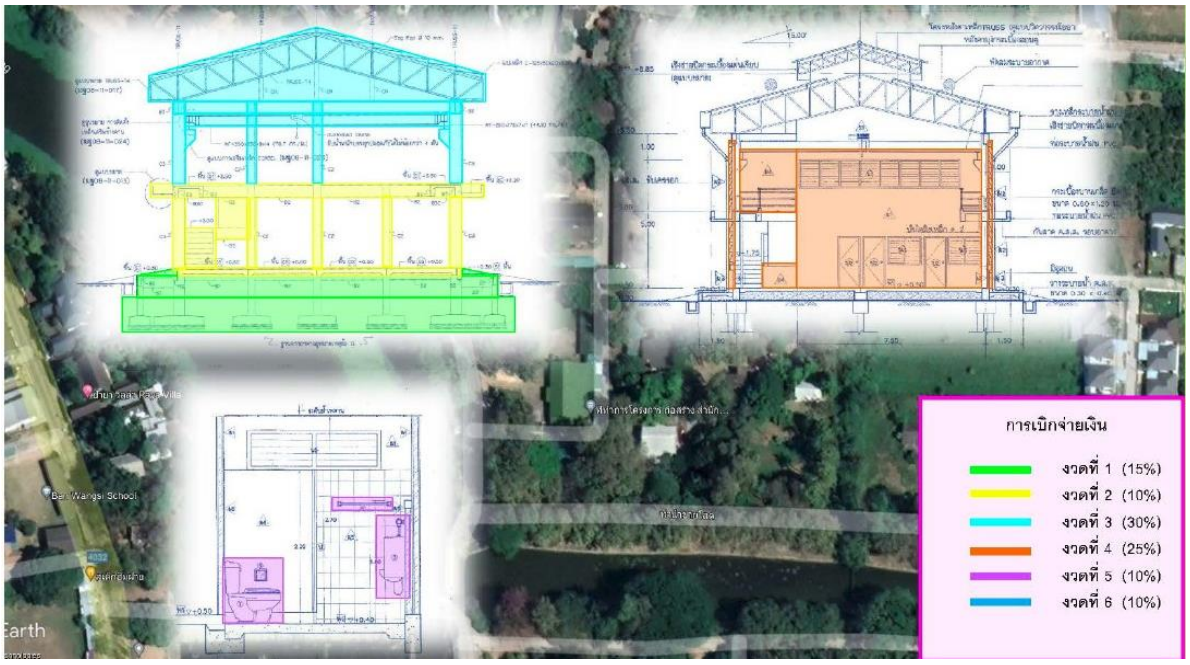


นางสาวณัฏฐา ทิมแก้ว รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้


ฝ่ายสำนักสงฆ์ธรรมนิยม(วัดมะซัก)พร้อมระบบส่งน้ำ

- อยู่ระหว่างดำเนินการตัวกำแพงด้านท้ายฝั่งซ้าย ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จกลางเดือน มิถุนายน
- ช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนจะดำเนินการเทคีย์และพื้นฝั่งขวาให้แล้วเสร็จ โดยเริ่มเทคีย์หน้าและคีย์ท้ายก่อนเพื่อเริ่มการเรียงกล่อง gabion
- ใช้ถุงบิ๊กแบคทำเป็นคันป้องกัน เพื่อลดแรงปะทะของน้ำจากแม่น้ำปาย เนื่องจากน้ำมาค่อนข้างแรงจะทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานได้
- *ผคส.๑เน้นย้ำให้ตรวจสอบความสูงของระดับน้ำในลำน้ำปาย และเพิ่มความสูงของ Coffer Dam ให้สูงกว่าค่าความสูงปกติ เพื่อป้องกันการ over top เข้าบ่อก่อสร้าง

- งานระบบดำเนินการเทรางคอนกรีตได้ประมาณ ๗๐๐ เมตรแล้วคงเหลือ ๓๐๐ เมตร คาดว่าแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน พร้อมถมดินด้านข้าง
- ผลงานความก้าวหน้า ๕๑.๗๐%

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน

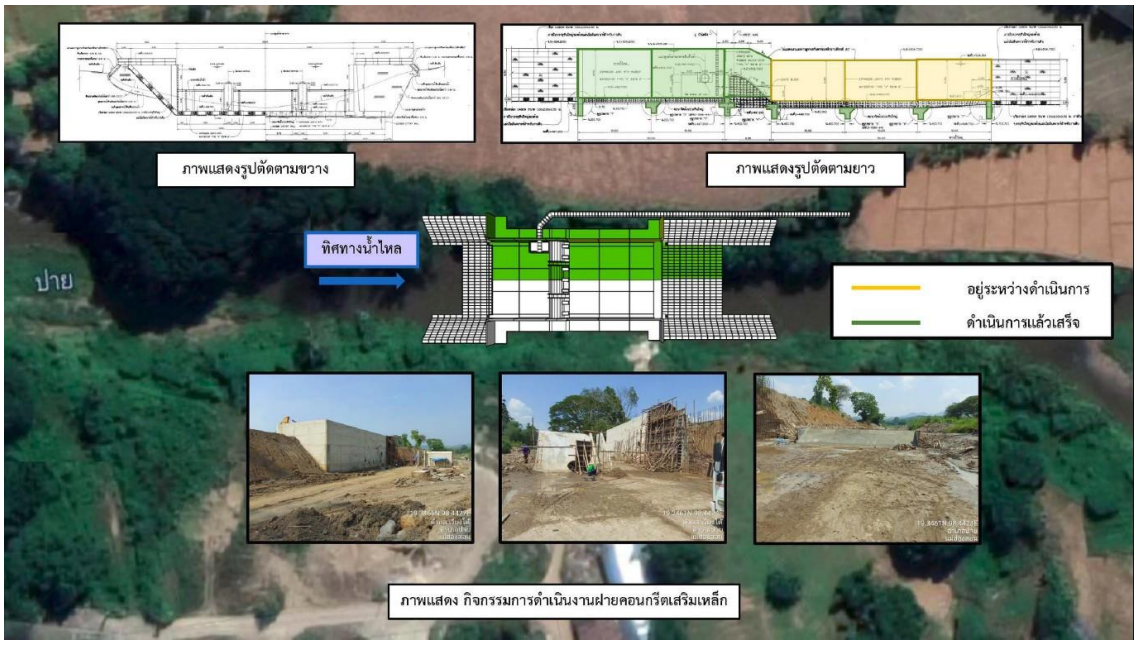

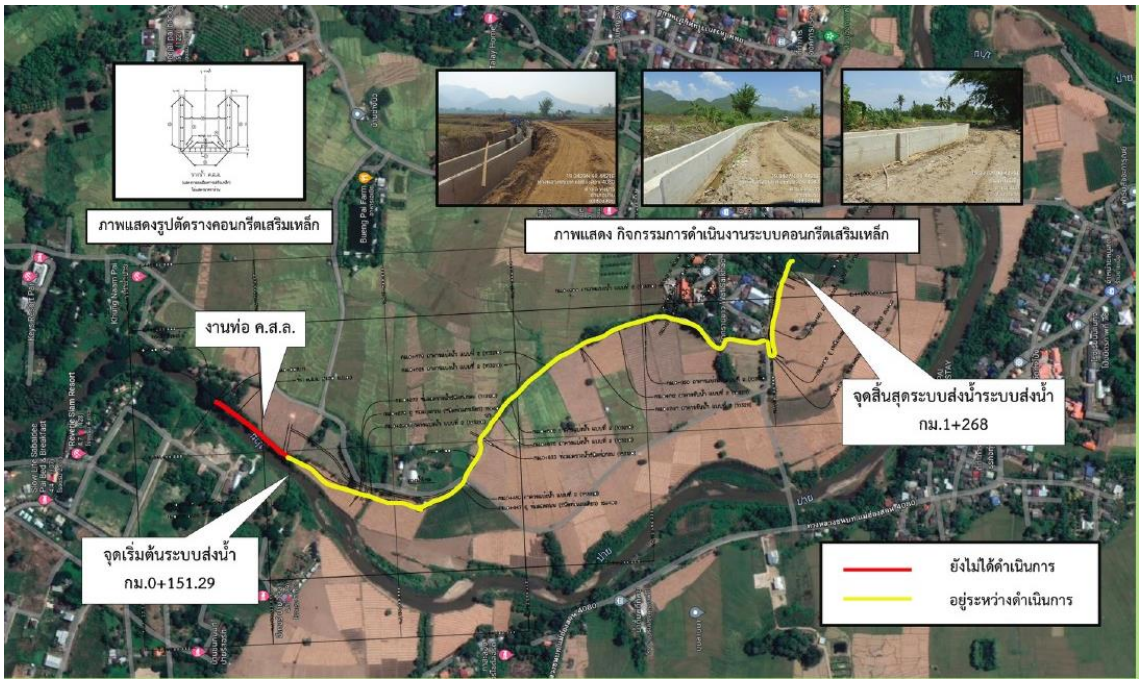


กส.๑ชป.๑รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
งานก่อสร้างในความรับผิดชอบ
ประตูระบายน้ำดงมะปินหวาน

- งานตอม่อ งานสะพานและงานคอนกรีตเสริมเหล็กดำเนินการเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว
- อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าติดบานระบาย
- คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
- ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ๘๙.๓๓%
  ดำเนินการเอง ๙๒.๕๖% จ้างเหมา ๗๕.๕๔%

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



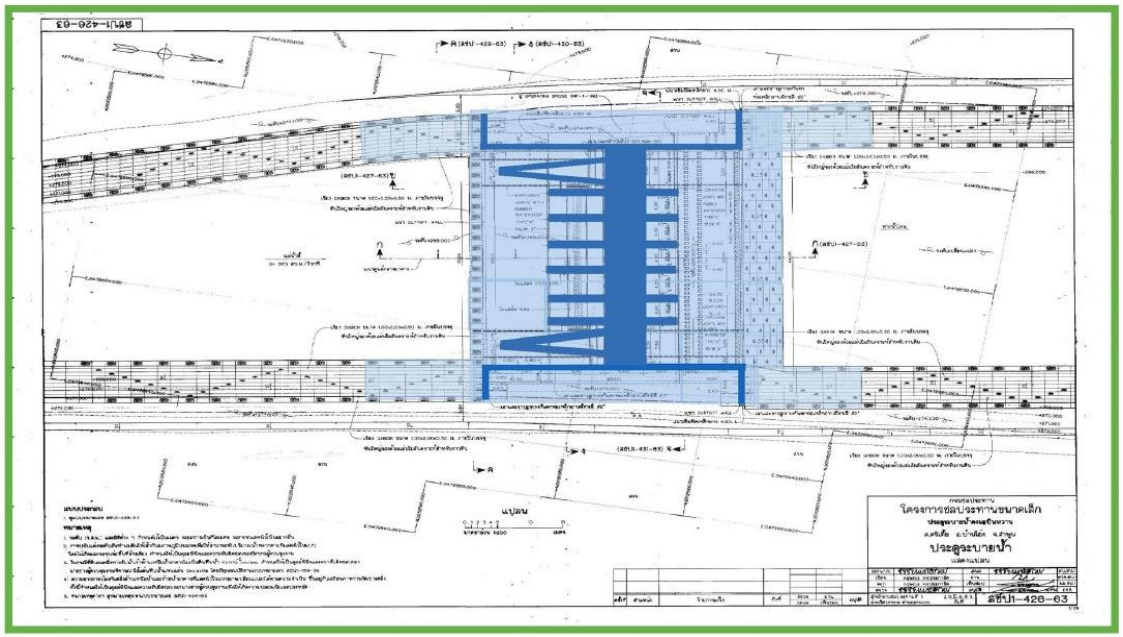

ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวาอาคารบังคับน้ำเหมืองจี้

- งานคอนกรีตแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วเหลือเก็บรายละเอียดงานดินอีกเล็กน้อย
- ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ๙๘.๑๕%


ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



ปรับปรุงช่องระบายทรายฝายทุ่งโปร่ง

- อยู่ระหว่างการดำเนินการสกัดคอนกรีตเพื่อเชื่อมเหล็ก
- ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ๖๓%

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน

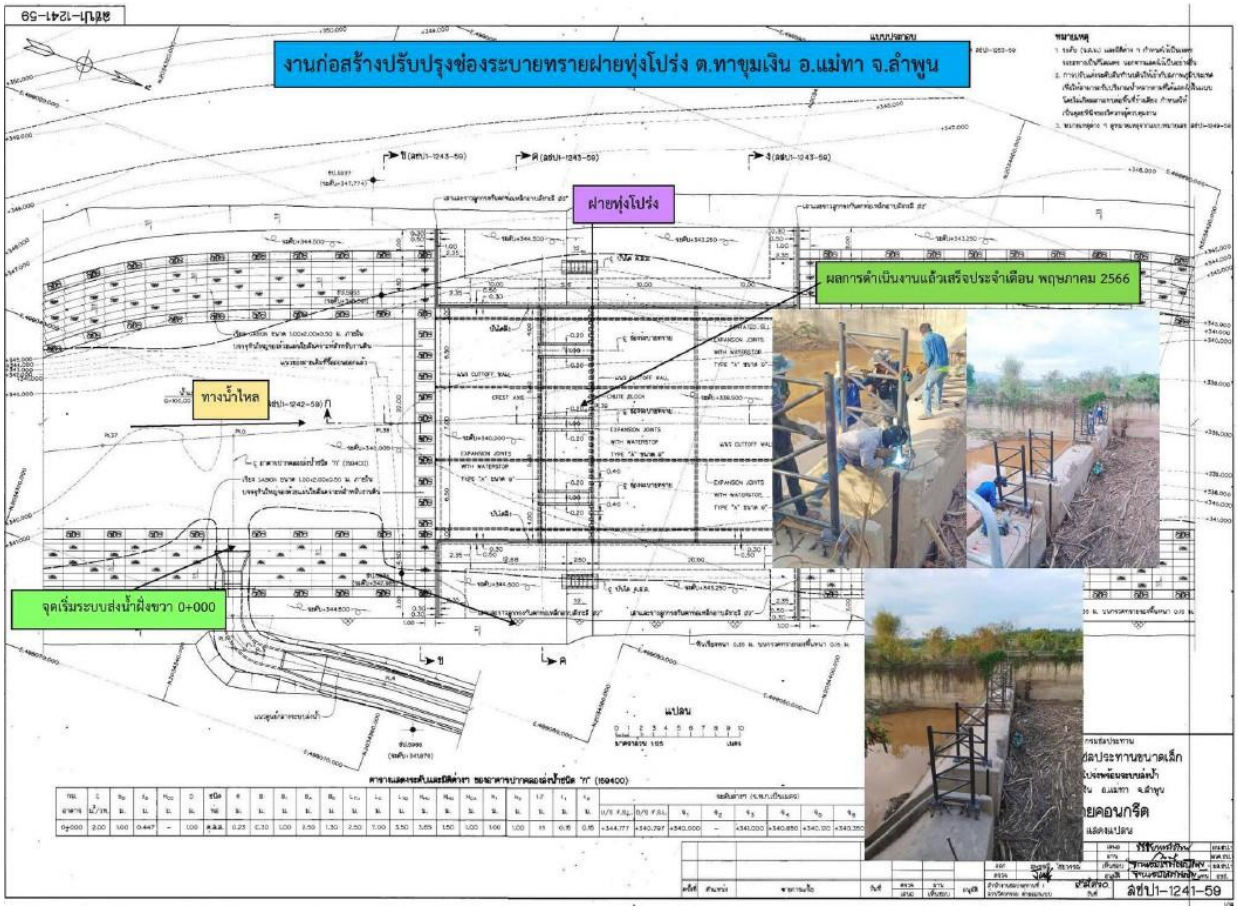


ฝ่ายก่อสร้างที่ ๒


กส.๒ชป.๑ รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

ฝายนาปางแยพร้อมระบบส่งน้ำ

- เนื่องจากมีการเพิ่มความยาวของตัวรางอีกประมาณ ๒๓๐ เมตร แต่ติดปัญหาเรื่องการสื่อสารกับทางชาวบ้านในพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้าง จึงจะเข้าไปทำการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่อีกครั้งในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมนี้
- ภาพรวมของผลการดำเนินงาน ๘๓.๓๘%

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน

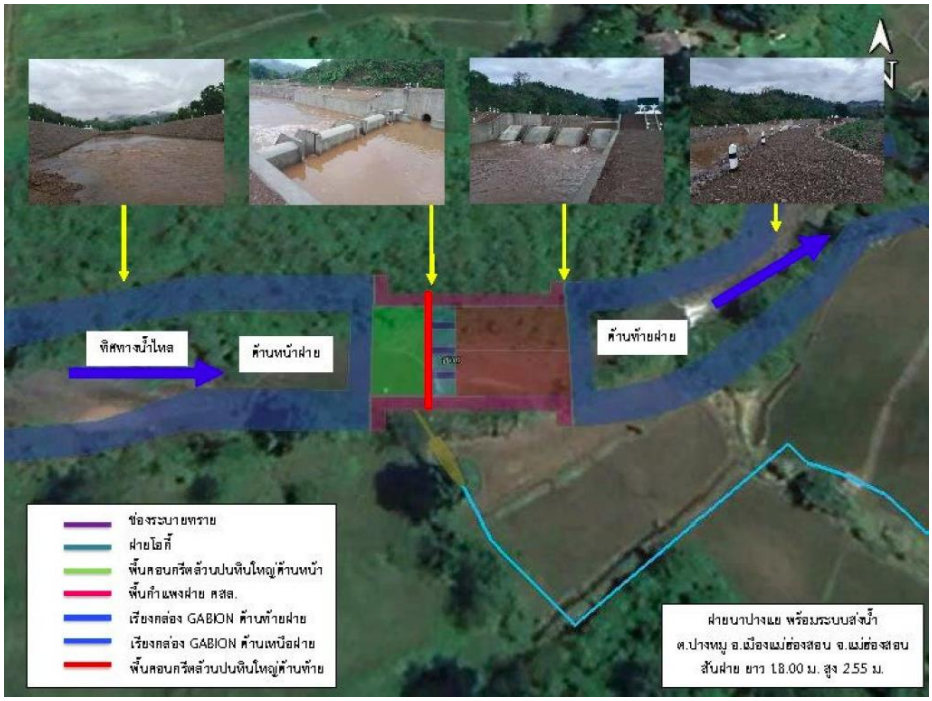

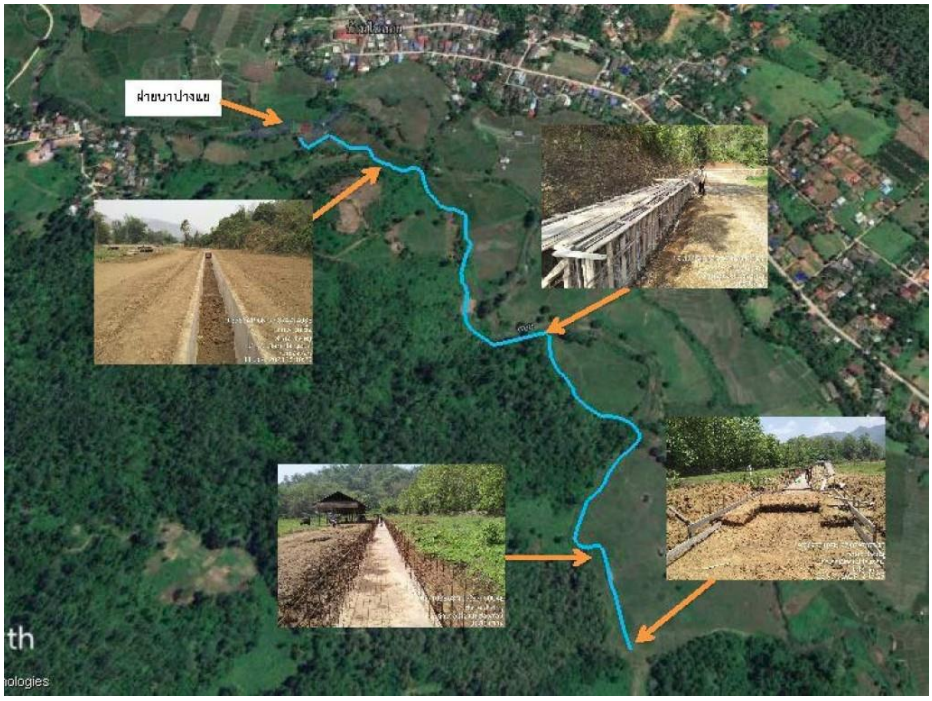

ฝ่ายก่อสร้างที่ ๓

กส.๓ชป.๑ รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน(ระยะสุดท้าย)

- ปัจจุบันดำเนินการโครงสร้างคอนกรีตรางรินไปแล้ว ๑ กิโลเมตร คงเหลือ ๔๒๗ เมตร
- คาดว่าแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณเดือนสิงหาคม
- ผลงานความก้าวหน้า ๗๒.๑๓%


ภาพแสดงความก้าวหน้างาน



ระบบส่งน้ำฝายมะขามป้อม

- **รางน้ำคอนกรีตดำเนินการแล้ว ๓,๑๐๐ เมตร**
- **ผลงานความก้าวหน้า ๗๙.๗๕%**

ภาพความก้าวหน้างาน

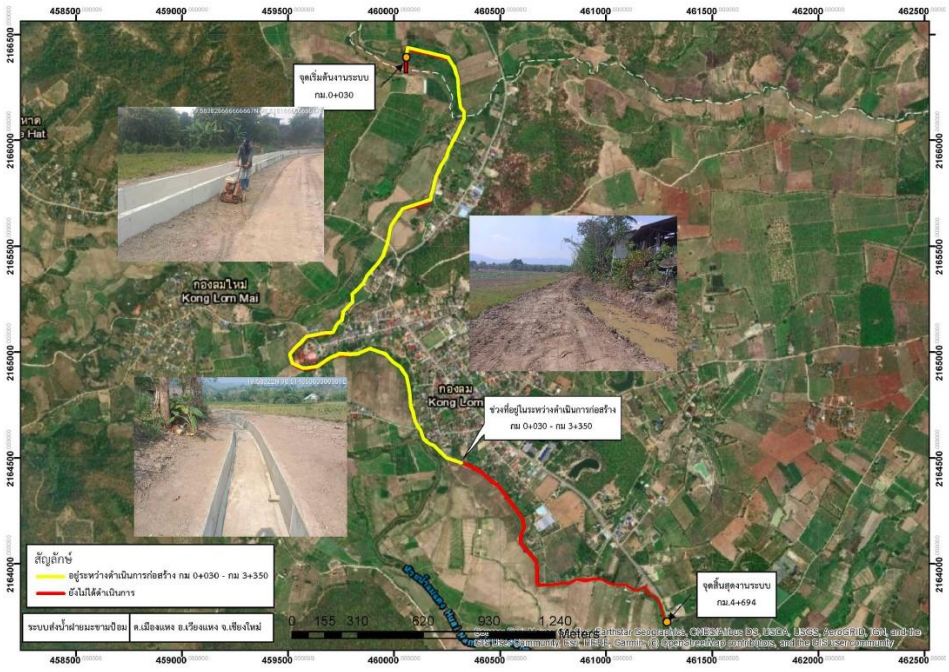

กส.๔ชป.๑ รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

ฝายห้วยแม่หลักหมื่น ลูกที่ ๑

- คงค้างตัวแกนฝายและพื้นส่วนท้าย
- อยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดตัวรางระบบส่งน้ำ
- คาดว่าตัวฝายทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม และจะเก็บรายละเอียดในช่วงเดือนสิงหาคม
- ผลงานความก้าวหน้า ๗๓.๐๙%

ภาพแสดงความก้าวหน้างาน





ฝ่ายบริหารทั่วไป

บท.คส.๑ รายงานผลการเบิกจ่าย ดังนี้

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1

รายงานสรุปผลการเบิก-จ่าย งานปีงบประมาณ 2565 *(เงินกันเหลื่อมปี)*

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รายงาน ณ งวดวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2566

(เบิกจ่ายจริงตามรายงานของงานการเงินและบัญชี สั่งให้ หน่วยเบิกจ่าย)

รายการ		เงินจัดสรร จ.241 (1)	ข้อผูกพันกันแบบ(PO,CK) (2)	รวมเบิกงวดก่อน (3)	รวมเบิกงวดนี้ (4)	เบิก % งวดนี้	รวมเบิกทั้งสิ้น (3) + (4)	รวม % เบิกจ่าย	คงเหลือ จปม. กันแบบ CK (1)-(2)-(3)-(4)
เงินกันเหลื่อมปี 2565									
1.ฝ่ายเก็บน้ำบ้านจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ	พ	29,542,115.09	9,086,547.00	19,778,915.46	-	-	19,778,915.46	66.95	676,652.63
(ระยะที่ 2) อ.เกาะคา จ.เชียงใหม่		-							
2.อาคารบังคับน้ำเหมืองจี้	พ	363,428.80	-	363,428.80	-	-	363,428.80	100.00	-
จ.ลำพูน	จ	6,450,000.00	-	6,450,000.00	-		6,450,000.00	100.00	-
3.ประตูระบายน้ำคลองแป้นหวาน	พ	1,702,303.83	8,000.00	1,569,609.93	-	-	1,569,609.93	92.21	124,693.90
จ.ลำพูน	จ	6,450,000.00	6,450,000.00			-		-	-
4.ฝ่ายบาลกปายพร้อมระบบส่งน้ำ	พ	754,728.70	-	754,728.70	-	-	754,728.70	100.00	-
จ.แม่ฮ่องสอน	จ	1,691,896.19	-	1,691,896.19	-	-	1,691,896.19	100.00	-
รวมงานค่าเป็นการของ		32,362,576.42	9,094,547.00	22,466,682.89	-	-	22,466,682.89	69.42	801,346.53
รวมงานจ้างเหมา		14,591,896.19	6,450,000.00	8,141,896.19	-	-	8,141,896.19	55.80	-
รวมเงินทั้งสิ้น		46,954,472.61	15,544,547.00	30,608,579.08	-	-	30,608,579.08	65.19	801,346.53

หมายเหตุ

1.ฝ่ายเก็บน้ำบ้านจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายในปี 65 ไปแล้ว – 3,591,184.93

2.อาคารบังคับน้ำเหมืองจี้ เบิกจ่ายในปี 65 ไปแล้ว – 39,233,502.99 + จ้างจัดหาเข็มพิลา– 4,838,520

3.ประตูระบายน้ำคลองแป้นหวาน เบิกจ่ายในปี 65 ไปแล้ว – 38,761,365.38 +จ้างจัดหาเข็มพิลา – 3,301,800

4.ฝ่ายบาลกปายพร้อมระบบส่งน้ำ เบิกจ่ายในปี 65 ไปแล้ว –31,404,117.89 + งานจ้างงวดที่1 เบิกไปแล้ว – 1,170,827.50

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
รายงานสรุปผลการเบิก-จ่าย งานปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
รายงาน ณ งวดวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2566

(เบิกจ่ายจริงตามรายงานของงานการเงินและบัญชี ส่งให้ หน่วยเบิกจ่าย)

รายการ	เงินจัดสรร ง.241 (1)	ข้อผูกพัน (2)	รวมเบิกงวดก่อน (3)	รวมเบิกงวดนี้ (4)	เบิก % งวดนี้	รวมเบิกทั้งสิ้น (3) + (4)	รวม % เบิกจ่าย	คงเหลือ งปม. (1)-(2)-(3)-(4)
งานปีงบประมาณ 2566								
1.ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายช่างกอ ส	373,899.58	-	373,899.58	-	-	373,899.58	100.00	0.00
2.ซ่อมแซมอาคารสถิติพัสดุและสถิติน้ำมัน ส	287,105.70	-	287,105.70	-	-	287,105.70	100.00	0.00
3.ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ส (บ้านพักระดับ 3-4,5-6)	430,164.03	-	430,164.03	-	-	430,164.03	100.00	0.00
4.ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 6 คนครัว ส	479,895.15	-	479,895.15	-	-	479,895.15	100.00	0.00
5.ฝายหัวงานแม่หลักหมื่น ลูกที่ 1 ส จ.เชียงใหม่	36,807,938.80	1,506,591.00	31,284,505.25	233,100.50	0.63	31,517,605.75	85.63	3,783,742.05
6.ระบบส่งน้ำฝายบ้านยาง (ระยะสุดท้าย) ส จ.เชียงใหม่	13,097,801.29	284,444.90	10,303,889.72	-	-	10,303,889.72	78.67	2,509,466.67
7.ระบบส่งน้ำฝายแม่ขานป่าตอง ส จ.เชียงใหม่	38,889,659.52	1,424,739.50	29,372,982.05	116,330.00	0.30	29,489,312.05	75.83	7,975,607.97
8.ฝายลำนักองค์การมนิยม(วัดแม่ชัก) ส จ.แม่ฮ่องสอน	43,675,665.15	5,247,649.15	32,400,958.21	4,800.00	0.01	32,405,758.21	74.20	6,022,257.79
9.ฝายขาป่างแยกพร้อมระบบส่งน้ำ ส จ.แม่ฮ่องสอน	32,091,247.53	1,379,590.00	28,584,924.26	37,800.00	0.12	28,622,724.26	89.19	2,088,933.27
10.ระบบส่งน้ำคลองฝายใหญ่มิ่งขวา ส อาคารบังคับน้ำแม่มิ่งจี้ จ.ลำพูน	36,603,799.04	1,053,119.00	34,142,181.68	157,562.17	0.43	34,299,743.85	93.71	1,250,936.19
11.บำรุงรักษาหัวงานโครงการก่อสร้าง ส จ.เชียงใหม่	44,793.90	-	44,793.90	-	-	44,793.90	100.00	0.00
	-	-	-			-		-
12.โรงซ่อมบำรุงชนาคลอาง- จ โครงการก่อสร้าง อชป.1 จ.เชียงใหม่	90,825.00	16,400.00	43,600.00	-		43,600.00	48.00	30,825.00
	5,190,000.00	5,190,000.00	-	-		-		-
13.ปรับปรุงช่องระบายทราย ส ฝายทุ่งโป่ง จ.ลำพูน	989,800.00	-	943,643.56	9,783.00		953,426.56	96.33	36,373.44
รวมงานดำเนินการเอง	203,862,594.69	10,912,533.55	168,692,543.09	559,375.67	0.27	169,251,918.76	83.02	23,698,142.38
รวมงานจ้างเหมา	5,190,000.00	5,190,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมเงินทั้งสิ้น	209,052,594.69	16,102,533.55	168,692,543.09	559,375.67	0.27	169,251,918.76	80.96	23,698,142.38

โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
รายงานสรุปผลการเบิก-จ่าย งานปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
รายงาน ณ งวดวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2566

(เบิกจ่ายจริงตามรายงานของงานการเงินและบัญชี ส่งให้ หน่วยเบิกจ่าย)

รายการ	เงินจัดสรร ง.241 (1)	ข้อผูกพัน/สัญญา (2)	รวมเบิกงวดก่อน (3)	รวมเบิกงวดนี้ (4)	รวมเบิกทั้งสิ้น (3) + (4)	% เบิกจ่าย	คงเหลือ งปม. (1)-(2)-(3)-(4)
งบดำเนินงาน ปี 2566							
หมวด 300 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	50,000.00	24,900.00	24,900.00	-	24,900.00	49.80	200.00
หมวด 300 (ไฟฟ้า)	13,400.00	-	13,400.00	-	13,400.00	100.00	-
หมวด 300 ยกยอ	5,354.00	-	-	-	-		5,354.00
หมวด 450 ค่าสาธารณูปโภค	218,291.00	-	218,133.49		218,133.49	99.93	157.51
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
รวมหมวด 300 , 450	287,045.00	24,900.00	256,433.49	-	256,433.49	89.34	5,711.51

พด.คส.๑ รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมายแทน ดังนี้

ลำดับที่	เลขที่	รายการ	เชิญชวน	ยื่นซอง	ประกาศ	ทรณี	ทำสัญญา	งวดส่งมอบ	ครบสัญญา	PO		คกก ตรวจรับ	คกก ตรวจงานเอง
1	จ.17	จ้างจัดทำบานระบาย	พงษ์ไพศาล				17 พค 65			ขยายเบิกจ่าย	สั่งซะลอ11 ตค65	ชยุต	สิทธิโชค
		พร้อมเครื่องกว้าน	6,450,000.00				180 วัน		6,450,000.00		รับทราบ 17 ตค	สิทธิชัย	อัครพงษ์
		ดงมะปิน									แจ้งปรับ 14 พย	วราวิทย์	ธนิต
									สั่งเข้า 27 มีค คาดว่าจะส่งมอบ มิย 66 และห้างตลดค่าปรับ				

ลำดับ	รายการ	เลขที่	ราคากลาง	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	รายงานขอซื้อ/จ้าง	ประกาศ /ขาย	ยื่นเสนอราคา	เปิดซอ	อนุมัติ	รออุทธรณ์	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอบ	งวดส่งมอบ	ส่งมอบ	ไตรมาส 3	ผลเทส
วค	โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ 2) ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่																	
1	จ้างงานดิน	EB จ.05		สิริภูมิ	11,108,973.00	7,400,000.00		2-9 กย 65	12 กย 65		19 กย 65		20 ตค 65	360 วัน	4 พย65 - 29 ตค 66			22 กพ 66
															ครั้งที่ 1			
					11,108,973.00	7,400,000.00												

ลำดับ	รายการ	ประกาศแผน	เลขที่	ราคากลาง	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	งานขอซื้อ/จ้	TOR	ประกาศ/ขาย	เสนอร	โหลด/เปิด	อนุมัติ	รออุทธรณ์	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอบ	งวดส่งมอบ
	โรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 (รบก.)								12-19 ตค								
1	จ้างก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง	3 สค 65	02 จ.		บ้านสล่า	5,413,000.00	5,190,000.00		19-25 ตค	26-9 พย	0 พย	11 พย 65	14 พย 65	22 พย 65	22 ธค 65	300 วัน	30 ธค 55 -25
	ปรับปรุงซ่องระบายทรายฝายทุ่งโปร่ง								ปรับปรุง			ส่งมอบครั้งที่ 1 ปริมาณงาน 15% วันที่ 15 พค 66					รอผลเทส
1	น้ำมันดีเซล B7		291 ซ.		สุชุม	9,783.00	9,783.00	16 พค 66					16 พค 66		16 พค 66		16พค 66

ลำดับ	รายการ	ภาค	เลขที่	ภา	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	ขอซื้อ	TOR	ภาค	/นเสนอราค	คเลอก	อนุมัติ	รออุทธรณ์	เสนอง	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอบ	งวดส่งมอบ	เร่งส่งมอบ	ผลเทส	รมาส	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	PO
วค	ฝายลำนักยงษ์ธรรมนิยม (วัดดะซัก) พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 610 ไร่ ต. แม่ปี๋ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน																							
1	หินใหญ่ท้องน้ำ คก. 15-30 ซม.3720 ลบม		55 ซ.	"	ปางมะผ้า	3,013,200.00	5,905,800.00	28ตค-	27 พย	18 พย 65	พย	24 พย 65	2 ธค 65	5 ธค 65	8 ธค 65	300 วัน	ค1 15ธค-11มค66	13 ธค 65			960,000		18 มค 66
	หินใหญ่ตละคก. 15-30 ซม.820 ลบม				ซ.27	856,080.00									4 ตค 66		ค2 6 กพ-21 เมย 66				1,918,600.00		3 พค 66
	กรวด เบอร์ 2 3230 ลบม.					3,003,900.00											ค3 28 เมย -31 พค 66						
	ทรายหยาบ 2966 ลบม					2,346,106.00																	
2	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค		56 ซ.	"	ไพล่า	4,621,712.00	4,546,358.00		31 ตค	4 กย 65	พย 6	9 พย 65	17 พย 65	18 พย 65	23 พย 65	300 วัน	ค1 25 พย-6ธค65	ครบ 19 เมย 65			832,600.00		24 มค 66
					ซ.17										19 กย 66		ค2 9-13 มค 66				868,800.00		6 กพ 66
																	ค3 6-20 กพ 66					760,200.00	18 เมย 66
																	ค4 3 เมย 66					760,200.00	21 เมย 66
																	ค5 2 พค 66		27 เมย 66			760,200.00	10 พค 66
																	ค6 8 - 17 พค 66				รอเบิก		
																	ค 7						
3	วัสดุในการจัดทำตระแกรงกันสวะ		129 ซ.		สมัชชา	16,197.00	15,888.83	28 พย 65							รอออกใบสั่ง	5 วันทำการ							
4	วัสดุในการจัดทำบานระบายพร้อมเครื่องยก		61 ซ.		สมัชชา	74,446.00		27 ตค 65					31 ตค 65		รอออกใบสั่ง	5 วันทำการ							
5	อะไหล่รถยนต์		292 ซ.		กิตติ	8,215.00	8,215.00	พค 66					25 พค 66		25 พค 66	5 วันทำการ	29 พค 66						
6	อะไหล่รถยนต์ (ยาง)					8,930.00	รออก RQ 29 พค 66																
7	อะไหล่รถยนต์ (ยาง)					46,200.00	รออก RQ 2 มิย 66																
						13,994,986.00	10,476,261.83													0.00	6,580,000.00	2,280,600.00	

ลำดับ	รายการ	ภาค	เลขที่	ร้านค้า	วงเงิน		รับราคา	านขอซื้อ	ภาค /	ยื่นเสนอราคา	เปิดซอง	อนุมัติ	รออุทธรณ์	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอบ	งวดส่งมอบ	เร่งส่งมอบ	ผลเทส
กส.4	ฝายห้วยแม่หลักหมื่น ลูกที่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่																	
1	หินใหญ่คละ ขนาด คก.15-30 ซม.		EB๒5	ชโนทัย	1,591,214.00													
	หินย่อย		ซ.24		1,919,950.00		4,659,289.00	3,082,838.00	4- 11 พย	14 พย 65	15 พย 65	18 พย 65	1 ธค 65	6 ธค 65	300 ว	ค.1 7-9 ธ.ค 65	371,670.00	
	ทรายหยาบ				1,148,125.00										ครบ 2ตค.66	ค.2 27ธค65-30มค66	1,155,250.00	
																ค.3 10 มีค 66	583,455.00	
																ค.4 31 มีค 66	422,983.00	
																ค 5	549,480.00	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.		EB๒6	เรืองชัย	720,039.00		699,811.00	7 - 14 พย		15 พย 65	16 พย 65	21 พย 65	1 ธค 65	6 ธค 65	210 ว	ค.1 7-9 ธ.ค 65	134,925.00	
			ซ.26	คอนกรีต											ครบ 4กค.66	ค.2 8 มีค 66	296,835.00	4 เมย 66
																ค.3 14-31 มีค	107,940.00	
																ค 4	160,111.00	
3	วัสดุในการจัดทำบานระบายพร้อมเครื่องยก		113 ซ.	อนุพงษ์	156,759.00			16 พย 65				18 พย 65		รอออกใบสั่ง	5 วันทำการ			
4	น้ำมันดีเซล B7 (สำนัก)		284 ซ.	สุชุม	149,741.50		149,741.50	2 พค 66				12 พค 66		12 พค 66	1 วันทำการ	12 พค 66	149,741.50	
5	อะไหล่รถยนต์		289 ซ.	สันป่าข่อย	78,559.00		78,559.00	5 พค 66				16 พค 66		16 พค 66	5 วันทำการ	19 พค 66	78,559.00	
6	จ้างซ่อมรถยนต์				12,500.00		รออก RQ 30 พค 66											
7	อะไหล่รถยนต์				50,887.00		รออก RQ 2 มิย 66											
	รวม				5,827,774.50		4,659,289.00	4,010,949.50									4,010,949.50	

ลำดับ	รายการ	ปะกาศแผน	เลขที่ตาก	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	ผลTOR	ปะกาศ /ชนะเสนอรา	ไหลด/เปิด	อนุมัติ	รออุทธรณ์	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอบ	งวดส่งมอบ	เร่งส่งมอบ	ผลเทส	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	po
กส2	ฝายนาปางแย พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 130 ไร่ ต. ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน																			
1	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค	73 ข	"	กิตติ	1,957,437.00	1,945,990.00		1- 8 พย	8 พย 65	9 พย 65	14 พย 65	22 พย 65	30 พย 65	300 วัน ค.1	6-13 ธค 65				204,000.00		2 กพ 66
				ข.18										ค.2	20ธค65-14 มีค 27 มีค 66				884,000.00		3 เมย 66
														ค3	21 มีค-13 มิย สุดท้าย	รอผล			857,990.00		
2	ดินลูกรัง	154 ข.		กิตติ	25,200.00	25,200.00	ธค 65				14 ธค 65		รอออกใบสั่ง	มิย 66							
3	วัสดุในการจัดทำบานระบายพร้อมเครื่องยก	285 ข.		กิตติ	33,000.00	33,000.00	พค 65				15 พค 66		15 พค 66		16 พค 66					33,000.00	24 พค 66
4	อะไหล่รถยนต์				64,035.00	รออก RQ 29 พค 66															
					2,079,672.00	2,004,190.00													1,945,990.00	33,000.00	


ลำดับ	รายการ	ประกาศแผน	เลขที่ตาก	ร้านค้า	วงเงิน	รับราคา	งานซื้อ	TOR	ปะกาศ	ผนอรอด/ไหนุมัติ	รออุทธรณ์	เสนองรับ	สัญญา/ใบสั่ง	กำหนดส่งมอบ	งวดส่งมอบ	เร่งส่งมอบ	ผลเทส	รมาส	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	PO
กส 1	ระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวาอาคารบังคับน้ำเหมืองจี้ พื้นที่ชลประทาน 2,400 ไร่ ต. เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน (ร.อมจ.)																				
1	อะไหล่รถยนต์ (ยาง)		287 ข.	ยางทอง	72,000.00	72,000.00	12 พค 66			15 พค 66			15 พค 66	5 วันทำการ	16 พค 66					72,000.00	24 พค 66
2	อะไหล่ (แบตเตอรี่)		288 ข.	ต้นป่าซ่อ	4,465.00	4,465.00	12 พค 66			15 พค 66			15 พค 66	5 วันทำการ	18 พค 66					4,465.00	24 พค 66
3	จ้างซ่อมรถยนต์		31 จ.	อนุพงษ์	10,720.00	10,720.00	12 พค 66			15 พค 66			15 พค 66	5 วันทำการ	18 พค 66					10,720.00	24 พค 66
4	อะไหล่รถยนต์ (ยาง)		290 ข.	ยางทอง	31,800.00	31,800.00	15 พค 66			16 พค 66			16 พค 66	5 วันทำการ	18 พค 66					31,800.00	24 พค 66
5	จ้างซ่อมรถยนต์		32 จ.	สินธุวา	17,200.00	17,200.00	15 พค 66			16 พค 66			16 พค 66	5 วันทำการ	18 พค 66					17,200.00	24 พค 66
6	น้ำมันดีเซล B7				105,261.80	รออก RQ 25 พค 66															26 พค 66
7	อะไหล่รถยนต์				13,395.00	รออก RQ 25 พค 66															26 พค 66
8	กระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ				8,531.00	รออก RQ 25 พค 66															26 พค 66
					263,372.80	136,185.00														136,185.00	


ชก.คส.๑ รายงานผลความก้าวหน้างานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและยานพาหนะ (ส่วนกลาง) ของโครงการฯ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน





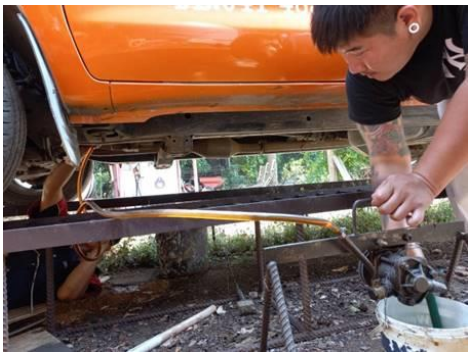

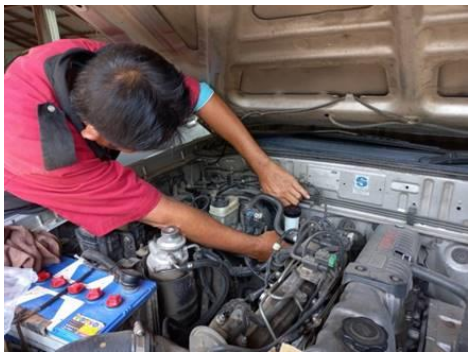







งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและยานพาหนะ (สนาม) ของโครงการฯ ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน





<u>ระเบียบวาระที่ ๔</u> เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

แผนงานเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วศ.คส.๑ มอบหมายให้ กส. แต่ละท่านจัดทำแผนงานดินขุดดินถม เป็นรายละเอียดงานดินในแต่ละเดือน ๑๒ เดือน ละแต่ละงานในปี ๖๗ ว่าสามารถดำเนินการได้เท่าไหร่ยังไง เพื่อที่จะได้ทำหนังสือส่งพิจารณาต่อไป

การติดตามความก้าวหน้าการถ่ายโอน

การถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2560 - 2565

ลำดับ	ชื่องาน	เดือนที่คาดว่าจะส่งมอบ												ถ่ายโอนให้หน่วยงาน	ความก้าวหน้า	หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
1	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากล้วยพร้อมระบบส่งน้ำ									✓				โครงการชลประทาน	ส่งแล่มถ่ายโอนให้	ชื่อมอาคารระบายน้ำล้น
														จังหวัดลำพูน	ผู้รับมอบองนาม	
2	ฝายทุ่งโปร่งพร้อมระบบส่งน้ำ									✓				องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	ส่งมอบพร้อมกับงาน	
	ต.ทาชุมสิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน														ปรับปรุงช่องระบายทรายฝายทุ่งโปร่ง	
3	จัดหาน้ำลนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลแม่แจ่ม(แห่งใหม่) อ่างเก็บน้ำหลวงแม่ปานพร้อมระบบส่งน้ำ									✓				โครงการชลประทาน	อยู่ระหว่างจัดทำ	
	ต้านบอ่างเค็ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่														ประมานการปรับปรุง	
														จังหวัดเชียงใหม่	อาคารท่อส่งน้ำ	
4	ปรับปรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์						✓							โครงการชลประทาน	ส่งแล่มถ่ายโอนให้	
	ต.เมืองปอง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน													จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ผู้รับมอบองนาม	
5	อาคารบังคับน้ำห้วยยี่ต้องพร้อมระบบส่งน้ำ						✓							อบต.แม่วิน	ส่งแล่มถ่ายโอนให้	
	ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่														ผู้รับมอบองนาม	
6	ฝายทรายลูนพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 300 ไร่						✓							เทศบาลสะเมิงใต้	ส่งแล่มถ่ายโอนให้	
	ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่														ผู้รับมอบองนาม	
7	ฝายบ้านทรายแดง พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 470 ไร่									✓				อบต.ส้นต้นหม้อ	รองบประมาณ	
	ต้านบอ เส้นต้นหม้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่														งานเชื่อนป้องกันตลิ่ง	
8	ระบบส่งน้ำฝายแม่แจ่มฝั่งขวา (ระยะที่1) พื้นที่ชลประทาน 205						✓							โครงการชลประทาน	อยู่ระหว่างทำแล่มส่งมอบ	
	ต.ทางดง อ.สอด จ.เชียงใหม่													จังหวัดเชียงใหม่		
9	อาคารบังคับน้ำเหมืองขี้ พื้นที่รับประโยชน์ 6900 ไร่						✓							โครงการชลประทาน	อยู่ระหว่างทำแล่มส่งมอบ	
	ต.เหมืองขี้ อ.เมือง จ.ลำพูน													จังหวัดลำพูน		
10	ฝายบาดกปายพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 780 ไร่						✓							อบต.ปางหมู	รอแล่มส่งมอบคืนมาจาก อบต.	รอมติเปิดสภา
	ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน															
11	ฝายสอดือพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 130 ไร่					✓								อบต.ขุนยวม	อยู่ระหว่างเสนอกรรมการรับ	
	ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน														มอบส่งมอบ	
12	ระบบส่งน้ำบ้านประตูเมือง (ระยะสุดท้าย) พื้นที่ชลประทาน 10						✓							โครงการชลประทาน	ส่งแล่มถ่ายโอนให้	
	ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน													จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ผู้รับมอบองนาม	
13	ประตูระบายน้ำดงมะปินหวาน พื้นที่รับประโยชน์ 765 ไร่									✓				เทศบาลศรีเตี้ย	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน															
14	อาคารป้องกันตลิ่งเหมืองขี้						✓							โครงการชลประทาน	อยู่ระหว่างทำแล่มส่งมอบ	
	ต.เหมืองขี้ อ.เมือง จ.ลำพูน													จังหวัดลำพูน		
15	โครงการจัดหาน้ำลนับสนุนโรงพยาบาลบ้านจันทร์เฉลิมพระเกียร								✓					โครงการชลประทาน	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	
	อ่างเก็บน้ำบ้านจันทร์พร้อมระบบส่งน้ำ													จังหวัดเชียงใหม่		

พด.คส.๑ รายงานผลสรุปประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งานระบบบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง(PMS)ดังนี้

สรุปประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งานระบบบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้าง (PMS)
และขั้นตอนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Zoom และ Youtube
ในวันศุกร์ ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘:๓๐น. - ๑๖:๓๐น.
หน่วยงาน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	สรุปรายงานการประชุมชี้แจง	หมายเหตุ
๑	แนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียน ว ๑๒๘ ในการจัดซื้อจัดจ้าง e-bidding ผ่านระบบ e-GP ระยะที่ ๕	-ปรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding โดยไม่มีการจัดเก็บรายชื่อผู้ประกอบการ ที่ขอรับเอกสารประกวดราคาฯ ด้วยการยกเลิกขั้นตอนการซื้อเอกสารประกวดราคาฯและให้ ผู้ประกอบการดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาได้ที่หน้าเว็บไซต์ - ลดระยะเวลาการเสนอราคาจากเดิม ๘ ชม. เหลือ ๓ ชม. กำหนดได้ ๒ ช่วงเวลา ได้แก่ ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. - ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ให้ครบถ้วนตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด - มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป	นำเทคโนโลยีBlockchain มาใช้ใน เก็บข้อมูล เพื่อความโปร่งใส
๒	แนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียน ว ๑๕๙ ในการจัดทำร่าง TOR มี ๒ แนวทาง ๑ แบบละเอียด มีความซับซ้อน ยุ่งยาก ที่ต้องใช้ คกก ให้แต่งตั้งจากผู้มีอำนาจเป็นคราวๆ ไป ๒ แบบไม่ซับซ้อน ให้ใช้ใน พด.๐๑ เป็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้เลย	การจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานโครงการ (TOR) ๑. เพิ่มเติมข้อมูลใน TOR อย่างละเอียด ดังนี้.- ๑.๑. ความเป็นมา ๑.๒. วัตถุประสงค์ ๑.๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ๑.๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ / ขอบเขตของงาน / แนวรูป รายการก่อสร้าง(แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ ๑.๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ๑.๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ม.๖๕) ๑.๗. วงเงินงบประมาณ /วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑.๘. งวดงานและการจ่ายเงิน ๑.๙. อัตราค่าปรับ ๑.๑๐. กำหนดเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)	**มีตัวอย่างแบบเดิมและแบบใหม่แนบ

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	สรุปรายงานการประชุมชี้แจง	หมายเหตุ
		๒. เพิ่มเติมละเอียดขอบเขตของงานโครงการ (TOR) ใน พด.๐๑ - กรณีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (วิธีเฉพาะเจาะจง) ใช้ตาม พด ๐๑ ได้หรือจะทำ TOR รูปแบบที่กำหนด ก็ได้ เลือกใช้ตามความเหมาะสม หากรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ มีข้อมูลยาวเกินไป ให้แนบเอกสารและหมายเหตุเพิ่มเติมใน พด.๐๑ รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ (ระบบ PMS) ** เพิ่มเติมการบันทึกข้อมูลใน e-GP โดยให้แนบไฟล์เอกสาร TOR ปรับ และเพิ่มเติมข้อมูลในพารามิเตอร์	คนที่มีหน้าที่กำหนดความต้องการพัสดุ เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำ spec หรือ Tor ตามระเบียบข้อ ๒๑
๓	แนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียน ว ๑๒๕	**การแก้ไขและเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding** ๑. กำหนดเวลาเสนอราคา ช่วงเวลาสองช่วง - ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๒. ยกเลิกการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	
๔	แนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียน ว ๑๒๔	**การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)** **- เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้.-** **๑.๑. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)** เปลี่ยนแปลงและเพิ่มข้อมูลรายละเอียดข้อความในระบบ e-GP ดังนี้ .- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานและแบบรูป ๑.๙. แผนการทำงาน (กรณี วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้างเกิน ๖๐ วัน) ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ (ใช้กรณีกำหนดผลงาน หรืองานก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน๕ ล้าน ถ้าใช้ขั้นไม่ต้องระบุข้อนี้) ๓.๑(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ (ใช้กรณีกำหนดผลงาน ถ้าใช้ขั้นไม่ต้องระบุข้อนี้) ๓.๒(๕) เพิ่มเรื่องใบขึ้นทะเบียน SME หมดอายุ ๔.๑๐ คู่สัญญาจัดทำแผนการทำงาน (ระบุตามเงื่อนไขเฉพาะ ต้องสอดคล้องกัน)	
		๑.๒. เอกสารประกวดราคาจ้างทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มข้อมูลรายละเอียดข้อความในระบบ e-GP ดังนี้ .- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานและแบบรูป	

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	สรุปรายงานการประชุมชี้แจง	หมายเหตุ
		๑.๗ แผนการทำงาน (กรณี วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้างเกิน ๖๐ วัน) ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ (ใช้กรณีกำหนดผลงาน ถ้าใช้ขั้นไม่ต้องระบุข้อนี้) ๓.๑(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ (ใช้กรณีกำหนดผลงาน ถ้าใช้ขั้นไม่ต้องระบุข้อนี้) ๓.๒(๓) เพิ่มเรื่องใบขึ้นทะเบียน SME หมดอายุ ๔.๑๐ คู่สัญญาจัดทำแผนการทำงาน (ระบุตามเงื่อนไขเฉพาะ ต้องสอดคล้องกัน)	
		๑.๓. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มข้อมูลรายละเอียดข้อความในระบบ e-GP ดังนี้ .- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ ๑.๗ แผนการทำงาน (กรณี วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อสร้างเกิน ๖๐ วัน) ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ (ใช้กรณีเป็นนิติบุคคล) (๓) ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบ/ช เงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่น โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบ/ช เป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะ ต้องแสดงหนังสือรับรองบ/ชเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งก่อนทำสัญญา (๔) กรณีมูลค่าสุทธิหรือทุนไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่น ผู้ยื่นสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่จะยื่นในแต่ละครั้ง ๓.๑(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ((๔.๑)กรณีเป็นนิติบุคคล) (๔.๒) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบ/ชเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่น และต้องแสดงหนังสือรับรองบ/ชเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งก่อนทำสัญญา (๔.๓) กรณีมูลค่าสุทธิหรือทุนไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่น ผู้ยื่นสามารถขอวงเงินสินเชื่อที่สนง รับรอง ไม่เกิน ๙๐วัน ๓.๒(๔) เพิ่มเรื่องใบขึ้นทะเบียน SME หมดอายุ ๔.๑๒ คู่สัญญาจัดทำแผนการทำงาน โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เว้นแต่วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ไม่ต้องทำ	
		๑.๔. เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) **** เพิ่มเติมเอกสารประกวดราคาให้หน่วยงานนำไปใช้ปฏิบัติตามแนวทาง** - รายละเอียดคล้ายกับงานซื้อ	

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	สรุปรายงานการประชุมชี้แจง	หมายเหตุ
		การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาตามประกาศกรมชลประทาน **๑.๑. ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)** เปลี่ยนแปลงและเพิ่มข้อมูลรายละเอียดข้อความในระบบ e-GP ดังนี้ .- ในย่อหน้าที่ เดิม มีการขายเอกสาร มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็น - ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร - ข้อ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมูลค่าสุทธิของกิจการ - วรรคสุดท้าย ให้พิมพ์เพิ่มเติมใน TemPlate ตามเหตุผลความจำเป็น ในเรื่องค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕% สัญญาแบบปรับราคาได้ และระบบการจัดการความปลอดภัย และการยกเลิกประกวดราคาหาก ไม่ได้รับงบประมาณ	
		๑.๒. ประกาศประกวดราคา จ้างทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มข้อมูลรายละเอียดข้อความในระบบ e-GP ดังนี้ .- ในย่อหน้าที่ เดิม มีการขายเอกสาร มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็น - ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร - ข้อ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมูลค่าสุทธิของกิจการ - วรรคสุดท้าย ให้พิมพ์เพิ่มเติมใน TemPlate เรื่องการยกเลิกประกวดราคาหากไม่ได้รับงบประมาณ	
		๑.๓. ประกาศประกวดราคา ซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มข้อมูลรายละเอียดข้อความในระบบ e-GP ดังนี้ .- ในย่อหน้าที่ เดิม มีการขายเอกสาร มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็น - ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสาร โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร - ข้อ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมูลค่าสุทธิของกิจการ - วรรคสุดท้าย ให้พิมพ์เพิ่มเติมใน TemPlate เรื่องการยกเลิกประกวดราคาหากไม่ได้รับงบประมาณ	

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	สรุปรายงานการประชุมชี้แจง	หมายเหตุ
		๑.๔. ประกาศประกวดราคา เช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มข้อมูลรายละเอียดข้อความในระบบ e-GP ดังนี้ .- ข้อ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมูลค่าสุทธิของกิจการ วรรคสุดท้าย ให้พิมพ์เพิ่มเติมใน TemPlate เรื่องการยกเลิกประกวดราคาหากไม่ได้รับงบประมาณ	
	แนวทางปฏิบัติในการเรงรัดการปฏิบัติงานและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นขอเสนอ ว ๑๒๔ ลว ๑ มีค ๖๖	**การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นขอเสนอ ใชกับทุกวงเงิน และทุกวิธี** **๑. กรณีผู้ยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล** ๑.๑ มูลคาสุทธิของกิจการ กรณีผู้ยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย - ต้องจดทะเบียนเกินกวา ๑ ปี - ตองมีมูลคาสุทธิของกิจการ จากผลตางระหวางสินทรัพยสุทธิหักดวยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแลว - จะตองแสดงคาเปนบวก ๑ ปสุดทายกอนวันยื่นขอเสนอ ๑.๒. กรณีผู้ยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไมมีการรายงานงบแสดงสถานะทางการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหพิจารณาจากมูลคาของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นขอเสนอจะตองมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลคาหุนแลว ณ วันที่ยื่นขอเสนอ	
		๒. กรณีผู้ยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดา **๑. สำหรับการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป** กรณีผู้ยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดา ใหพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไมเกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นขอเสนอ โดยตองมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเปนมูลคา ๑ ใน ๔ ของมูลคางบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นขอเสนอในแตละครั้ง และหากเปนผูชนะ หรือไดรับการคัดเลือกจะตองแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลคาดังกลาวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา **๒.กรณีที่ผู้ยื่นขอเสนอไมมีมูลคาสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแตไมเพียงพอที่จะเขายื่นขอ เสนอ ผู**ยื่นขอเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารได-วงเงินสินเชื่อตองมีมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลคางบประมาณของ	** วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทไม่ต้องเช็ค

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	สรุปรายงานการประชุมชี้แจง	หมายเหตุ
		โครงการหรือรายการที่ยื่นขอเสนอในแตละครั้ง สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญรับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีไดรับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ) ออกใหผู้ยื่นขอเสนอไมเกิน ๙๐ วัน นับถึงวันยื่นขอเสนอ	
		ขอยกเวน (๑) ผู้ยื่นขอเสนอเปนหนวยงานของรัฐ (๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่อยูระหวางฟนฟูกิจการตาม พระราชบัญญัติลมละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓) งานจางกอสรางที่กรมบัญชีกลางไดขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางแลว และงานจางกอสรางที่หนวยงานของรัฐไดมีการจัดทำบัญชีผูประกอบการงานกอสรางที่มีคุณสมบัติเบื้องตนไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ มีผลบังคับใช้ ๔. หนังสือเวียนฉบับนี้ใหมีผลบังคับ ตั้งแตวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ เปนตนไป **แนวทางการติดตามและเร่งรัดการทำงาน** **การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง** **การเร่งรัดให้เข้าปฏิบัติงานตามสัญญา** (ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๒) (เดิม) **กรณีลงนามแล้ว ไม่เข้าดำเนินการตามสัญญา** - ให้หน่วยงานมีหนังสือเร่งรัดพร้อมกำหนดระยะเวลาที่ต้องเข้าดำเนินการ ภายใน.....วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ - หากไม่เข้าดำเนินการตามเวลาที่กำหนด ใช้ดุลพินิจบอกเลิก **กรณีเข้าดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน** - ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้เข้าดำเนินการตามแผนงานหรือระยะเวลาที่กำหนด - หากยังล่าช้า ใช้ดุลพินิจบอกเลิก **- แนวทางการประเมินผลการทำงานและการบอกเลิกสัญญา** (ว ๑๒๔) <u>๑. กรณีล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของแผนงานแล้ว</u> - มีผลงานสะสมไม่ถึง ๒๕% ของวงเงินค่าพัสดุ/ค่าจ้าง - ความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา	

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	สรุปรายงานการประชุมชี้แจง	หมายเหตุ
		๒. กรณีล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๑ ใน ๒ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว - ผลงานสะสมประจำไม่ถึง ๕๐% ของแผนงานประจำเดือน - ผลงานสะสมไม่ถึง ๕๐% ของวงเงินค่าพัสดุ/ค่าจ้าง - ความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา ๓. กรณีล่วงเลยระยะเวลาไปเกิน ๓ ใน ๔ ของระยะเวลาตามแผนงานแล้ว - ผลงานสะสมไม่ถึง ๖๕% ของวงเงินค่าพัสดุ/ค่าจ้าง	
		- ความล่าช้าเป็นความผิดของคู่สัญญา ๔. กรณีครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา - มีผลงานสะสมน้อยกว่า ๘๕% ของวงเงินค่าพัสดุ/ค่าจ้าง ๕. กรณีครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา - มีจำนวนค่าปรับจะเกิน ๑๐% - ให้ดำเนินการตามหนังสือ ว๘๓ * หากปรากฏว่าเข้ากรณีใด กรณีหนึ่งตามข้อ ๑-๕ หน่วยงานของรัฐควรใช้พินิจบอกเลิกสัญญาตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา ๑๐๓ วรรคแรก (๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด - กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในข้อ ๔ ในเอกสารประกวดราคาทุกแบบความว่า "คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา"	
		ข้อยกเว้นการจัดทำแผน - การเช่าสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วัน - การซื้อมีกำหนดส่งมอบงวดเดียว - ซื้อ/จ้าง/เช่า/ก่อสร้าง ซึ่งสัญญาหรือบันทึกข้อตกลง มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท	

ลำดับ	ชื่อเรื่อง	สรุปรายงานการประชุมชี้แจง	หมายเหตุ
๕	**แนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียน ว ๑๘๙**	**กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม แนวทางการปฏิบัติ** ๑. ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและจัดทำแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ (พัสดุเป็นผู้จัดทำผ่านระบบ g-GP) ๒. ให้คณะกรรมการพิจารณาผล จัดทำแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอ แนบไฟล์ไปพร้อมกับข้อ ๑ แจ้งผลเฉพาะราย (คณะกรรมการพิจารณาผลเป็นผู้จัดทำ) ๓. ให้นำไปใช้กับวิธีคัดเลือกโดยอนุโลม ๔. บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เม.ย. ๖๖	** แนวทางการปฏิบัติตาม ว ๑๘๙ ที่แนบ
๖	**แนวทางปฏิบัติการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน (PMS)**	**สิทธิ์ของการใช้ระบบ PMS** ๑. ผู้บริหารของหน่วยงาน มีสิทธิ์ ดูข้อมูลทั้งหมดได้อย่างเดียว ๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ มีสิทธิ์ ดำเนินการในระบบได้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำ มีสิทธิ์ จัดทำในส่วนที่รับผิดชอบ แก้ไขได้ ไม่สามารถลบข้อมูลในระบบ	**กำหนดให้ใช้รหัสดังนี้.- ชื่อเข้าใช้ระบบ : ๐๗๐๓๕๐๐๐๐๓๓๑A รหัสผ่าน : ๑๒๓๔**
		การเปลี่ยนแปลงแผนที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๑. การเปลี่ยนแปลงแผน ต้องผ่านการอนุมัติจาก หัวหน้าหน่วยงานก่อน **(กรณีที่ยังไม่ได้จัดทำ พด.๐๑ สามารถแก้ไขได้ในระบบ)** ๒. การเปลี่ยนแปลงแผน ที่ได้ดำเนินการจัดทำ พด.๐๑แล้ว หากจะแก้ไขต้องทำการยกเลิก รายการจัดทำ พด.๐๑ ทั้งหมดและย้อนบอล ในระบบก่อนจึงจะแก้ไขแผนได้ (กรณีนี้ให้ทำการแจ้งผ่านกลุ่มเป็น เคสๆ ไปเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและดำเนินจัดซื้อจัดจ้างต่อไป) ๓. การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ประเภทการจัดหา (กรณีนี้ให้ทำการแจ้งผ่านกลุ่มเป็น เคสๆ ไปเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและดำเนินจัดซื้อจัดจ้างต่อไป)	** ไม่สามารถแก้ไขในระบบได้ ** ไม่สามารถแก้ไขในระบบได้
		การเพิ่มข้อมูลในระบบ PMS เพิ่มเติมข้อมูลใน พด.๐๑ ดังนี้ - ใบจัดสรรงบประมาณโอนครั้งที่ , ส่วน/ฝ่าย , ผู้ควบคุมงบประมาณ	

<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u> เรื่องอื่นๆ

- ประชุมครั้งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐น.

(นางสาวปิยะธิดา จันทร์สูง)
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

(นางสาวรชยา อยู่เชื้อ)
ผู้ตรวจ
